



de la part du
Peuple japonais



Au service
des peuples
et des nations

PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PUDC)

RAPPORT ANNUEL D'EXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIERE *Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018*



PUDC 
PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE TOGO

Fiche synoptique du projet

Période de rapportage	1er janvier au 31 octobre 2018
Donateur	Gouvernements du Togo et du Japon (fonds KR)
Pays	Togo
Titre du Projet	Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC)
No du Projet (ATLAS) ¹	00105760
Outputs (ATLAS)	00106856 : Développement d'infrastructures et équipements socio-économiques de base 00106857 : Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et locaux 00106858 : Développement de l'entrepreneuriat rural 00106859 : Développement du système d'information géoréférencé (SIG) des infrastructures et équipements 00105760 : Coordination et gestion du programme
Liens Programmatiques	SCAPE (2013-2017) : Axe II – Renforcement des infrastructures économiques ; Axe III – Développement à la base et réduction des déséquilibres régionaux et Axe V – Promotion d'un développement participatif, équilibré et durable. UNDAF (2014-2018) : Effet 1 : la sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi sont améliorés Effet 2 : les populations notamment les plus vulnérables ont un accès équitable aux services sociaux de base de qualité. CPD 2014-2018 : Pilier 'réduction de la pauvreté et emploi ». Plan Stratégique du PNUD (2014-2017) : Effet 3 : Accès universel aux services sociaux de base.
Partenaire d'exécution	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Date de début du projet	30 juin 2016
Date de fin du projet	30 Juin 2019
Plan Annuel de Travail Budgétisé pour 2018	49.887.817.216 FCFA
Ressources totales requises pour 2018 (*)	46.989.085.783 FCFA
Contributions reçues en 2018	- Gouvernement du Togo : - FCFA - Don du Japon (fonds KR) : 2.100.000.000 FCFA Total : 2.100.000.000 FCFA
Budget 2018 non financé	44.889.085.783 FCFA

Note () : Un reliquat de 2.898.731.433 FCFA au 31 décembre 2017 a été utilisé pour le financement des activités budgétisées au titre l'année 2018*

¹ ATLAS est le progiciel de gestion intégré du PNUD utilisé pour enregistrer ces transactions comptables et effectuer la gestion des projets

Sommaire

Résumé introductif.....	2
Exécution technique au 31 décembre 2018	4
<i>Composante 1 : Développement des infrastructures socio-économiques de base</i>	<i>4</i>
1.1 Volet « Pistes rurales »	4
1.2 Volet « Santé »	5
1.3 Volet « Education »	6
1.4 Volet « Infrastructure socio-collective de base »	7
1.5 Volet « Hydraulique et Assainissement »	8
1.6 Volet « Energie »	8
1.7 Volet « Agriculture »	9
<i>Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelle des acteurs nationaux</i>	<i>9</i>
<i>Composante 3 : Développement de l'entrepreneuriat rural</i>	<i>11</i>
<i>Composante 4 : Développement du Système d'Information Géoréférencé (SIG) des infrastructures et équipements</i>	<i>11</i>
Etat financier au 31 décembre 2018	12
<i>Etat d'exécution budgétaire</i>	<i>12</i>
<i>Etat de trésorerie</i>	<i>14</i>
Suivi-Evaluation, Leçons apprises et risques identifiés	14
<i>Suivi-Evaluation</i>	<i>14</i>
<i>Gestion du risque et difficultés liées à l'exécution du programme</i>	<i>15</i>
Conclusion et Perspectives	15

Liste des abréviations

AEP	Adduction en Eau Potable
AGR	Activités Génératrices de Revenus
ANADEB	Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base
ANASAP	Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité publique
CEG	Collège d'Enseignement Général
CHP	Centre Hospitalier Préfectoral
CHR	Centre Hospitalier Régional
CMS	Centre Médico-Social
CPD	Country Programme Document – Document de Programme Pays en français
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
EPP	Ecole Primaire Publique
GCE	Grand Canal d'Equilibre
INSEED	Institut National de la statistique et des études économiques et démographiques
KR	Kennedy Round
LOA	Letter of Agreement – Lettre d'accord en français
MDBAJEJ	Ministère de développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
MME	Ministère des Mines et de l'Energie
MSPS	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
ODD	Objectifs de Développement Durable
PADLIFIT	Programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad
PURET	Plan d'Urgence de l'Economie Tchadien
PN-PTFM	Programme National de Plateformes multifonctionnelles
PTFM	Plateforme Multifonctionnelles
PNUD	Programme des Nations-unies pour le développement
PUDC	Programme d'Urgence de Développement Communautaire
RR	Représentant Résident du PNUD
SCAPE	Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi
SIG	Système d'Information Géographique
UGP	Unité de Gestion du Programme
UNDAF	Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement/
USP	Unité de Soins Périphériques
VNU	Volontaire des Nations-Unies
ZAAP	Zones d'Aménagement Agricole Planifiées

Résumé introductif

Le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), a été initié par le Chef de l'Etat, son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé et lancé officiellement le 30 juin 2016 à Mandouri (350 kilomètres au Nord de Lomé dans les régions des Savanes). Ce programme, dont l'exécution a été confiée au PNUD, traduit la forte volonté politique du Président du Togo pour répondre aux besoins socio-économiques des populations les plus vulnérables en intensifiant les investissements sociaux de base en vue d'accélérer la lutte contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales.

En effet, plus de 75% du budget du programme, estimé à 155,14 milliards FCFA sur la période 2016-2018, est consacré au développement des infrastructures et à l'accroissement des investissements dans les secteurs qui facilitent l'accès aux services sociaux et économiques aux populations les moins desservies dans 23 préfectures couvrant les cinq régions du Togo.

La mise en œuvre du PUDC capitalise sur une approche participative des communautés locales, bénéficiaires des réalisations du programme, des partenariats stratégiques à travers la signature d'accords de collaboration avec les entités gouvernementales dont l'avantage comparatif est démontré, pour assurer l'appropriation nationale². La dimension « genre » est également prise en compte par un ciblage prioritaire des femmes dans le processus d'identifications des populations cibles et à travers la ségrégation selon le genre dans le rapportage des activités réalisées, notamment pour la création d'emplois temporaires³.

En dépit des challenges majeures auxquels sont confrontés le programme, plusieurs activités contribuant à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 17 (voir les annexes 4 et 5) ont été réalisées, à savoir :

- Le désenclavement d'environ 250.000 habitants par la réhabilitation de 406 km de pistes rurales ;
- La construction de 208 salles de classes, 44 bureaux magasins, 19 blocs administratifs, 52 laboratoires et 101 blocs latrines dotés de 149.149 manuels scolaires, 64 mallettes pédagogiques et 5.640 mobiliers de bureau et tables bancs pour améliorer les conditions d'apprentissage d'au moins 7.000 élèves dans 63 établissements scolaires ;
- La construction, réhabilitation et extension de 16 établissements de santé équipés en matériels biomédical (4 centres médico-sociaux – CMS, 3 centres hospitaliers préfectoraux – CHP et 9 unités de soin périphériques – USP), la construction de 20 incinérateurs et le déploiement de 5 cliniques mobiles et 5 ambulances pour faciliter l'accès aux soins de santé de plus 500.000 personnes par année ;
- L'amélioration de l'accès à l'énergie durable d'au moins 8.000 personnes issues des zones rurales pour la transformation artisanale des produits alimentaires de base et le développement des activités génératrices de revenus (AGR) à travers l'installation en cours de 40 plateformes multifonctionnelles solaires dans 40 villages. 45.850 habitants de la région Maritime ont pu également bénéficier de l'installation de 104 lampadaires solaires dans le cadre de la phase pilote du projet d'installation de 10.000 lampadaires solaires dotés de chargeurs et spots Wi-Fi dans les cinq régions du Togo ;

² Des lettres d'accords (LOA) ont été signées avec l'Agence Nationale de Salubrité Publique (ANASAP) pour le volet assainissement, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) pour la mise en place du Système d'Information Géographique (SIG), l'Agence Nationale pour le Développement à la Base (ANADEB) et le Programme National de Plateformes Multifonctionnelles (PN-PTFM) pour le développement des infrastructures socio-collectives de base.

³ L'intégration systématique et transversale de la dimension genre dans les programmes est un des principes fondamentaux de l'approche du PNUD visant à œuvre à la création d'un monde durable, inclusif et résilient. Au PUDC, elle se traduit par la prise en compte des besoins pratiques et stratégiques des femmes ainsi que la promotion de leur autonomisation économique et le respect de l'équité hommes/femmes en termes de participation, de planification ; de suivi évaluation et d'allocation des ressources au niveau de chaque projet.

- La construction de 3 marchés préfectoraux suivie d'ouvrages complémentaires (forages et assainissement) pour 3 localités et villages environnants, la construction de 3 maisons de la femme, un centre polyvalent de jeunes, 5 autres hangars, 8 blocs latrines, 10 forages indépendants et 5 magasins pour faciliter l'accès aux infrastructures sociocommunautaires pour les populations à la base – environ 22.000 habitants dont 70% sont des femmes ;
- L'approvisionnement en eau potable de 135.000 habitants des milieux ruraux et semi-urbains à travers la réhabilitation en cours de 54 mini-AEP sur l'ensemble du territoire ;
- La création d'environ 2.737 emplois directs dont 716 ont été pourvus aux femmes ;
- La finalisation du processus de standardisation pour le développement de la plateforme intégrée nationale du Système d'Information Géoréférencé (SIG) ;
- L'organisation de plusieurs sessions de formations et de renforcement des capacités des acteurs qu'il s'agisse de la gestion de risque dans le cadre de la gestion des projets d'infrastructures ou de la formation des acteurs pour une utilisation durable des infrastructures construites et des matériels et équipements acquis ;
- Par ailleurs, plusieurs études techniques de faisabilité ont été réalisés pour le développement 12 Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP), l'implantation de 649 forages et la réhabilitation d'un tronçon 1.255 kilomètres linéaires de pistes rurales.

En termes de rapport coût – efficacité – efficience, le PNUD dans son rôle d'agence d'exécution, a en plus de la mobilisation des compétences locales, utilisé son vaste réseau mondial et son expertise internationale pour accélérer les processus d'acquisition, intégrer une approche innovante pour la réalisation de certaines activités. Par exemple, pour le volet électrification et accès à l'énergie propre, l'acquisition de 10.000 lampadaires solaires dont 2.000 sont dotés de chargeurs et 1.000 de chargeurs et spots Wi-Fi et chargeurs, a permis à l'Etat du Togo de réaliser une économie potentielle estimée à 15,23 milliards FCFA en comparaison des montants des activités initialement budgétisées et exécutées par des programmes similaires.

Ce présent rapport va présenter une synthèse des activités réalisées par le programme au cours de l'année 2018, c'est-à-dire du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, marquée principalement par le suivi de la finalisation des projets entamés dans les précédentes années et le non-démarrage de plusieurs nouveaux projets du fait de l'absence de ressources financières.

Exécution technique au 31 décembre 2018

Composante 1 : Développement des infrastructures socio-économiques de base⁴

1.1 Volet « Pistes rurales »

Les études techniques pour la réalisation de travaux de réhabilitation sur des tronçons additionnels 1.255 kilomètres linéaires ont été finalisées mais les travaux prévus pour cette année n'ont pu être réalisés du fait de l'absence de financement.



Cependant, 406 kilomètres linéaires de pistes rurales ont été entièrement réhabilités et mis en service dans les cinq régions du Togo dans le cadre de la première phase du volet « pistes rurales » (voir carte ci à côté)⁵.

Une mission technique conjointe PUDC – Ministère des Infrastructures et Transports (MIT) a été organisée en décembre 2018 pour évaluer les dégradations survenues après plus d'une année de mise en service et plusieurs saisons de pluies et proposer des solutions durables avant la réception définitive des ouvrages.

Par ailleurs, l'étude technique pour la réalisation de tronçons additionnels de 1.255 kilomètres a été réalisée en vue de débiter les travaux de réhabilitation/extension dans le cadre de la deuxième phase de ce volet.

Photos de quelques tronçons réhabilités dans le cadre de la première phase



Piste rurale Dankpen : Lot 2, 25 km – vue d'un agriculteur



Piste rural Tchamba : Lot 3, 31 km – vue des passantes

⁴ Les informations détaillées sur l'état d'avancement des travaux pour toutes les volets de la composante 1 du Programme sont fournies en annexes 1, 2 et 3.

⁵ 132,2 kilomètres de pistes rurales sur 6 tronçons dans les régions du Plateaux (1), Centrale (3), Kara (1) et Savanes (1) ont été financés par l'aide alimentaire Japonaise (fonds KR).

1.2 Volet « Santé »

5 cliniques mobiles équipées en matériel biomédical ont été acquises sur les 7 planifiées en 2018 ont été acquises au cours du second semestre de l'année 2018. Aussi, les volontaires des Nations Unies, mis à la disposition du MSPS ont contribué à l'élaboration de la stratégie de déploiement des cliniques mobiles ainsi qu'à la finalisation du manuel d'opérationnalisation du fonctionnement des cliniques mobiles.

Par ailleurs, les activités de supervision en vue de la finalisation des travaux de construction et réhabilitation et la dotation en équipements biomédicaux des infrastructures de santé ont été effectuées. Ainsi, 1 Centre Hospitalier Préfectoral (CHP), 2 Centres Médico-Sociaux (CMS), 7 Unités de Soins Périphériques (USP) et 20 incinérateurs ont été réceptionnés.

En ce qui concerne, les travaux de finalisation du CMS et 2 CHP, en cours d'achèvement avec un taux de réalisation moyen de 94%, les dispositions sont prises pour réceptionner rapidement ces infrastructures en début d'année 2019.

Photos de quelques activités du volet santé réalisées en 2018



Vue de la clinique mobile – formation des acteurs



CMS Agbonou, Région des Plateaux

Quelques témoignages des bénéficiaires



M. POUAGA Oukpi Mouyila,
Chef canton de Natchitiki
USP Natchitiki, Dankpen, Région de la Kara

« Avant, le taux de mortalité infantile était trop élevé. Depuis la mise en place de l'Unité de soin (USP), non seulement le taux a baissé mais nos enfants et leurs mères sont aussi en meilleure santé. Nous remercions le Président de la République, le Gouvernement du Togo et ses partenaires ».



Mme OUDEI Warahimatou, accoucheuse
CMS Koussountou, Tchamba, Centrale

« Nous remercions le Président de la République, MSPS et le Gouvernement du Togo au nom de la communauté de Koussountou. Avec le CMS, les femmes des 22 villages du canton peuvent désormais accoucher sur place. Nous pouvons éviter désormais la mortalité infantile et autres désagréments par exemple les fausses couches lors des transferts vers Tchamba ».

1.3 Volet « Education »

L'accélération des travaux des chantiers en cours a permis de réceptionner 193 salles de classes, 43 bureaux magasins, 16 blocs administratifs, 118 blocs latrines et 37 laboratoires dans 11 collèges d'enseignement généraux (CEG), 43 écoles primaires publiques (EPP) et 7 lycées.

Par ailleurs, 149.149 manuels scolaires, 64 mallettes pédagogiques et 5.640 mobiliers de bureau et tables bancs ont été réceptionnés en début d'année 2018 et les dispositions sont prises pour la distribution régionale dans le cadre de la rentrée scolaire 2018 – 2019.

7 juin 2018 : Inauguration des salles du CEG Djintoyi (Région des plateaux) équipés en mobiliers et tables bancs et dotés de manuels scolaires.

Pour le professeur K. Tchakpele, Ministre des enseignements primaire et secondaire et de la formation professionnelle du Togo qui s'exprimait à l'inauguration des salles de classe au CEG Djintoyi à Atakpamé « A travers le PUDC Togo, les élèves et enseignants disposent désormais de meilleures conditions de travail à travers la mise à disposition d'un Bloc pédagogique de 4 salles de classes + Laboratoire équipé - d'un bloc administratif comportant des bureaux et salle de réunion - de mobiliers répartis en 120 tables - bancs à raison de 30 par classe + 33 chaises + 5 tables pour Enseignants + 1 bureau pour Directeur + 1 fauteuil pour Directeur + 4 tables simples + 5 étagères ».



Les populations, élèves et professeurs dans la Préfecture d'Anié très inquiets à l'approche des pluies qui rendaient impossible la fréquentation du collège, sont désormais rassurés selon le Directeur d'école.

Mademoiselle Yena Reine Eyram, élève, témoigne des avantages d'avoir une école équipée avec des salles de classe « Désormais nous ne retournerons plus dans nos maisons quand le ciel menace – Nous nous sentons comme les autres élèves du pays et nous remercions le gouvernement togolais et ses partenaires dont le PNUD d'avoir amélioré nos conditions d'études avec notamment le matériel didactique et des laboratoires fonctionnels ».

1.4 Volet « Infrastructure socio-collective de base »

Ce volet est mis en œuvre à travers des partenariats stratégiques tissés avec les agences gouvernementales que sont l'Agence Nationale de Développement à la Base (ANADEB) et le Programme National de Plateformes Multifonctionnelles (PN-PFTM).

En ce qui concerne, le partenariat avec l'ANADEB, les travaux de constructions ont été finalisés pour les 3 marchés préfectoraux, 3 maisons de la femme, le centre polyvalent de jeunes, 5 hangars, 8 blocs latrines, 10 forages et 5 magasins. Il est important de souligner que ces infrastructures ont été entièrement équipées et les travaux ont permis de créer 918 emplois temporaires.

Photo du maison de la femme de Notsè



Le projet d'installation de 40 plateformes multifonctionnelles (PTFM) solaires, mis en œuvre par la PN-PTFM, a véritablement démarré en 2018 avec la finalisation du processus d'acquisitions des équipements qui sera livré en début d'année 2019 et la formation des groupements en développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et en techniques de création d'entreprises.

Photo des bénéficiaires de l'abri PTFM d'Ogou Kolidé



1.5 Volet « Hydraulique et Assainissement »

L'Agence Nationale de Salubrité Publique (ANASAP) a été dotée de 12 camions bennes pour le ramassage d'ordures dans le Grand Lomé.

En ce qui concerne l'assainissement pluvial dans le Grand Lomé, les travaux d'aménagement du canal d'évacuation des eaux pluviales de la dépression du triangle des rails vers le grand canal d'équilibre (GCE) du quartier d'Hanoukopé ont été finalisés et le canal est désormais fonctionnel.

Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de 54 mini réseaux d'Adduction en Eau Potable (AEP) dans les 5 régions de Lomé ont effectivement démarrés au second semestre de l'année 2018 avec un taux d'avancement moyen de 56% au 31 décembre 2018.

Finalement, les études de faisabilité de 629 forages positifs sur l'ensemble du territoire national ont été également réalisées.

Quelques photos des activités du volet « Assainissement et Hydraulique réalisées en 2018



Cérémonie de remise officielle des 12 camions bennes à l'ANASAP (Madame la Représentante du PNUD remettant symboliquement les clés à Monsieur le Ministre)



Vue du canal de Hanoukopé construit



Centre de traitement de l'eau potable réhabilité - Animadè dans la région de la Kara



Nouveau forage en cours d'installation à Wahala dans la région des Plateaux

1.6 Volet « Energie »

Le projet d'installation de 10.000 lampadaires sur tout le territoire du Togo a démarré avec la finalisation de la phase pilote en juillet 2018 (104 lampadaires solaires – voir le tableau ci-dessous).

Tableau 1 : Liste des localités ayant bénéficié de lampadaires au cours de la phase pilote

Régions	Préfectures	Cantons	Localités	Lot 1 (Standard)	Lot 2 (Chargeur)	Lot 1 (Chargeur + Wi-Fi)	Total
Maritime	Lacs	Fiata + Ganave	Adjove	16	4	-	20
Maritime	Vo	Akoumape	Asso	16	4	-	20
Maritime	Vo	Akoumape	Apegan	16	4	-	20
Maritime	Vo	Akoumape	Vodje	16	4	-	20
Maritime	Vo	Sevagan	Sevatonou	16	4	-	20
Maritime	Golfe	Nykonapoe	Direction Générale de l'Energie	-	-	1	1
Maritime	Golfe	Aflao Gakli	Lycée Agbalepedogan	-	-	1	1
Maritime	Golfe	Agoenyive	Lycée Agoenyivé	-	-	1	1
Maritime	Golfe	Aflao Sagbado	Lycée Technique Adidogome	-	-	1	1
Total des lampadaires installés				80	20	4	104

A ce jour, 2.090 lampadaires ont été livrés à Lomé (530 standards, 1.030 dotés de chargeurs et 530 dotés de chargeurs et spots Wi-Fi).

La première phase d'installations de 1.465 lampadaires a débuté au cours du dernier trimestre de 2018 avec l'acheminement dans les préfectures des kits pour une installation des lampadaires prévue au premier trimestre de l'année 2019.

Quelques photos des activités du volet « Energie » réalisées en 2018



Un utilisateur chargeant son cellulaire à partir des lampadaires avec chargeur installés dans le cadre de la phase pilote



Déploiement des lampadaires dans la préfecture du Golfe en présence du Préfet pour la première phase d'installation

1.7 Volet « Agriculture »

Les rapports définitifs des études techniques pour finaliser les plans d'aménagement de 12 zones agricoles protégées (ZAAP) sont en cours de validation par l'équipe technique conjointe du PUDC et du Ministère de l'Agriculture. Après ces validations techniques, des études approfondies de faisabilité des plans seront lancées au cours de l'année 2019 afin de démarrer les travaux d'aménagement des 12 ZAAPs.

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelle des acteurs nationaux

Plusieurs sessions de formation ont été organisées pour le renforcement de capacités des acteurs techniques et des bénéficiaires pour tous les volets de la composante 1 du programme. Les sessions réalisées au cours de l'année 2018 sont les suivantes :

50 chauffeurs et mécaniciens d'ANASAP ont suivi une formation sur la conduite et la maintenance de pour la gestion durable des 12 camions bennes acquis pour le compte de l'ANASAP



Photo d'une mécanicienne de l'ANASAP lors de la séance de formation (Grand Lomé)

Le PUDC a également organisé une formation de maintenance pour 28 chauffeurs, mécaniciens et techniciens biomédicaux du MSPS – dont une femme – pour une utilisation optimale des ambulances acquises pour le compte du MSPS.

Une trentaine de participants composés de plusieurs partenaires d'exécution du PUDC et des projets PNUD ont été formés sur la gestion des lettres d'accord (LOA) et l'utilisation du certificat d'autorisation des Financements et de certifications des dépenses (FACE) pour optimiser le cadre du partenariat avec le PNUD pour une meilleure efficacité et célérité dans la mise en œuvre des activités du PUDC.

En vue d'assurer une utilisation optimale et pérenne des cliniques mobiles acquises, une formation sur le fonctionnement, la maintenance des engins et des équipements biomédicaux et de laboratoire a été organisée à l'attention de 24 participants, à raison de 4 personnes par jour pour chaque région (1 VNU+1 point focal cliniques mobile+1 technicien maintenance+ 1 chauffeurs). Cette formation a été assurée par le fournisseur des cliniques mobiles.

Quelques photos sur la formation pour un fonctionnement optimal des cliniques



Séance de formation des agents du MSPS sur la gestion et le fonctionnement des cliniques mobiles (Grand Lomé)



Séance pratique d'utilisation de la clinique mobile par les agents du MSPS (Grand Lomé)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LOA signée avec le PN-PTFM pour l'installation de 40 plateformes multifonctionnelles dans les cinq régions administratives du Togo, un atelier de

renforcement des capacités des acteurs sur l'utilisation du Global Positioning System (GPS) a été organisé du 28 au 30 novembre 2018 à Tsévié à l'intention de dix-neuf (19) participants dont cinq (05) femmes. L'atelier a permis de renforcer les capacités de la Cellule de Coordination du PN-PTFM et des Agences de Relais Locale (ARL) dans la géolocalisation des infrastructures communautaires dont la PN-PTFM est appelée à installer.

Finalement, dans le cadre de la coopération sud-sud, le Gouvernement du Togo a reçu une forte délégation gouvernementale du Tchad, du 14 au 18 novembre 2018, pour partager l'expérience du Togo pour la mise en œuvre du PUDC afin de capitaliser sur les leçons apprises pour l'exécution d'un programme similaire – Programme d'Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive (PADLFIT) – en cours de lancement par le Gouvernement du Tchad.



Représentation du PNUD en compagnie de la délégation du gouvernement tchadien

Composante 3 : Développement de l'entrepreneuriat rural

Les activités du recrutement du consultant pour le développement de la stratégie, l'identification des groupements et autres, n'ont pu être lancées en 2018 en l'absence de financements adéquats.

Composante 4 : Développement du Système d'Information Géoréférencé (SIG) des infrastructures et équipements

Le recrutement d'une expertise en matière de SIG a permis au programme d'avancer considérablement sur le dossier de développement de la plateforme. Ainsi, en étroite collaboration avec l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), un cahier de charges a été développé. Ce cahier de charges est axé sur les priorités nationales et met au cœur du développement de la plateforme, une standardisation des outils existants (l'utilisation du logiciel ArcGIS) et l'implication de tous les acteurs sectoriels.

Au cours du dernier trimestre de l'année 2018, le prestataire de services a été sélectionné pour le développement de la plateforme dont les travaux (acquisition de licences, développement des spécifications indiquées dans le cahier de charges) débiteront en début janvier 2019.

Etat financier au 31 décembre 2018


Etat d'exécution budgétaire

Le budget du PUDC est estimé à 155,15 milliards de francs CFA pour les trois années d'exécution du Programme couvrant la période 2016-2018.

Au 31 décembre 2018, 33,1 milliards francs CFA, représentant 21% du budget ont été effectivement mobilisés à raison de 28 milliards FCFA sur fonds propres du Gouvernement du Togo et 5,1 milliards à partir des fonds de contrepartie Japonaise (fonds KR) tel qu'illustré dans le graphe ci-dessous.

Graphe 1. Etat de l'utilisation des ressources au 31 décembre 2018


En millions de francs CFA

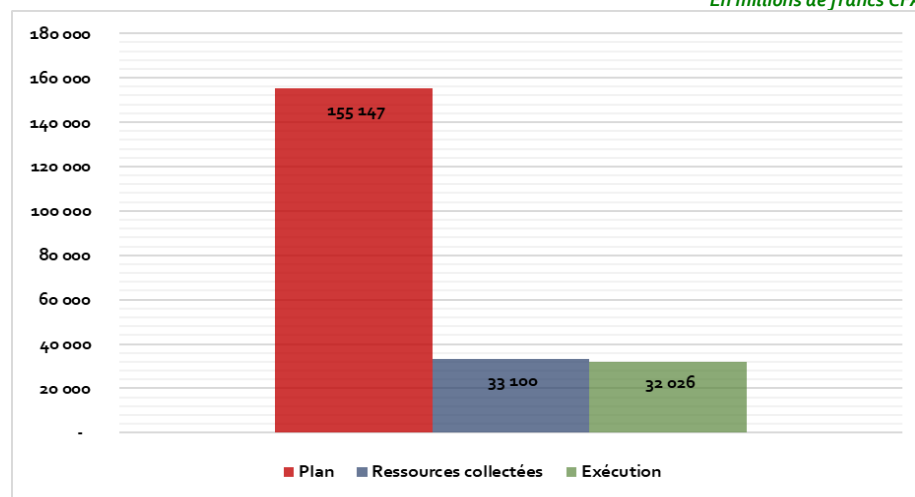

Au 31 décembre 2018, 32,03 milliards FCFA ont été utilisés pour la mise en œuvre des activités du Programme. Cette exécution représente 97% des ressources mobilisées et 21% du budget global. Le graphe 2, qui présente l'état d'exécution du budget sur la période 2016-2018, indique que les ressources mobilisées n'ont pas été en adéquation avec la planification annuelle pour l'année 2018 d'où un gap de financement de 44,89 milliards FCFA constaté par rapport aux prévisions de 2018.

Graph 2. Etat d'exécution budgétaire sur la période 2016-2018


En millions de francs CFA

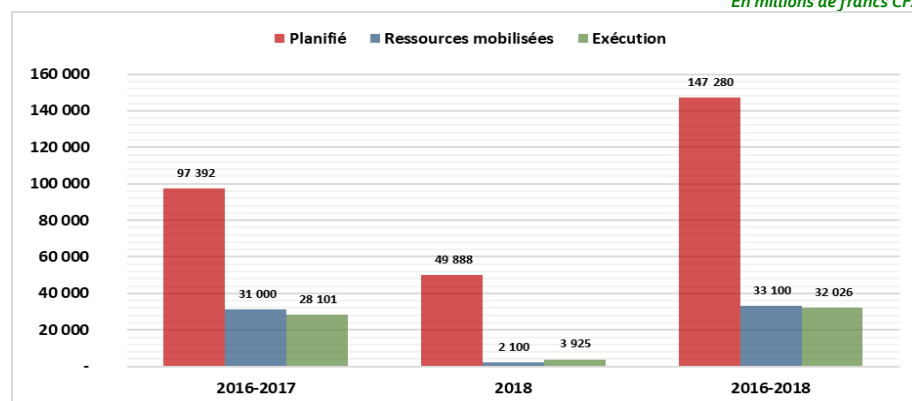

Au titre de l'année 2018, sur la base de 34,6 milliards FCFA inscrit dans la loi de finances 2018, le PUDC a mobilisé 2,1 milliards de FCFA à partir des fonds de contrepartie Japonaise (fonds KR). A ce montant de ressources mobilisées, s'ajoute le reliquat de ressources non engagées au titre de l'année 2016 et 2017 s'élevant à 2,89 milliards de FCFA soit un total de 4,99 milliards de FCFA de ressources disponibles pour l'exercice 2018. Sur un montant total planifié de 49,89 milliards FCFA⁶ pour la période 2018, , soit une exécution budgétaire de 3,92 milliards de francs CFA ou 8% du montant planifié ; ce qui représente une consommation de près de 80% des ressources disponibles en 2018 (voir le graphe ci-dessous pour plus de détails).

Graph 3. Etat d'exécution budgétaire sur la période 2018

En millions de francs CFA

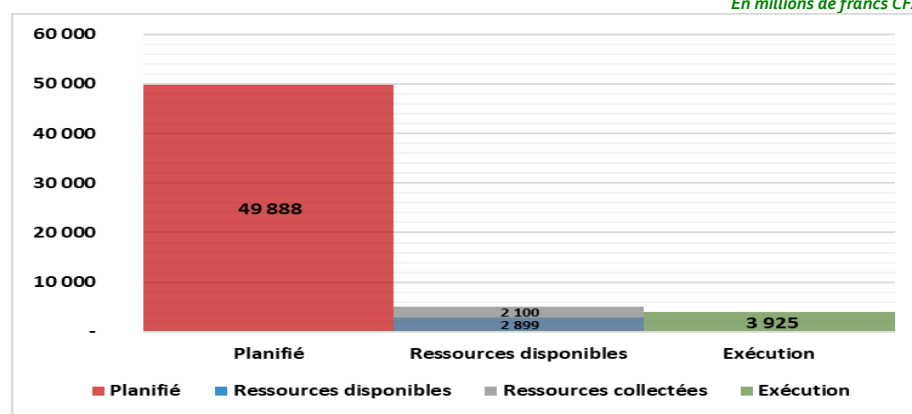

⁶ Le montant de 49,89 milliards de FCFA a été planifié sur la base de 34,6 milliards de FCFA inscrit dans la loi de finances 2018 votée et adoptée le 21 décembre 2017 par l'Assemblée Nationale auquel s'ajoutent la contrepartie japonaise du riz monétisé (fonds KR) pour un montant de 1,1 milliards et le reliquat des ressources attendues au titre de l'année 2017 mais non encore versé dans les comptes du PUDC s'élevant à 14,1 milliards FCFA. Le reliquat des ressources attendues et non versées au titre de l'année 2017 est composé de reliquat d'appel de fonds auprès du Gouvernement pour un montant de 10 milliards FCFA, de l'autorisation approuvée de la contrepartie japonaise pour 2,1 milliards FCFA et du solde des ressources versées dans les comptes du PUDC mais non encore engagées d'environ 2 milliards.

Etat de trésorerie

Pour rappel, les ressources mobilisées et disponibles pour l'année 2018 s'élevaient à 2,89 milliards FCFA. En 2018, le PUDC a reçu une contribution de 2,1 milliards de FCFA du Gouvernement du Japon (fonds KR) portant ainsi le montant total des ressources disponibles à 4,99 milliards FCFA pour le financement des activités de 2018 sur la base d'un plan de travail budgétisé à 49,89 milliards de FCFA d'où un besoin de financement de 44,89 milliards FCFA. Toutes ces ressources ont été utilisées pour effectuer les décaissements de l'ordre de 2,5 milliards francs CFA et prendre des engagements matérialisés par la signature de contrats et l'émission de bons de commandes pour un montant de 1,42 milliards FCFA, soit une utilisation totale de ressources de 3,93 milliards FCFA. Le reliquat de ressources disponibles à la date du 31 décembre 2018 était de 1,07 milliards FCFA (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 2. Etat de l'utilisation des ressources au 31 décembre 2018

En millions de francs CFA

	Ressources disponibles en début d'exercice (a)	Contributions Ressources Propres ^(#) (b)	Contributions Ressources Externes ^(*) (c)	Autres Contributions (d)	Total Ressources Disponibles (e=a+b+c+d)	Dépenses (f)	Solde en fin d'exercice (g=e-f)	Engagements (h)	Ressources disponibles non engagées (i=g-h)	Financement activités planifiées non exécutées (j)	Besoins en financement (k=l-j-k)
2016	-	18 000,00	-	-	18 000,00	2 901,62	15 098,38	501,26	14 597,11	20 891,04	-6 293,93
2017	14 597,11	10 000,00	3 000,00	-	27 597,11	11 646,03	15 951,08	13 052,35	2 898,73	48 399,93	-45 501,20
2018	2 898,73	-	2 100,00	-	4 998,73	2 503,52	2 495,21	1 421,23	1 073,98	45 963,07	-44 889,09

(#): Ressources propres du Gouvernement tel qu'inscrit dans la loi de finances

(*): Ressources mobilisées auprès de partenaires externes et inscrit dans la loi des finances (fonds de contrepartie Japonaise - fonds KR)

Suivi-Evaluation, Leçons apprises et risques identifiés

Suivi-Evaluation

Au cours de l'année 2018, l'organe suprême de gouvernance du PUDC, c'est-à-dire le comité de pilotage s'est réuni le 29 mars 2018 au Nouveau palais de la présidence, sous l'égide de son Excellence Monsieur Komi Sélom Klassou, Premier Ministre, Président du Comité de pilotage du PUDC, pour passer en revue l'état d'avancement technique et financier du programme et donner des orientations sur la mise en œuvre future.

Il est important de noter qu'un dispositif de suivi-évaluation articulé autour du suivi du registre des risques ainsi que l'organisation des missions conjointes PUDC – ministères sectoriels est en place pour s'assurer de la bonne exécution des activités. Ainsi, plus de 60 missions (conjointes) de supervision, réception et de lancement des activités ont été effectuées pour le suivi des activités réalisées sur le terrain et échanger avec les populations sur leur appréciation et satisfaction quant aux réalisations dont elles bénéficient. Ces missions permettent également de recueillir des témoignages sur les différentes réalisations.

Parallèlement au suivi des activités, une communication accrue est effectuée par le partage des réalisations du programme au grand public à travers la mise en place d'un logo, le lancement d'un site internet public (<http://pudctogo.org>), des publications régulières sur les réseaux sociaux (Twitter, en outre), des feedbacks réguliers au Gouvernement du Japon. Des produits de communication et de capitalisation écrits et audiovisuels sur les résultats du programme ont été réalisés et partagés avec le gouvernement et les partenaires.

Gestion du risque et difficultés liées à l'exécution du programme

Le principal risque dont la probabilité est grande et l'impact critique pour la survie du programme est lié à l'indisponibilité des ressources financières pour la mise en œuvre des activités. Malgré la mise en place d'une stratégie de mobilisation et les immenses efforts fournis pour attirer des ressources autres que celles domestiques, le programme n'a pu collecter que 2,1 milliards FCFA à travers l'aide alimentaire japonaise (fonds KR).

Par ailleurs, le non-fonctionnement effectif du comité technique ne permet pas de faciliter la communication sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme ainsi que la création des synergies d'interventions multisectorielles. Ainsi, il apparaît plus qu'urgent de rendre effectif le fonctionnement dudit comité pour les activités futures du programme.

Conclusion et Perspectives

Plusieurs dossiers de passation de marché en cours de finalisation et pour lesquels des fonds additionnels sont urgentement requis sont indiqués ci-dessous, à savoir :

- L'acquisition de 5 cliniques mobiles spécialisées entièrement équipées ;
- Les travaux de construction des ponts de Biankouri et Hahopkodji ;
- L'installation de 3 stations de pompage sur les bassins de rétention d'eau dans Lomé ;
- Les travaux de réalisation de 600 forages positifs dans les cinq régions ;
- Les travaux complémentaires pour la finalisation de la première phase de la lettre d'accord signée avec l'ANADEB pour la réalisation d'infrastructure socio-économiques ;
- Les activités de renforcement de capacités et du développement de l'entrepreneuriat rural pour les populations bénéficiant des infrastructures réalisées en vue d'assurer leur durabilité, y compris les travaux de cantonnement des tronçons de 406 kilomètres linéaires de pistes rurales réhabilitées ;
- Les travaux de construction et réhabilitation de 800 kilomètres linéaires de pistes rurales ;
- Les travaux d'aménagement de 12 zones agricoles protégées (ZAAP) dans les cinq régions ;
- La finalisation de la plateforme du Système d'Information Géoréférencé (SIG), y compris l'acquisition des licences et la formation des techniciens des différents ministères sectoriels ;
- Les travaux de construction d'infrastructure de santé et d'éducation dont le nombre et les sites seront déterminés en concertation avec les ministères sectoriels.

Annexe 1 : Etat détaillé du statut des travaux par volet, site, type de travaux exécutés lors de la première phase du PUDC

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
EDUCATION	Savanes	60	LA MONTANTE	HYDROBAT	TANDJOUARE	EPP NATOMONE	28,198,055	21,250,477	75%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	62	ECBE	HYDROBAT	TANDJOUARE	EPP TAMPALIGOU	19,732,817	18,746,176	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	67	LAMPOUGUINI	HYDROBAT	TONE	LYCEE NAKI-OUEST	37,405,306	33,712,259	90%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	59	LAMPOUGUINI	HYDROBAT	OTI	CEG LOKO	37,405,306	33,903,058	91%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	65	TTTI	HYDROBAT	TONE	EPP NAMPANTE	36,332,635	21,047,152	58%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	61	TTTI	HYDROBAT	TANDJOUARE	EPP BALALONGUE	36,332,635	26,607,913	73%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	66	TTTI	HYDROBAT	TONE	EPP NACRE 1	36,332,635	29,164,115	80%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	56	MADEBA	HYDROBAT	OTI	EPP NAGBATI	29,238,514	26,340,138	90%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	58	MADEBA	HYDROBAT	OTI	EPP YEYOTAMA	29,238,514	23,899,402	82%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	57	MADEBA	HYDROBAT	OTI	EPP KOUBENGOU	29,238,514	26,318,627	90%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	64	SAINT JOSEPH COBA	HYDROBAT	KPENDJAL	EPP TIMBENDI	24,180,370	21,868,115	90%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Savanes	63	SAINT JOSEPH COBA	HYDROBAT	KPENDJAL	EPP BAGTANTCHAL	17,893,696	16,135,936	90%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	44	Groupeement CETA/ICC	CIP-AFRIQUE	Bassar	EPP TCHAPOSSI/B	23,291,372	14,539,264	62%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	45	NASR	CIP-AFRIQUE	Bassar	EPP MANGA	23,967,106	17,251,303	72%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	46	MAYAH CONSULT	CIP-AFRIQUE	Bassar	EPP LIWATCHOUL	24,533,562	19,621,752	80%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
EDUCATION	Kara	47	MAYAH CONSULT	CIP-AFRIQUE	Bassar	EPP YAKEDJI	24,533,562	19,625,595	80%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	48	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	Bassar	CEG BINADJOUBE	37,979,360	31,072,069	82%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	51	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	Dankpen	EPP OUBOUNA 1	22,240,000	19,767,217	89%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	52	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	Dankpen	EPP LIBOUNDJAL	22,240,000	19,440,140	87%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	53	MADEBA	CIP-AFRIQUE	Dankpen	EPP KPABOL	28,112,514	25,723,970	92%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	54	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	Dankpen	LYCEE BAPURE	37,979,360	33,764,563	89%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	55	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	BASSAR	CEG MANGA	37,979,360	33,409,321	88%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	68	TCHAMIE ET FILS	CIP-AFRIQUE	DOUFELGOU	EPP TAGBADE	24,253,758	22,198,059	92%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Kara	69	NASR	CIP-AFRIQUE	DOUFELGOU	LYCEE BAGA	32,754,332	21,068,271	64%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	35	CEEGC	BETIA	Blitta	EPP Tchihié	22,036,048	20,934,245	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	36	Groupeement CETA/ICC	BETIA	Blitta	CEG Tchaloudè	39,159,176	32,491,647	83%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	37	ENTBTP	BETIA	Tchaoudjo	EPP Tchoubong	28,000,000	25,246,644	90%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	38	Groupeement MBK / GENELEC	BETIA	Tchaoudjo	EPP Woroyo	28,941,000	19,783,149	68%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	40	ECNC	BETIA	Tchamba	EPP Assoula	37,203,890	35,343,696	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	41	CEEGC	BETIA	Tchamba	CEG Sourou-hèzou	41,263,630	39,200,449	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Centrale	42	Groupeement CETA/ICC	BETIA	Tchamba	EPP Gnamassillé	23,291,372	16,538,954	71%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
EDUCATION	Centrale	43	NASR	BETIA	Tchamba	LYCEE Afossala	33,211,022	21,421,159	65%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	28	EB SOSSA	EVP/BTECC	ANIE	CEG DJINTO-YI	42,441,536	42,441,536	100%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	18	GENIE BATISSEUR	EVP/BTECC	HAHO	EPP FARE-COPE	24,292,434	23,057,906	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	19	ECOSTAR	EVP/BTECC	HAHO	EPP AGOKPA	24,997,603	21,449,861	86%	98%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	20	ENTBTP	EVP/BTECC	OGOU	LYCEE AGBO-NOU	47,000,000	44,650,000	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	21	Groupeement CETA/ICC	EVP/BTECC	OGOU	CEG DOULASSAME	46,387,554	25,500,640	55%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	22	ELCO BTP	EVP/BTECC	OGOU	EPP MIVA MAROMI	28,163,170	26,754,985	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	25	ELCO BTP	EVP/BTECC	ANIE	EPP BANAS-SIM	28,163,170	21,223,781	75%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	23	BE LA PAIX	EVP/BTECC	OGOU	CEG SADA	32,361,363	30,743,295	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	30	BE LA PAIX	EVP/BTECC	AMOU	EPP AMOU-BLO G/E	22,359,580	21,241,601	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	31	BE LA PAIX	EVP/BTECC	AMOU	LYCEE AMOU-BLO	33,129,680	31,473,196	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	32	BE LA PAIX	EVP/BTECC	AMOU	EPP ADAM-COPE	22,862,850	12,906,771	56%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	24	ECBE	EVP/BTECC	ANIE	EPP ANIE KPASSA G/B	27,366,116	25,997,810	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	26	Groupeement MBK / GENELEC	EVP/BTECC	ANIE	EPP KAOURA KOSSI KPANDJA	28,389,000	26,784,550	94%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Plateaux	27	Groupeement MBK / GENELEC	EVP/BTECC	ANIE	CEG GLITTO	41,393,793	28,025,515	68%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
EDUCATION	Plateaux	29	ETOCA	EVP/BTECC	AMOU	EPP EZIME G/A	21,543,492	16,241,379	75%	72%	Livrés et réceptionnés	En cours
EDUCATION	Plateaux	33	REC TOGO	EVP/BTECC	AMOU	EPP LOUGBA	30,597,322	25,233,991	82%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	1	ICOB TP	AGECET-BTP	GOLFE	EPP BAGUIDA CENTRE	22,084,184	19,852,287	90%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	2	ICOB TP	AGECET-BTP	GOLFE	EPP COTOCOLI ZONGO/A	24,141,313	20,776,648	86%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	5	SGMG	AGECET-BTP	GOLFE	EPP KLEME-SANGUERA	23,607,025	16,684,955	71%	97%	Non Livrés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	6	ICOB TP	AGECET-BTP	GOLFE	EPP AWATAME/A	21,235,863	20,174,070	95%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	7	PHILABA TC	AGECET-BTP	GOLFE	LYCEE DE BE-KLIKAME	37,622,934	16,525,408	44%	36%	Non Livrés	Résilié
EDUCATION	Maritime	8	ZAZU	AGECET-BTP	YOTO	EPP KOKOUHOE	26,466,626	5,293,325	20%	99%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	9	EGBR	AGECET-BTP	YOTO	EPP AHOEGAHOE	30,099,983	27,404,243	91%	100%	Livrés et réceptionnés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	10	ETRANE	AGECET-BTP	YOTO	CEG KINI KONDI	38,721,152	29,516,715	76%	75%	Non Livrés	En cours
EDUCATION	Maritime	11	LA MONTANTE	AGECET-BTP	YOTO	EPP VIDE KOPE	27,334,849	21,133,874	77%	100%	Non Livrés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	12	ETRANE	AGECET-BTP	VO	CEG MOME KATIOHOE	38,721,152	25,183,353	65%	80%	Non Livrés	En cours
EDUCATION	Maritime	13	C2M	AGECET-BTP	VO	LYCEE DE ZOOTO	39,590,309	37,513,588	95%	100%	Non Livrés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	14	ECOSTAR	AGECET-BTP	VO	EPP AGNAVE	25,264,957	21,678,407	86%	98%	Non Livrés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	15	BE LA PAIX	AGECET-BTP	ZIO	EPP AGBELOUVE-MARCHE	22,359,580	18,270,421	82%	100%	Non Livrés	Réceptionné
EDUCATION	Maritime	16	C2M	AGECET-BTP	VO	EPP ATCHANDOME/B	21,203,507	19,697,105	93%	100%	Non Livrés	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
EDUCATION	Maritime	17	BEC RAPC	AGECET-BTP	ZIO	EPP ATIKPAME	25,000,193	15,722,524	63%	99%	Non Livrés	Réceptionné
HYDRAULIQUE	Maritime		SOGEA SATOM	Direction de l'Assainissement	GOLFE	AHANOUKOPE	230,003,315	228,553,315	99%	100%	N/A	Réceptionné
HYDRAULIQUE	Maritime	1	CHM	AGECET-BTP/CETRI	ZIO, VO, AGOENYIVE, AVE	Djagblé-Amélibomé, Gati, Sun, Kovie, Assome Sevagan, Akoumapé-Atchanvé, Vogome, Akepe, Noepe	404,442,000	139,010,516	34%	41%	N/A	En cours
HYDRAULIQUE	Plateaux	2	ACOTEC/SINERGIE/SOTENA	EVP/2EC	HAHO, OGOU, EST MONO	Assrama, Wahala, Datcha, Gleï, Gbadjahe, Moretan	247,255,000	-	0%	30%	N/A	En cours
HYDRAULIQUE	Centrale	3	EEPC/TIMIAM	CANAL EAU/BECATE C	BLITTA, SOTOUBOUA, TCHAOUDJO, TCHAMBA	Langabou, AGBANDI, TCHALOUDE, KANIAMBOUA, ADJENGRE, AOUA, LAMATESSI, AGOULOU, KRIKRI, KOULOUMI, BALANKA, KOUSSOUNTOU, KABOLI GOUBI	708,500,325	-	0%	34%	N/A	En cours
HYDRAULIQUE	Kara	4	ZENITH/GENERTEL	ICR/GERTEC	KOZAH, BASSAR, BINAH, DOUFELGOU	ATCHANGBADE, KABOU, SOLA, ANIMADE	337,730,500	27,161,000	0%	35%	N/A	En cours

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
HYDRAULIQUE	Savanes	5	Energie Stable	BSH	CINKANSE, TONE, KPENDJAL, TANDJOUARE, OTI	TIMBOU, NANERGOU, NAKI OUEST, TAMI, KORBONGOU, PAPRI, POGNO, BAGOU PARK, NANO, YEMBOUR, BOMBOUAKA, BARKOSSI, SAGBIEBOU, GANDO	52,937,680	19,849,500	75%	98%	N/A	En cours
PISTES	Maritime	Lot 1	OFMAS INTERNATIONAL	BETIA	ZIO/ AVE	Davié (RN 1) - Assomé - Noépé (RN 5)	662,975,294	619,584,213	93%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Maritime	Lot 2	EGA/SONAF	BETIA	AVE	Assahoun (RN 5) - Gapé Kpédzi	606,816,500	556,985,500	92%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Maritime	Lot 3	LE PROGRES	BETIA	ZIO	Gapé Centre - Agbélouvé (RN 1)	340,670,266	276,733,000	81%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Maritime	Lot 4	GER	BETIA	ZIO/ YOTO	Agbélouvé (RN 1) - Zafi - Ahépé (RN 4)	838,317,630	720,241,367	86%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Plateaux	Lot 1	ESMO/GEBATE C	SIGEM-BAOBAB/GIC MALI	AKEBOU	Kamina- Wadanyi- Kpalavé- Ayagba-Kotora- Kougnohou	660,892,580	489,076,488	74%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Plateaux	Lot 2	GROUPEMENT EGA/SONAF	SIGEM-BAOBAB/GIC MALI	AKEBOU	Jonction Kpalavé- Ayagba-Kotora- Kougnohou	486,292,600	410,367,595	84%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Plateaux	Lot 3	GROUPEMENT EGA/SONAF	SIGEM-BAOBAB/GIC MALI	AKEBOU	Wadanyi- Kabanyi	342,522,200	292,657,703	85%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Plateaux	Lot 4	ECNC	SIGEM-BAOBAB/GIC MALI	AKEBOU	Sérégbéné- Danyigan,	363,895,100	345,458,278	95%	100%	N/A	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
Jonction Kpalavé-Kotora												
PISTES	Centrale	Lot 1	ECOPA-K	ICR	TCHAMBA	Kousountou-Balanka-Fré Bénin -	416,559,000	416,533,950	100%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Centrale	Lot 2	Gpt ELITE / CETA / ICC	ICR	TCHAMBA	Balanka – Kouloumi -	361,327,000	319,552,120	88%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Centrale	Lot 3	EGC	ICR	TCHAMBA	Tchamba - Krikri - Kazakalé - Fré Bénin -	489,269,700	489,269,609	100%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Kara	Lot 1	GER	GROUPEMENT POLY CONSULT/AC EP	DOUFELGOU/DANKPEN	Alloun - Broukou - Namon	621,225,175	477,624,751	77%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Kara	Lot 2	GER	GROUPEMENT POLY CONSULT/AC EP	Dankpen	Namon - Guérin Kouka	768,954,685	611,858,372	80%	99%	N/A	Réceptionné
PISTES	Kara	Lot 3	MECBAP/SOSAF	GROUPEMENT POLY CONSULT/AC EP	Dankpen	Guérin Kouka - Kidjaboum	559,509,919	552,509,919	99%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Kara	Lot 4	EBTP/LE NZI	GROUPEMENT POLY CONSULT/AC EP	Dankpen	Kidjaboum - Katchamba	468,483,950	374,066,555	80%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Savanes	Lot 1	EBTP/LE NZI	BECATEC	TANDJOUARE	Tandjouaré - Bogou - Yembour - Fré Ghana	583,753,480	534,053,480	91%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Savanes	Lot 2	EBTP/LE NZI	BECATEC	TANDJOUARE	RN1-Nano-Doré (12 km) + Piste Nano-Bagou (9 km)	810,578,920	607,198,125	75%	98%	N/A	Réceptionné
PISTES	Savanes	Lot 3	GER	BECATEC	TANJOUARE/TONE	Doré-Dassoute-Warkambou-Frontière Ghana	595,901,755	472,243,734	79%	100%	N/A	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
PISTES	Savanes	Lot 4	EGA/SONAF	BECATEC	TONE	Dapaong - Karssome - Djabargou - Yanyane - Lotougou	886,609,000	784,627,987	88%	100%	N/A	Réceptionné
PISTES	Savanes	Lot 5	TECHNICOM	BECATEC	CINKASSE	Sintoti - Bianbouri - RN 1	365,440,000	245,443,745	67%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes	15	CEVEMAC	HYDROBAT	KPENDJAL	USP PAPRI	44,720,003	42,484,003	95%	100%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Savanes	7	BESTT/SOSAF	HYDROBAT	TANDJOUARE	USP NASSONGUE	66,341,747	54,914,355	83%	99%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Savanes	13	EBTP/LEN'ZI	HYDROBAT	OTI	CHP MANGO	213,649,128	152,646,505	71%	79%	Livrés non installés	En cours
SANTE	Savanes	4	TCB SARL	HYDROBAT	OTI	USP KOUMONGOUK AN & USP BAOULE	120,470,608	99,046,364	77%	98%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Kara	1	REC	CIP-AFRIQUE	KOZAH	CMS d'Awandjelo	101,418,105	62,418,613	45%	65%	Livrés non installés	En cours
SANTE	Kara	14	EGB&TP	CIP-AFRIQUE	DANKPEN	USP de Natchitikpi	36,711,844	32,509,832	89%	99%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Centrale	2	BANZAÏ BTP	BETIA	Tchamba	CMS de Koussountou	119,359,735	101,456,485	61%	98%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Centrale	3	ESAKAO SARL	BETIA	Tchaoudjo	USP d'Agbandaoude	62,820,628	56,540,360	90%	99%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Centrale	6	IGP	BETIA	Blitta	USP de katchenké	55,783,131	50,206,595	90%	100%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Centrale	8	EB SOSSA	BETIA	Sotouboua	USP de Saïboudè	69,061,760	58,702,133	60%	99%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Plateaux	5	PHILIBATC	EVP/BTECC	HAHO	USP de Gbowoulé	59,118,580	11,823,716	20%	15%	Livrés non installés	Résilié
SANTE	Plateaux	10	EB SOSSA	EVP/BTECC	OGOU	CMS AGBONOU	117,541,650	102,665,125	87%	95%	Livrés non installés	Réceptionné

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
SANTE	Plateaux	12	BESTT	EVP/BTECC	KLOTO	l'hôpital préfectoral	149,119,622	129,435,474	75%	87%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Maritime	9	C2M	AGECET-BTP	ZIO	CMS D'ADETICOPE	52,443,528	36,605,446	70%	99%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Maritime	11	REC	AGECET-BTP	GOLFE	L'HOPITAL DE BE KPOTA	141,359,557	92,085,254	20%	50%	Livrés non installés	En cours
SANTE	Maritime		EGBR	AGECET-BTP	GOLFE	CMSAdéticopé	7,363,200	6,626,880	90%	100%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Maritime		EGBR	AGECET-BTP	VO	CMS Wogba	7,363,200	6,626,880	90%	100%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Maritime		EGBR	AGECET-BTP	GOLFE	Agoè Démakpoè	7,363,200	6,626,880	90%	100%	Livrés non installés	Réceptionné
SANTE	Plateaux		EGBR	EVP/BTECC	HAHO	GBOWOULE	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Plateaux		EGBR	EVP/BTECC	WAWA	GBADIKOUNYA	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Plateaux		EGBR	EVP/BTECC	WAWA	KESSIBO Wawa	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Centrale		EGBR	BETIA	Sotouboua	SAIBOUDE	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Centrale		EGBR	BETIA	Tchaoudjo	AGBANDAOUDE	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Centrale		EGBR	BETIA	Blitta	KATCHETCHE	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Centrale		EGBR	BETIA	Blitta	TCHAREBAOU	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Centrale		EGBR	BETIA	Tchamba	BALANKA	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Kara		EGBR	CIP-AFRIQUE	Danken	Possao	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Kara		EGBR	CIP-AFRIQUE	Kozah	AWANDJELO	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné

Sous-Composantes	Régions	Lot	Entreprises	Mission de contrôle des travaux	Préfecture	Site des Travaux	Montant du marché après avenants (en F CFA)	Total décomptes	Taux de décaissement %	Taux d'exécution (%)	Statut des équipements en mobiliers scolaires	Statut Final
SANTE	Kara		EGBR	CIP-AFRIQUE	Bassar	BANGHAI	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	KPENDJAL	Papri	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	TANDJOUARE	Doukpergou	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	TANJOUARE	Nasong	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	OTI	Baoulé	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	OTI	Galagachi	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné
SANTE	Savanes		EGBR	HYDROBAT	OTI	Koumongoukan	7,363,200	6,626,880	90%	100%	N/A	Réceptionné

Annexe 2 : Etat d'avancement des travaux exécutés dans le cadre de la LOA signée avec l'ANADEB pour le volet « Infrastructures sociocommunitaires »

Régions	Préfectures / Localités	Type de réalisation	Cibles fin projet	Niveau d'exécution physique Déc 2017	Niveau d'exécution physique Déc 2018	Nombre d'emplois créés	Observations
Savanes	Oti/Mango	Maison des jeunes	100%	86%	100%	18	Travaux achevés.
Kara	Dankpen / Guérin-kouka	Marché préfectoral	100%	80%	100%	150	Travaux achevés, y compris l'installation de lampadaires
Kara	Kozah/Lama	Maison de la femme	100%	100%	100%	-	Achevé en 2017
Centrale	Blitta /Blitta	Marché de type préfectoral	100%	93%	100%	150	Travaux achevés.
Centrale	Blitta/ Blitta	Dallage au sol et construction de caniveau	100%	0%	100%	30	Travaux complémentaires présentement achevé
Centrale	Blitta /Blitta	Réhabilitation de deux hangars	100%	0%	100%	15	Travaux complémentaires présentement achevé
Centrale	Sotouboua	Maison de la femme	100%	100%	100%	-	Achevé en 2017
Plateaux	Est Mono / Elavagnon	Marché de type préfectoral	100%	91%	100%	150	Travaux achevés.
Plateaux	Est Mono / Elavagnon	Dallage au sol	100%	-	100%	30	Travaux achevés.
Plateaux	Haho/Notsè	Maison de la femme	100%	100%	100%	-	Achevé en 2017
Maritimes	Grand Lomé	Ouvrages communautaires (hangars, magasins, latrines, forage) dans 15 communautés	100%	87%	100%	375	Travaux achevés.

Annexe 3 : Etat d'avancement des activités réalisées par le PN-PTFM dans le cadre de la LOA signée pour la mise en œuvre du volet « Infrastructures sociocommunautaires » du PUDC

Produits escomptés du plan de pays et indicateurs avec cibles annuelles	Activités prévues	Résultats prévus	Etat de mise en œuvre	Résultats obtenus	Taux de réalisation	Observations
Installation de 40 plateformes multifonctionnelles	Acquisition, installation et mise en marche des équipements PTFM	40 PTFM installées et fonctionnelles	Activité en cours	Trois (03) prestataires sont sélectionnés pour la fourniture et l'installation des équipements PTFM	50%	L'acquisition et l'installation des équipements sont en cours
	Réceptions provisoires des installations	2 réceptions des ouvrages réalisés	Activité non réalisée	-	0%	Les réceptions provisoires sont conditionnées par l'installation complète des équipements PTFM
	Communication pour la visibilité (reportage, émission radio et télé)	Forfait	Activité non réalisée	-	0%	Cette activité est conditionnée par l'installation des équipements PTFM
	Frais de prestation des ARL dans les cinq régions	Les ARL ont bénéficié d'un appui financier dans les cinq régions	Activité réalisée en 2017	Les frais de prestation sont payés aux ARL dans les cinq régions	100%	
	Missions trimestrielles de suivi/ supervision de la Cellule de Coordination	4 missions de suivi/supervision réalisées	Activité en cours	Une mission conjointe a été organisée au troisième trimestre	25%	
Renforcement des capacités des acteurs (bénéficiaires et partenaires)	Formation des comités de gestion en gestion opérationnelle	40 sessions réalisées et 240 membres des comités de gestion formés	Activité non réalisée	0	0%	Cette activité est conditionnée par l'installation des équipements PTFM
	Formation des membres des groupements en développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR)	5 sessions réalisées et 120 femmes formées	Activité en cours	Le contrat est signé avec le consultant recruté pour la formation	20%	Un consultant est retenu à l'issue d'une consultation restreinte pour la formation qui est programmée au premier trimestre 2019
	Formation des membres des groupements en technique de création d'entreprise	2 sessions et 80 femmes formées	Activité en cours	Le contrat est signé avec le consultant recruté pour la formation	20%	Un consultant est retenu à l'issue d'une consultation restreinte pour la formation qui est programmée au premier trimestre 2019
	Organisation des visites d'échanges des gestionnaires des PTFM	5 visites réalisées dont une par région	Activité réalisée en 2017	Cinq (5) visites d'échanges effectuées ; 245 participants (147 femmes et 98 hommes)	100%	
	Organisation des auto-évaluations des PTFM	90 PTFM évaluées	Activité réalisée en 2017	90 PTFM évaluées	100%	

Produits escomptés du plan de pays et indicateurs avec cibles annuelles	Activités prévues	Résultats prévus	Etat de mise en œuvre	Résultats obtenus	Taux de réalisation	Observations
	Renforcement des capacités des réseaux d'exploitants PTFM	Les capacités de 5 réseaux régionaux renforcées	Activité réalisée en 2017	221 membres (99 femmes et 112 hommes) ont participé aux Assemblées Générales de 5 réseaux régionaux d'exploitants. 45 membres des cinq réseaux (27 femmes et 18 hommes) sont formés sur la gestion d'un réseau	100%	
	Formation des artisans	1 session	Activité en cours	Le processus de sélection d'un consultant s'est révélé infructueux	0%	Un consultant a été sélectionné à l'issue d'une consultation restreinte mais son offre financière dépasse les prévisions budgétaires. Le processus doit être repris en 2019
	Formation des réseaux d'artisans	Les capacités de 5 réseaux d'artisans renforcées	Activité réalisée en 2017	52 membres (tous des hommes) ont participé aux Assemblées Générales des 5 réseaux d'artisans et 25 membres sont formés sur la gestion d'un réseau	100%	Les artisans ne sont composés que des hommes
	Formation, équipement des ARL et la cellule de coordination sur l'utilisation du GPS	1 session	Activité réalisée en 2018	Le contrat est signé avec un prestataire pour la fourniture des équipements et la formation	100%	Le prestataire a un délai maximum d'un mois pour l'exécution du contrat
	Achat d'ordinateurs de bureau et accessoires pour les ARL	5 ordinateurs	Activité réalisée en 2018	5 ordinateurs sont achetés et mis à la disposition des ARL	100%	
	Acquisition des appareils photos pour les ARL	5 appareils	Activité non réalisée	-	0%	L'offre financière du fournisseur le moins disant est de 4 887 500 F CFA pour ces appareils photos contre une prévision de 625 000 F CFA soit un dépassement de 4 262 500 F CFA. Le processus doit être repris en 2019
	Acquisition d'une imprimante à couleur pour le PN-PTFM	1 imprimante	Activité réalisée en 2018	1 imprimante à couleur est achetée et mise à la disposition de la cellule de coordination du PN-PTFM	100%	
	Evaluation de la première phase du PN-PTFM	1 évaluation	Activité réalisée en 2018	Le rapport définitif de l'évaluation est disponible	100%	

Annexe 4 : Matrice de contribution du PUDC à la réalisation des ODD au Togo



Note : Le PUDC est en lien avec 15 des 17 ODDs

Annexe 5 : Détail de l'arrimage du PUDC aux ODD

ODD	Effets dans le cadre du PUDC
	Objectif principal PUDC (lutte contre la pauvreté et les inégalités en milieu rural) et qui contribue au développement de 24 préfectures réparties dans les cinq régions du Togo avec les actions spécifiques suivantes :
ODD 1	✓ Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ✓ de désenclaver plusieurs localités, ✓ de construire les centres de santé équipés, ✓ 10 cliniques mobiles équipés et qui apporter des soins presque gratuits dans les villages les plus reculés du Togo aux populations démunies, ✓ plusieurs écoles construites et équipés en mobiliers, fournitures scolaires, ✓ les infrastructures socio communautaires, ✓ développer l'énergie durable, appuyer au développement de l'entrepreneuriat rural et activités génératrices de revenus.
ODD 2	✓ Le développement de 1 000 ha de ZAAP, ✓ les appuis au développement des cultures maraichères conduites en goutte à goutte, ✓ la fourniture des équipements de petite agriculture et de transformation, ✓ l'accompagnement pour la promotion des chaînes de valeur, le développement de l'entrepreneuriat rural agricole
ODD 3	✓ L'accès à l'eau potable à travers la densification de 6 châteaux d'eau, le désenclavement et l'allègement des travaux domestiques avec les équipements de transformation post récoltes, les plateformes multifonctionnelles, la promotion de l'énergie solaire, des équipements adéquats pour les soins dans les hôpitaux qu'on aura construit et cliniques mobiles qu'on aura achetées
ODD 4	✓ l'accès aux salles de classes, l'enseignement de qualité, ✓ l'accès à l'eau potable dans les écoles et à domicile (disponibilité et corvée d'eau des enfants réduites) ✓ et à l'électricité (temps d'apprentissage et accès aux TIC), sont des intrants fondamentaux pour l'éducation et la santé
ODD 5	✓ L'autonomisation des femmes est rendue possible via l'accès aux financements et le renforcement de capacité des organisations de producteurs et des groupements de femmes, ✓ Le développement des AGR, l'installation de nouvelles plateformes multifonctionnelles,

ODD		Effets dans le cadre du PUDC
ODD 6	Garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau	✓ La construction des marchés modernes et l'appui aux bénéficiaires pour la transformation des produits alimentaires, fabrication des savons liquides, fabrication des pagnes BATICK ✓ La promotion des chaînes de valeur lait et production maraîchère renforcent l'autonomisation des femmes ✓ L'accès à l'eau et la densification du réseau contribue à libérer les jeunes filles des corvées domestiques
		✓ Les infrastructures de base (629 forages à construire, 50 mini AEP à réhabiliter et 6 châteaux d'eau à densifier ✓ Plusieurs bassins de rétention d'eau d'orage et plusieurs km de caniveaux à curés et entretenir afin d'éviter les risques d'inondation, ✓ Plusieurs camions d'enlèvement des déchets urbains, Concourent à garantir un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement
		✓ Fourniture d'électricité par voie de raccordement au réseau en MT & BT et par voie solaire dans les villages et agglomérations pauvres de Lomé etc. ✓ Installation de 10000 lampadaires solaires équipés en wifi et prises électriques, ✓ Modules électricité et prises des 40 plateformes multifonctionnelles solaires
ODD 7	Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable	✓ Développement de l'entrepreneuriat rural et activités génératrices de revenus à travers les services financiers et non financiers prévus par le PUDC
ODD 8	Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	✓ Infrastructures d'éducation, ✓ Infrastructure de santé et équipements, infrastructures routières, ✓ infrastructures socio communautaires, ✓ l'Energie durable, ✓ infrastructures d'hydraulique et d'assainissement
ODD 9	Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	✓ La mise en œuvre du PUDC (prévision de 155 milliards) vise à lutter de façon générale contre la pauvreté et les inégalités sociales entre notamment le milieu rural et urbain ; les régions périphériques et centrales ; les hommes et femmes
ODD 10	Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein	✓ 406 km de pistes rurales déjà réhabilitées et qui permet de désenclaver au moins 200 à 250 villages ou une population rurale de plus -600 000 hbt, ✓ 180 salles de classes construites dans 63 écoles, et 16 centres de santé construites ou réhabilitées et équipés, 3 marchés préfectoraux ou cantonaux construits et équipés
ODD 11	Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables	✓ Promotion de techniques modernes de production à travers les ZAAP (mise en place des ZAAP, entrepreneuriat rural), ✓ Meilleure productivité : appui à la transformation, conservation de produits (entrepreneuriat rural) ✓ Promotion de l'énergie solaire à travers la mise en place de 40 plateformes multifonctionnelles solaires, 10 000 lampadaires solaires, 629 forages à motopompes solaires ou mixtes etc.
ODD 12	Instaurer des modes de consommation et de production durables	✓ La mise en œuvre des infrastructures socioéconomiques du PUDC (construction des marchés, écoles et pistes rurales etc.) et l'aménagement de grands espaces (1000 ha de ZAAP) pour l'agriculture, généreront des impacts négatifs à internaliser à travers les mesures de précaution, de compensation ou d'atténuation des effets environnementaux conformément aux recommandations de l'évaluation stratégique d'impact environnemental et social qui a été élaboré avec l'appui de l'ANGE
ODD 13	Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions	
ODD 14	Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable	
ODD 15	Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité	✓ A travers le développement des ZAAP (1 000 ha prévues) avec des appuis techniques durables des paysans dont les études de faisabilité techniques, économiques et environnementales sont finalisées, le PUDC contribue efficacement à une exploitation durable des sols et de l'environnement : - Réduction des techniques non maîtrisées qui appauvrissent inutilement les sols et qui polluent, - Reconversion d'une partie de la population rurale qui s'adonnaient à des activités non soutenables économiquement et écologiquement (charbons des bois, destruction anarchique de la forêt, feu de brousse etc.) vers le développement des activités plus rentables et soutenables (40 Plateformes multifonctionnelles solaires, l'agriculture intensive et appui à la mise en marché des produits, la transformation agroalimentaire, l'entrepreneuriat rural etc.), les autres activités génératrices de revenu (petit commerce, artisanat etc.)

ODD		Effets dans le cadre du PUDC
ODD 16	Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes	✓ Voir également ODD 15
		✓ Les réalisations du PUDC contribuent à stabiliser les populations dans leur terroir à travers les infrastructures socioéconomiques de base et développement des activités génératrices de revenus, réduire leurs vulnérabilités (exode rural, émigration clandestine et risquée des jeunes vers les pays industrialisés, terrorisme, trafic transfrontalier, etc.)
ODD 17	Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat	✓ Le partenariat Gouvernement du Togo-PNUD à travers le PUDC constitue un exemple de partenariat innovant où c'est plutôt l'Etat togolais qui finance en partie le projet que le PNUD gère au profit de la communauté.
		✓ La réussite de ce benchmark pourrait inaugurer une collaboration nouvelle entre les organismes onusiens et les pays en développement.
