

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE

Rapport du 2ème trimestre 2026

Trimestre en chiffres

990

mètres linéaires de dalots préfabriqués.

781

mètres linéaires de buses et dalots posés sur les 799 ml prévus.

50

facilitateurs ont réalisé des diagnostics participatifs et des Évaluations des Vulnérabilités et des Capacités (EVC).

31

ONG / OSC ont commencé les activités sur le terrain.

20

comités communautaires formés sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et les violences basées sur le genre.

Analyse du contexte

Au deuxième trimestre 2026, la mise en œuvre du PRECOM à N'Djamena s'est inscrite dans un contexte de transition vers la saison des pluies, marqué par la montée des risques d'inondation et la nécessité d'intensifier les travaux d'assainissement et de voirie. Le retour des pluies en mai-juin a accentué la vulnérabilité des quartiers, compliquant la mobilité et augmentant les risques sanitaires, tandis que l'urbanisation rapide et anarchique, associée à des tensions foncières, a fragilisé la résilience communautaire. Face à ces défis, les autorités locales ont renforcé la concertation avec les délégués de quartiers et chefs de carrés afin d'impliquer les relais communautaires dans la lutte contre les inondations, la sécurité de proximité et l'assainissement urbain. Parallèlement, une mobilisation sociale accrue a sensibilisé les habitants à l'entretien des caniveaux et à la gestion des déchets pour réduire les blocages d'écoulement des eaux. Dans ce contexte, le PRECOM a priorisé la réalisation du programme d'intervention dans la catégorie des infrastructures de drainage et de voirie, au renforcement institutionnel par l'intégration des comités de résilience dans la gouvernance locale, et à une mobilisation communautaire intense à travers la mise en œuvre des microprojets, permettant ainsi de réduire les vulnérabilités urbaines et de consolider la résilience des communautés face aux contraintes climatiques.

Résumé exécutif

Le projet PRECOM a poursuivi ses interventions en faveur du renforcement de la résilience communautés de N'Djamena à travers des actions de gouvernance communautaire, de renforcement des capacités et de réduction des risques d'inondation. Les diagnostics participatifs réalisés dans cinq nouveaux arrondissements ont permis de finaliser la couverture des zones ciblées, tandis que 62 représentants issus de 31 OSC ont été formés sur la gestion des microprojets et les sauvegardes environnementales et sociales. Le projet a également renforcé les mécanismes de gouvernance locale avec la mise en place de quatre comités communautaires et la formation de 20 comités de gestion des plaintes.

Des avancées significatives ont été enregistrées dans les infrastructures communautaires avec la préfabrication de 990 mètres linéaires de dalots, dont 304 mètres déjà posés sur un objectif de 2 000 ml, ainsi que la pose de 781 mètres linéaires de buses et dalots sur les 799 ml prévus dans le 9e arrondissement. Les travaux de drainage communautaire réalisés par six OSC dans les 1er, 7e et 9e arrondissements ont contribué à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et l'accessibilité des quartiers. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du marché de Taradona sont en cours de finalisation. Deux microprojets d'espaces verts et de loisirs ont également été lancés et quatre sites ont fait l'objet d'études techniques en vue de futurs aménagements communautaires.


L'impact socioéconomique du projet demeure important avec la création de 35 948 jours-personnes d'emplois, dont 38 % occupés par des femmes, contribuant ainsi au renforcement de la résilience économique des ménages et à l'inclusion des groupes vulnérables. Malgré des contraintes opérationnelles liées notamment aux conditions climatiques et aux retards de financement, le projet maintient une dynamique satisfaisante, avec des perspectives favorables pour le prochain trimestre, notamment l'achèvement des infrastructures en cours, le lancement des trois forages communautaires et la poursuite du renforcement des mécanismes de suivi-évaluation.

Produit 2 : Maximiser l’impact des investissements dans les interventions urbaines.

Des diagnostics participatifs et des Évaluations des Vulnérabilités et des Capacités (EVC) regroupant 50 facilitateurs ont été réalisés dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements de N’Djamena, notamment à Goudji, Sabangali, Ardepdjoumal, Quartier Repos, Amriguébé et Paris Congo. Cette activité a permis d’atteindre 100 % de la cible fixée pour les diagnostics des 10 arrondissements de N’Djamena et d’identifier les besoins prioritaires des communautés en matière de résilience urbaine.





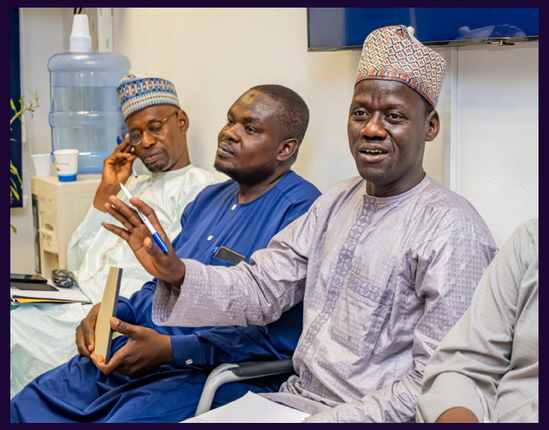



Produit 3 : Favoriser un leadership actif et représentatif des communautés au processus de prise de décision, d’exécution et de gestion des interventions urbaines.



62 participants représentant 31 OSC ont été formés sur la gestion des microprojets, les procédures administratives et financières, les sauvegardes environnementales et sociales, le suivi-évaluation, la mobilisation communautaire, le mécanisme de gestion des plaintes, ainsi que le genre et l’inclusion sociale pour assurer une mise en œuvre efficace des microprojets communautaires.



3 Comités Provisoires de Gestion Communautaire (CPGC) ont été mis en place dans les quartiers Atrone, Amtoukoui et Amtoukoui Alaya, regroupant 30 membres dont 57 % de femmes. Chacun des trois comités est présidé par une femme, témoignant de l’engagement du projet en faveur du leadership féminin et de la gouvernance communautaire inclusive.



Produit 4 : Améliorer tangiblement la qualité de vie des communautés dans les quartiers ciblés, réduire l'exposition et la vulnérabilité, et renforcer la résilience de manière inclusive et durable face aux défis climatiques.

- **6** ONG/OSC ont réalisé des travaux de drainage dans les 1er, 7e et 9e arrondissements de la ville de N'Djamena.
- **990** mètres linéaires de dalots préfabriqués, dont 304 mètres déjà posés sur un objectif de 2 000 ml.
- **781** mètres linéaires de buses et dalots posés sur les 799 ml prévus dans le 9e arrondissement.
- **2** microprojets d'espaces verts communautaires lancés et les études techniques de quatre sites réalisées générant 35 948 jours-personnes d'emplois, dont 38 % occupés par des femmes.
- Les travaux de réhabilitation du marché de Taradona sont en cours de finalisation.
- **3** forages communautaires sont en cours de réalisation au profit du marché d'Aderptimane, du marché de Taradona et du quartier Tamokessa.













Produit 5 : Assurer une meilleure compréhension, appropriation et leadership des bénéficiaires dans les initiatives de résilience au changement climatique, notamment les jeunes, les femmes, et les autres groupes en situation de vulnérabilité.

Le PRECOM a formé 20 comités communautaires sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et les violences basées sur le genre, tout en renforçant les capacités de 5 points focaux MGP et 5 points focaux VBG dans les arrondissements ciblés. Ces dispositifs ont permis le traitement de trois plaintes communautaires, tandis que deux autres sont actuellement en cours de traitement, contribuant ainsi au renforcement de la transparence et de la protection des bénéficiaires











Une discussion stratégique avec les médias, organisée par l'équipe de communication du PNUD, a réuni les différents projets, dont le PRECOM, afin de renforcer le dialogue avec les professionnels de l'information et d'échanger sur les enjeux liés à la visibilité des interventions. Ce cadre a permis de mettre en lumière les réalisations du projet, de recueillir les perceptions et recommandations des médias, et d'identifier des pistes de collaboration pour une communication plus efficace, cohérente et inclusive autour des résultats obtenus.







Partenaires

MATUH

Ministère de l'Aménagement du Territoire
de l'Urbanisme et de l'Habitat

BANQUE MONDIALE

PILIER

Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N'Djamena



PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

Immeuble Borkou, Boulevard de Paris,
Rue 1008, porte 915
N'Djamena, Tchad

© PNUD Tchad 2026
