



INFORME TRIMESTRAL

Título: Proyecto CONECTA+	
Informe elaborado por: Aldo Flores	Cargo en el proyecto: Coordinador Nacional
Periodo que reporta: Primer Trimestre 2020	
Fecha de elaboración: Abril 2020	

Parte A – Resumen y aspectos críticos:

Resumen del principal logro del proyecto del trimestre:			
Nivel de cumplimiento del plan trimestral:	Según previsto ()	Algunas actividades demoradas (X)	Más de la mitad de actividades con demora ()
Problemas y/o Limitantes Principales: 1. Retraso en actividades debido a Pandemia Mundial COVID 19. 2. Falta el shape final de los beneficiarios ya que no se ha hecho la corrección de la totalidad de las coordenadas.			

Parte B – Avance de Resultados/Productos

Resultado 1: Fortalecimiento del marco de gobernabilidad nacional y local del corredor biológico árido-húmedo, con énfasis en la interconectividad entre APs y sistemas productivos, para su contribución a la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.
Producto 1 Expedientes completados y presentados ante MiAmbiente conteniendo los requerimientos establecidos en el reglamento (632-2015) para apoyar la legalización de corredores biológicos.
Avance del trimestre: <i>Socializada y aceptada la propuesta de corredores biológicos del territorio de influencia del proyecto CONECTA+</i> A la fecha se ha socializado y validado la propuesta de corredores biológicos, así como la metodología empleada para la formulación ante la asamblea de la CONACOBH. La cual no solo tuvo buena aceptación ante el comité, si no que se acordó definirla como la metodología oficial para el establecimiento de corredores biológicos en Honduras. Igualmente se ha socializado la propuesta de corredores biológicos y metodología con los socios implementadores del Proyecto CONECTA+ para su validación y adopción, así como la planificación y coordinación de acciones conjuntas en el área de intervención del proyecto <i>Socializada la propuesta de corredores biológicos del territorio de influencia del proyecto CONECTA+ ante representantes de las organizaciones indígenas</i> A nivel de organizaciones indígenas se ha socializado la propuesta de corredores biológicos ante representantes y líderes de los pueblos Lenca y Maya chorti aglutinados en la MUPILH, CONIMCHH y ante la asamblea general de la CONADIMCHH. <i>Socialización a nivel regional y local y para la conformación de los comités de gestión de los corredores biológicos</i> Se ha iniciado la socialización de las propuestas de corredores biológicos con actores clave de cada región vinculados a algunos de los corredores propuestos. Se sostuvo una reunión con varios de los actores clave en el corredor de Joya de los Lagos dentro de estos se destacan AMUPROLAGO, ICF. ALDEA GLOBAL, HONDULAGO, LA ENEE, FUNDER Y UICN, de

la reunión resulto la necesidad de trabajar una matriz de funciones o roles de otros entes identificados y se programa una próxima reunión para concretar quizá ya el inicio de la conformación de un comité de seguimiento. Paralelo a esta iniciativa se definió que es necesario alinearse con otras actividades que el gobierno está planteando sobre conectividad en la región.

En seguimiento al proceso que compete a cada corredor, se están desarrollado términos de referencia para las consultorías a través de las cuales se van a elaborar las propuestas para cada corredor identificado (al menos 3).

- o Corredor Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de la Montañas.
- o Corredor Joya de los Lagos
- o Corredor biológico Guajiquire

Cada propuesta contendrá el expediente requerido para la solicitud del reconocimiento como un corredor biológico ante el Ministerio de Ambiente y el Instituto de conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

También se trabajará en la conformación del comité de gestión de cada corredor y su respectivo plan de acción.

Gestión de datos geoespaciales de los corredores biológicos propuestos

Se ha realizado la gestión y edición de los datos geoespaciales de los corredores biológicos para estimar las áreas, agrupar y desagregar corredores. Asimismo, se han generado mapas, nuevas vistas y además nuevos datos de interés para robustecer la información sobre los potenciales corredores.

Se ha compartido a nivel de proyecto CONECTA+ y socios implementadores, como a actores clave, los datos geoespaciales de la propuesta de corredores biológicos.

Producto 2 Planes de manejo nuevos o actualizados para 15 APs, incluyen arreglos de implementación y estrategia de sostenibilidad financiera.

Avance del trimestre:

Finalizado el estudio del estado y efectividad de la gobernanza en las áreas protegidas del territorio de influencia del proyecto

Se realizó estudio del estado de manejo y gobernanza de 16 áreas protegidas de la región de influencia del proyecto y la Sistematización del análisis. Producto de la consultoría se identificaron vacíos basados en tres de los parámetros analizados de los cuales se destacan los siguientes:

Gobernanza

Se comenta que ninguno de los convenios de comanejo actuales cuentan con un plan de acción con parámetros medibles y/o que permitan medir un nivel de avance, por lo que el diseño de los futuros convenios de Comanejo deberá mejorar la sección de Plan de Acción, de manera que puedan ser evaluados y ajustados periódicamente.

Una de las mayores debilidades en el convenio de comanejo es la escasa participación de organizaciones indígenas y de base. Hay interés por parte de las organizaciones indígenas en este tema, pero no tienen una propuesta concreta al respecto.

Los convenios de comanejo son muy generales y no definen responsabilidades concretas acerca del manejo de las áreas protegidas.

Sostenibilidad Financiera:

Ninguna área protegida cuenta con una estrategia de sostenibilidad financiera bien definida.

La mayoría de las organizaciones dependen de fondos públicos, ya sea del FAPVS o de las municipalidades y fondos de la cooperación internacional, pero los mismos no cubren las necesidades del plan de manejo quedando una fuerte brecha de financiamiento.

Diseño y Planificación:

Se recomienda hacer un esfuerzo para evaluar la categoría de manejo y hacer los ajustes al plan de manejo para que este responda a los objetivos y metas del área protegida.

Hay un alto potencial de lograr la conectividad entre áreas protegidas, sin embargo, los comanejadores no tienen una propuesta al respecto y las acciones son muy tibias o nulas.

Efectividad de Manejo:

Los respectivos comanejadores en estas áreas protegidas cuentan con personal, recursos y equipo mínimo para implementar el plan de manejo.

En las áreas protegidas evaluadas, es difícil determinar el número de personas destinadas al área protegida, ya que en su mayoría ejercen funciones a tiempo parcial o de manera temporal, o son voluntarios de organizaciones de base que trabajan en actividades de emergencia como el combate de incendios o inspecciones en actividades ilegales.

Objetivos de conservación:

Ninguna de las áreas protegidas cuenta con suficiente o adecuada información científica o un programa sistemático de monitoreo que le permita conocer el estado de conservación de los objetos de conservación o calidad de los bienes y servicios ecosistémicos que provee el área protegida.

Debe priorizarse el monitoreo de calidad de agua, pérdida de cobertura forestal, y especies indicadoras usando herramientas y equipo apropiado y considerando también el conocimiento local.

Promover alianzas con la academia para generar información científica en las áreas protegidas que permita aumentar el conocimiento de la misma y que sea útil para la toma de decisiones.

Para contribuir con algunos de estos vacíos se recomienda lo siguiente:
trabajar en 3 líneas estratégicas.

Desarrollo organizacional y de capacidades: con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores clave, como las comunidades locales, Pueblos indígenas y demás comanejeros involucrados en el manejo y gestión del área protegida.

Efectividad en la gestión de las áreas protegidas: con el objetivo de promover redes de conectividad entre las áreas protegidas, impulsar modelos de gobernanza equitativos vinculando o fortaleciendo cadenas de valor agrícolas para la implementación de buenas prácticas.

Maximizar los beneficios de los bienes y servicios eco sistémicos: con el objetivo de promover la implementación de mecanismos de compensación y fortalecer las empresas agrícolas basadas en los recursos naturales a fin de dar valor a los espacios protegidos.

Además, en el referente de la gobernanza, por medio de esta consultoría se definió una propuesta de un protocolo de inclusión de los pueblos indígenas el cual tiene que ser discutido ampliamente para su implementación y poder garantizar la inclusión de los pueblos indígenas en las plataformas de gobernanza de áreas protegidas, microcuencas y así mismo en los corredores biológicos.

Búsqueda de espacios de coordinación y sinergias en el territorio de influencia del proyecto para desarrollar acciones de gobernanza en las áreas protegidas

Se han desarrollado reuniones con actores clave de interés estratégico para el cumplimiento de los objetivos del proyecto relacionados al manejo de áreas protegidas:

- ✓ Se han sostenido acercamientos y reuniones de trabajo con la MOCAPH y el Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF (DAPVS) para analizar, discutir y concertar algunas acciones conjuntas y apoyar iniciativas de formulación, revisión, actualización y culminación de procesos de construcción de planes de manejo de algunas áreas protegidas, como ser el del Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara y PN Montaña de Celaque, Montecristo, y Guajiquiro. Así como revisar el avance de elaboración del plan de manejo de Pacayita para apoyar su culminación.
- ✓ Con la Mancomunidad Guisayote, se han dado encuentros para identificar necesidades, en la gestión del área protegida Refugio de Vida Silvestre Montaña de Erapuca, complementado con la actualización de su plan de manejo.
- ✓ Con ASOMAINCUPACO, se sostuvieron jornadas de trabajo para la identificación de necesidades de apoyo para la realización de acciones de manejo para el área protegida con categoría de **Zona Protectora de Agua Reserva El Jilguero**, como la necesidad actual de reestructurar la normativa y actualización del plan de manejo.
- ✓ Con la mancomunidad MAPANCE-PROCELAQUE y la Fundación Comunitaria Puca se han identificado y definido estrategias de planificación e implementación de acciones para las áreas protegidas que gestionan, relacionadas al apoyo en la actualización del plan de manejo y terminar de preparar el expediente de redefinición de los límites geográficos del RVS Montaña Puca, como también al diseño y planificación para la

gestión efectiva de ambas áreas protegidas. Las cuales se espera llevar a cabo a través de algunos mecanismos de cooperación como la prestación de servicios.

- ✓ Luego de varias reuniones de trabajo con Proyecto Aldea Global, está por concretarse un convenio de cooperación para desarrollar acciones del plan de manejo del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar (PANACAM), especialmente dirigidas al diseño y planificación para la gestión efectiva del área protegida.
- ✓ A través de la coordinación general del proyecto CONECTA+ se ha realizado reunión preliminar con equipo técnico de la DiBio con la finalidad de planificar y coordinar acciones conjuntas relacionadas a la gestión de la biodiversidad y ecosistemas en el marco de los objetivos perseguidos por el proyecto, tales como el establecimiento de corredores biológicos, la buena gestión de áreas protegidas y de sitios de importancia para la conservación.
- ✓ Ya se han concertado algunas iniciativas con la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque (AESMO) para desarrollar algunas líneas de acción para la gestión de conservación y manejo de las áreas protegidas Reserva Biológica Güisayote y Reserva Biológica Volcán Pacayita.

Identificación y acercamiento con otros actores de interés para la ejecución del proyecto

A través del ICF a nivel regional de occidente se han tenido contacto con la Organización para el Desarrollo de Corcuín (ODECO) con la finalidad de identificar y concretar la coordinación para ejecutar conjuntamente algunas actividades relacionadas al manejo de áreas protegidas en su zona de influencia y de interés para el proyecto.

También se tuvo acercamiento e intercambio de información de interés común y de manera general con representantes de la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP), para buscar puntos de convergencia y de coordinación para realizar trabajos conjuntos de interés del proyecto. De igual manera se tuvo conversaciones e intenciones de coordinar acciones con la organización Árbol de Misericordia, en el territorio correspondiente al Corredor Biológico Joya de los Lagos, donde se localizan algunas áreas protegidas como el PANACAM, el Área de Uso Múltiple Lago de Yojoa y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara (PNAMOSAB), así como otras áreas aledañas de conservación privadas.

Participantes de jornadas con espacios para socializar propuesta de corredores biológicos

Actividad	Hombres	Mujeres	Total
Pueblo indígena lenca (MUPILH)	1	1	2
Pueblo indígena maya chorti' (CONADIMCHH)	96	45	141
Pueblo indígena maya chorti' (CONIMCHH)	3	-	3
CONACOBH	15	9	24
Socios implementadores CONECTA+	15	8	23
Comanejadores (PAG, ASOMAINCUPACO, MAPANCE, Fundación comunitaria Puca, Mancomunidad Guisayote)	9	2	11
Otros (ICF Siguatepeque, MOCAPH, Árbol de Misericordia)	6	3	9
Totales	145	68	213

Producto 3 Planes de manejo para las 62 microcuencas de los corredores seleccionados.

Avance del trimestre:

Apoyo (en coordinación con actores clave) para la elaboración de informes sobre rendición de cuentas de JAAS a presentar ante la DRRSAP

Como estrategia operativa del proyecto CONECTA+ y con el objetivo de fortalecer a las organizaciones en el empoderamiento de las actividades relacionadas al manejo de microcuencas y específicamente, acciones de gobernanza hídrica; Se ha concretado un mecanismo de prestación de servicios, en el cual ASOMAINCUPACO a través de un contrato de consultoría denominado "Fortalecimiento de capacidades a organismos de cuencas, juntas administradoras de agua y comité técnico de comanejo en el área de influencia del área protegida con categoría de Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero, en el corredor seco de Honduras", realiza acciones para fortalecer las capacidades de las 122 Juntas Administradoras de Agua, 4 consejos u organismos de cuenca de la ZPA Reserva El Jilguero, la Reserva Biológica Montecillos, con actuaciones puntuales en la Reserva Biológica Guajiquire, apoyando específicamente en el tema de rendición de cuentas como una de las obligaciones de las organizaciones de sociedad civil en el cual tienen la obligación de la preparación de planes e informes según formatos exigidos por la Secretaría de Gobernación a través del Ente

Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), siendo una debilidad aun, el proyecto CONECTA+ a través de la ASOMAINCUPACO, les fortalece y capacita en este sentido.

Es importante destacar que ya se ha hecho la entrega de un primer producto que contiene la estrategia de abordaje de este tema y las herramientas sugeridas por las unidades del ente fiscalizador del Estado, además conteniendo:

Resultados relevantes del primer informe de avance

- ✓ Cincuenta (50) juntas administradoras de agua han elaborado sus informes técnicos y financieros de los cuales 26 son del municipio de Opatoro, 12 del municipio de Chinacla y 12 del municipio de Marcala.
- ✓ Cincuenta (50) juntas administradoras de agua han elaborado sus Planes Operativos Anuales de los cuales 26 son del municipio de Opatoro, 12 del municipio de Chinacla y 12 del municipio de Marcala.
- ✓ Elaboración de informes técnicos-financieros y presentados a la DIRRSAC, de cuatro consejos de microcuenca: Consejo de Microcuenca Paniaguara, Cimarrón, Río León y Quebrada Honda.

Producto 4 Comités de gestión Mi Ambiente o ICF o Co-manejo de las 15 AP desarrollados y/o fortalecidos (*coordinación, equipamiento, capacitación, enfoque de género, participación de organizaciones indígenas*)

Avance del trimestre: No se ha comenzado a trabajar en este producto.

Producto 5 Consejo de Cuenca y consejos de microcuencas FAO o UICN (incluye Juntas de Agua) establecidos y/o fortalecidos para el manejo de las 62 microcuencas seleccionadas (1 en cada municipio del área del proyecto) con participación plena de las organizaciones indígenas para la toma de decisiones.

Avance del trimestre:

Fortalecimiento de estructuras locales de gobernanza hídrica

Se contrató los servicios de un consultor para llevar a cabo la consultoría “Fortalecimiento de las capacidades de juntas administradoras de agua y organismos de cuencas en su funcionamiento y gobernanza (Rendición de cuentas y planificación de la gestión hídrica) para la protección de sus microcuencas como unidades de conectividad estructural, dentro de los corredores propuestos del corredor seco de Honduras”, y a partir del mes de febrero se inició con trabajos para fortalecer capacidades y estructuras de juntas de agua y organismos de cuencas en su gobernanza hídrica de su territorio y específicamente la rendición de cuentas. El alcance territorial donde se realiza esta consultoría es específicamente en zonas del Corredor Biológico Trifinio y el CB Reserva del Hombre y Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas, que comprenden las áreas protegidas PN Montaña de Celaque, RB Montaña de Puca, RB Volcán Pacayita, RB Opalaca y el RVS Montaña Verde, y con el mismo objetivo de fortalecer y capacitar a Juntas administradoras de agua en la rendición de cuentas y además en cómo manejar sus recursos naturales en las microcuencas que localizan en las áreas protegidas dentro del corredor seco de Honduras, con el fin de conservar sus microcuencas y contribuir a la conectividad paisajística de los corredores biológicos priorizados en el marco del Proyecto CONECTA+.

El trabajo de la consultoría se centrará en la capacitación y asistencia técnica para fortalecer a las JAA y/u organismos de cuenca y la elaboración de 234 expedientes conteniendo informes técnicos y financieros, planes de trabajo y todos los requisitos para mantener la legalidad de estas organizaciones.


Siendo las microcuencas una unidad básica en el establecimiento de los corredores biológicos, como proyecto se ha dado énfasis en apoyar a los organismos que gestionan estos territorios (Microcuencas) y un apoyo puntual es la contribución en acciones de gobernanza hídrica, en ese sentido las demás contrataciones de servicios con los demás comanejadores está enfocada en ese trabajo, además de las acciones manejo las áreas protegidas que gestionan como productos relacionados con el trámite de reconocimiento de los corredores biológicos.

Acciones sobre gestión hídrica postpuestas por la crisis sanitaria a consecuencias del COVID-19 pero ya planificadas y preparadas para su ejecución

Fortalecimiento de capacidades del Comité Técnico de la FHONDIL para el comanejo de la Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero, a través del intercambio de experiencias de iniciativas implementadas en el manejo de la Reserva Biológica Puca y Güisayote. El propósito principal de la actividad es intercambiar conocimientos con la Fundación Puca sobre las acciones de comanejo que realizan, conocer la estrategia utilizada por la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque para desarrollar procesos de compra de tierras para conservación y protección en la Reserva Biológica de Güisayote y el uso del sistema de información para el monitoreo forestal (Terra-i) de la reserva. Jornada que se tuvo que suspender por la crisis de salud actual que vive todo el país.

<p>Producto 6 Resoluciones municipales para esquemas de incentivos fiscales MI AMBIENTE (exención / deducción de impuestos) a propietarios privados y territorios indígenas que implementan prácticas sostenibles (vinculados a los acuerdos del Componente 2)</p>
<p>Avance del trimestre: ONUMA</p>
<p>Producto 7 Instrumento para capitalizar el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre MI AMBIENTE (con énfasis a las 15 AP priorizadas por el proyecto) con recursos derivados del sector privado productivo.</p>
<p>Avance del trimestre: ONUMA</p>
<p>Producto 8 Estrategia de sostenibilidad financiera FAO para las 15 APs que conforman el corredor de conservación biológica (incluyendo planes de negocios, beneficios de exención de impuestos para los productores, recursos provenientes del FAPVS).</p>
<p>Avance del trimestre: ONUMA</p>
<p>Producto 9 Programa de formación, acceso a los mercados MI AMBIENTE (operadores turísticos, gestores y guías) y distribución de beneficios para las APs derivadas de la observación de aves y el agroturismo (estos se articularán con la Ruta Lenca).</p>
<p>Avance del trimestre: ONUMA</p>
<p>Producto 10 Programa de monitoreo y conservación de felinos (Puma, Ocelotes, Yaguarundi, Caucel) y Quetzales para las 15 AP seleccionadas.</p>
<p>Avance del trimestre: OCP-OPEV</p>
<p>Producto 11: Plataforma nacional y regional del café y cacao IHCAFE – HEIFER – FUNDER establecidas para la gobernanza y ordenamiento en toda la cadena de valor, consideran indicadores de productividad, sostenibilidad ambiental y resolución de conflictos sociales.</p>
<p>Avance del trimestre: Se desarrollaron dos reuniones de coordinación con la mesa de La paz, que tenían como objetivo la planificación de actividades para el festival de Café Cultura de Marcala , la vinculación que pudieran tener los socios, sin embargo por el tema de la emergencia el festival no se dio como otros años, ya que no tuvo la misma asistencia de personas, este festival se llevó a cabo del 12 al 15 de marzo 2020, el resto de mesas no se trabajaron este trimestre, se espera avanzar con este resultado en el 2do Trimestre 2020.</p>
<p>Producto 12: Estrategia nacional y local de comunicación MI AMBIENTE (concienciación y sensibilización, participación y retroalimentación) para la aplicación de las prácticas de manejo sostenible de paisajes productivos, corredores biológicos y APs.</p>
<p>Avance del trimestre: Primer festival de mariposas en Honduras Se apoyó esta actividad por ser una actividad contributiva a empoderar a la población de la zona sobre la riqueza natural de la región que comprende el corredor biológico denominado Joya de los lagos, Fomentar el interés de la población sobre la importancia y diversidad de las mariposas de Honduras dentro un entorno natural (Valle Esmeralda) donde los propietarios han estado levantando un inventario por tres años, cabe destacar la participación de representantes de la UICN así como miembros como fue el caso de Oswaldo Munguía de la agencia para el desarrollo de La Mosquitia y en general participaron: 16 mujeres y 12 hombres, haciendo un total de 28 personas asistentes.</p>
<p>Resultado 2: Generación de beneficios ambientales, sociales y económicos a través del manejo sostenible de la tierra y la rehabilitación de corredores para aumentar la conectividad entre las APs y paisajes de producción.</p>
<p>Producto 1: HMP conectan sistemas de producción con APs (microcorredores biológicos, enriquecimiento de bosques, cercas vivas, barreras de viento, y manejo de la leña).</p>
<p>Avance del trimestre: Con la idea de fomentar el liderazgo de nuestros jóvenes estudiantes del Técnico Universitario en Caficultura Sostenible y la idea de que repliquen los conocimientos adquiridos a lo largo del primer año de estudio, se les dio la tarea de que ellos elijan a 10 productores de su zona, este año trabajaremos con 550 productores de la zona de influencia del proyecto, de estos ya se han reportado en la plataforma del SIGIHCAFE 539, 143 mujeres y 396 hombres, los 11 restantes esperamos tenerlos identificados lo más pronto posible. Estos serán los productores con los que se trabajarán los acuerdos de implementación de buenas prácticas; asimismo, se continuará trabajando con los 1202 productores de la primera etapa elegidos el año 2019.</p>

Las capacitaciones con las Escuelas de Campo nos permiten llegar a más productores y fortalecer sus capacidades, son capacitaciones extensas y con la metodología aprender haciendo, en donde el alumno implementa en campo lo que hace en el aula de clases. En este trimestre se desarrolló un módulo con cada una de las escuelas locales en donde el tema principal fue administración de fincas cafetaleras.



Producto 2: Programa de certificación de fincas con fines de conservación y aprovechamiento (ICF, Rainforest Alliance, IHCAFE, etc.) en las áreas seleccionadas, específicamente con certificaciones vigentes en Honduras.


Avance del trimestre: La certificación de maderables en la zona de influencia del proyecto se está trabajando en coordinación con el ICF, en donde el técnico de IHCAFE sube a la plataforma SNIF los documentos que avalan el certificado de plantación, para los beneficiarios del proyecto aún no hemos tenido respuesta del ICF en esta actividad, pero el trabajo de campo ya está hecho con una buena cantidad de productores.



Fuente. Datos de campo recolectados por IHCAFE

En el marco del proyecto CONECTA+ se han identificado un total de 40 fincas con potencial para entrar en procesos de certificación forestal, por lo que se procedió a realizar el inventario de campo de las fincas, su georeferenciación en su totalidad, el conteo de árboles maderables por especie dentro de la finca y la conformación del expediente para ingresar a procesos de certificación forestal.

En cuanto a fincas certificadas con procesos de calidad de café, ya se inició con la selección de productores para trabajar procesos diferenciados, este es un proceso lento ya que lleva su tiempo conseguir esos mercados diferenciados, pero con la constancia del productor se logra.



Fuente.

Datos de campo levantados por IHCAFE

Actualmente se está trabajando y dando seguimiento a 20 productores con potencial para certificarse y diferenciarse por la calidad del grano que producen; de estos un 20% son mujeres y un 80% son hombres trabajando en procesos de

diferenciación de la calidad. En su totalidad los productores poseen fincas pequeñas de 6 manzanas como media. Un 40% de los productores se encuentran trabajando su café con el método tradicional de preparación que es el lavado, un 31% está trabajando café Honey y un 29% le apunta por cafés melados. Todos los productores reciben asistencia técnica del IHCAFE para trabajar sus procesos de diferenciación del café.

En cuanto al uso de variedades en estos procesos de diferenciación, un 55% de los productores se encuentra trabajando una variedad tradicional como es el café lempira, un porcentaje del 27% se encuentra trabajando IHCAFE90 que es una de las variedades promovidas en el marco del proyecto CONECTA+ por sus cualidades de resistencia al ataque de plagas y enfermedades como la roya del café. La tercera variedad de más uso es CATUAI con un 18% de uso, esta variedad es conocida en el mundo del café por mantener una buena calidad de tasa; finalmente Parainema, IHCATU y una mezcla de variedades es el porcentaje restante de los productores que trabajan en procesos de diferenciación y certificación de su café.

Producto 3: 3.000 acuerdos firmados de conservación y buenas prácticas sociales con los productores de café, cacao y productos agroforestales, para adoptar HMP para la conservación y manejo sostenible de bosque.

Avance del trimestre:

se realizaron diferentes jornadas de capacitación durante este trimestre, las cuales estuvieron centradas en procesos de construcción de semilleros, en este sentido, se entregaron los insumos (semilla de café, bolsa y prevalor) a los productores seleccionados para este año; asimismo, los técnicos de las agencias de influencia del proyecto dieron las jornadas de capacitación en las zonas, usando la temática de días demostrativos.

También durante el trimestre se llevó a cabo el cuarto módulo de las Escuelas de Campo Agroforestal local, (son 5 escuelas en las cuales tenemos 143 alumnos con representación de más de 80 comunidades). El tema central abordado en este proceso de capacitación fue la administración de fincas cafetaleras agroforestales y con HMP, a fin de preparar a los productores para la toma de datos relacionadas a los procesos de producción y productividad y valor agregado en sus fincas; con esto se logrará cuantificar en gran medida los ingresos netos diferenciados producto de la implementación de HMP en las fincas.


Los alumnos de ambos técnicos Universitarios, ya iniciaron las clases de su primer periodo académico 2020. Los alumnos del Técnico Superior en Caficultura Sostenible iniciaron clases el 27 de enero y los del Técnico Universitario en Gerencia de Negocios y Empresas Agro cafetaleras el 17 de febrero. La Semana del 23 de marzo se llevó a cabo la segunda visita del técnico universitario en Gerencia de negocios y empresas agro cafetaleras, sin embargo, debido a la emergencia mundial por COVID-19, las clases de esta visita se dieron de forma virtual, en donde los alumnos avanzaron con sus clases y no hubo necesidad de retrasar su periodo académico.

Se inició además la consultoría para diseñar el documento que firmarán todos los productores beneficiarios del proyecto; para esto se desarrolló una jornada de trabajo con diferentes socios involucrados en este resultado: IHCAFE, FUNDER, HEIFER, OCP-OPEV Y PNUD., en esta ocasión se discutió y se llegó a diversos acuerdos en los que todos los presentes aportaron y acordaron el contenido del mismo.

Producto 4: Al menos 10 viveros comunitarios, familiares y públicos (instituciones estatales como ICF) que proveen más de 100.000 plántulas anuales para ser utilizadas con las herramientas de manejo del paisaje y para las prácticas de rehabilitación, incluyendo el manejo de la leña y para la restauración de ecosistemas para recarga hídrica.

Avance del trimestre:

Este año se trabajarán 5 viveros permanentes en coordinación con algunas cooperativas de la zona de influencia del proyecto, en donde se cultivarán especies maderables de importancia económica de interés para el productor, así como también especies de rápido crecimiento para establecer la sombra en fincas cafetaleras.

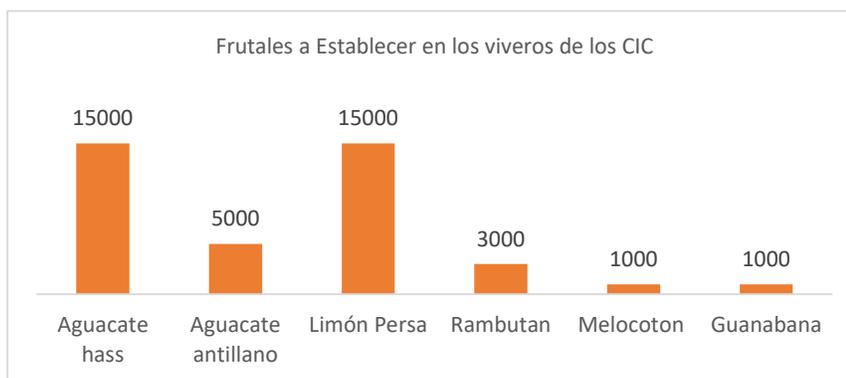


Los frutales se seguirán produciendo en los centros de investigación del IHCAFE, en este sentido, este trimestre contamos con la visita al centro de investigación y Capacitación José Ángel Saavedra de Corquin Copan del Ministro de la OPEV

Ingeniero José Antonio Galdámes, quien quedo muy satisfecho con los resultados que está dejando el proyecto con la coordinación de IHCAFE. En total se encuentran en proceso de germinación la semilla para la producción de 40 mil plantas frutales este año, entre los frutales que se estarán trabajando se encuentran: 2 variedades de aguacate (hass y antillano), cítricos (limón persa), melocotón y rambután.

Adicionalmente al trabajo de establecer nuevos viveros agroforestales, todavía se cuenta con inventario de aproximadamente 36 mil plantas frutales del año pasado que no se entregaron a los beneficiarios debido a que no se encontraban listas para ir a campo; se espera en junio comenzar con el proceso de distribución de las plantas a los productores beneficiarios. Las 4 mil plantas frutales que no están en los centros, ya fueron llevadas a campo, principalmente a los productores beneficiarios que se encuentran en la zona de Comayagua (Taulabe, Siguatepeque y Meambar) y a los productores que se encuentran en la zona de Intibucá (Jesus de Otoro, Masaguara, San Isidro, La Esperanza y San Francisco de Opalaca).


Viveros comunitarios forestales establecidos a la fecha por técnico

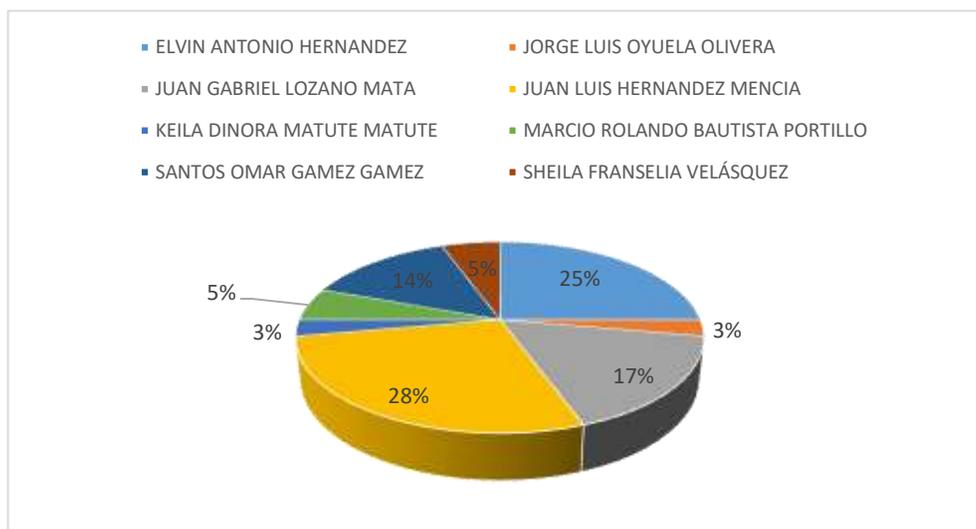

Fuente. Datos tomados en campo por IHCAFE

A la fecha se está trabajando en la producción de 1,546,000 plantas maderables en viveros, para esto se está estableciendo una estrategia de abordaje y seguimiento con los alumnos del técnico universitario. En este trimestre los alumnos del técnico universitario en Caficultura Sostenible llevan la clase de viveros, por lo que como práctica y acumulativo de dicha clase harán un pequeño vivero en sus comunidades, en coordinación con alguna cooperativa u organización presente en la zona. Esto con el objetivo de implementar los conocimientos adquiridos y también proporcionar plantas a aquellos productores que necesiten pequeñas cantidades.

A continuación, se presenta el mapa de ubicación de los viveros que hemos establecido con el proyecto, cabe destacar que los puntos que están fuera del corredor son viveros con cooperativas que tienen beneficiarios dentro del corredor, pero por temas de espacios están ubicados en estas zonas.

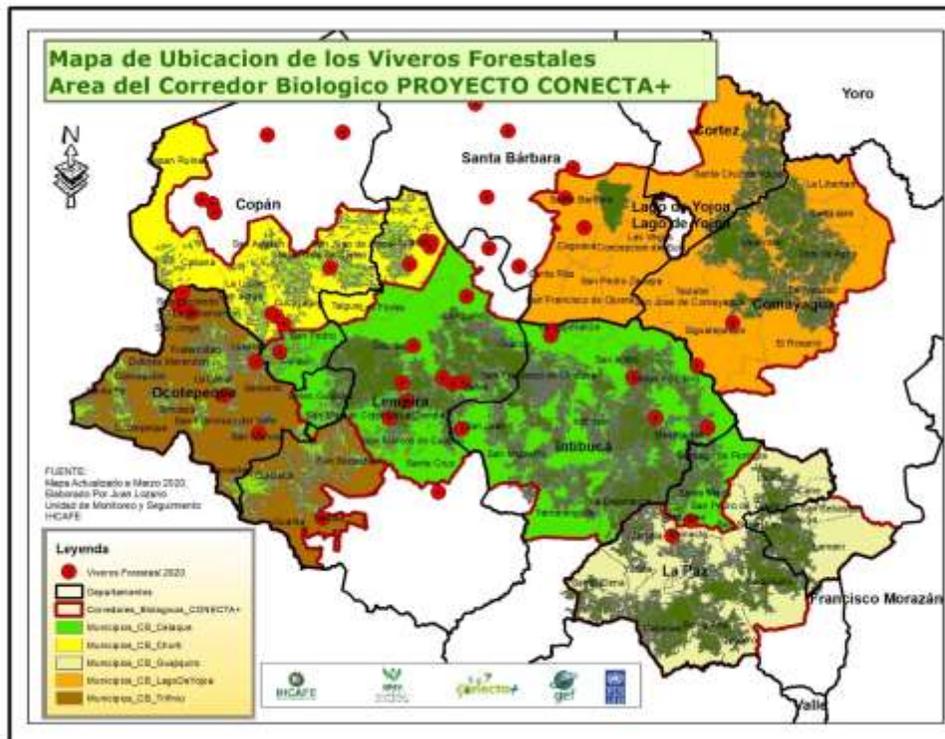

En cuanto a los viveros de café serán hechos por cada uno de los productores en sus zonas, ya que es mucho más fácil que cada uno de ellos produzca su vivero, con esto se evita el maltrato de las plantas por el traslado. Asimismo, ya se encuentra distribuida la semilla y el prevalor, por lo que a pesar de la crisis en el sector café, la mayoría de los productores ha comenzado a establecer los semilleros.

Producto 5: Programa de captura de carbono para la venta de créditos en mercados nacionales.

Avance del trimestre:

No se ha comenzado a trabajar directamente en este Producto, sin embargo, el HCAFE ya ha iniciado la toma de datos con una red de parcelas instaladas a nivel nacional. Se han comenzado a realizar reuniones en conjunto OCP-OPEV/IHCAFÉ) con el objetivo de definir el apoyo que se requerirá por parte de la OPEV para poder desarrollar dichos programas de compensación y todo lo referente a este resultado.

Producto 6: 2.500 familias con estufas ecológicas para reducir la demanda de leña y el riesgo de enfermedades respiratorias agudas.

Avance del trimestre:

Se inició la elaboración de los TdR's para la contratación de la empresa encargada de la Construcción, instalación y capacitación en el buen uso y manejo de 1,250 estufas ecológicas en el marco de implementación de la Estrategia Nacional de Estufas Mejoradas, borrador enviado al PNUD para recibir sus comentarios y proceder con el proceso respectivo.

Producto 7: Programa de prevención y control de incendios en las áreas del proyecto (bosques nacionales, comunitarios, municipales) con participación comunitaria.

Avance del trimestre:

Durante el trimestre se trabajó en “El Plan estratégico sobre Prevención y Combate de los Incendios Forestales en la zona de occidente Honduras”, documento en respuesta a las necesidades planteadas por representantes de usuarios específicos del fuego como herramienta productiva, organizaciones directamente beneficiadas por el usufructo del bosque, instituciones responsables de la prevención y combate de incendios forestales, propietarios de bosque privado, gobiernos locales, cooperativas agroforestales, consejos consultivos forestales y encargados del seguimiento del delito de incendios forestales. Para la elaboración se hizo revisión de documentos tales como: Estrategia de Incendios Forestales de Chile, Estrategia de Incendios Forestales de México, Guía Práctica para comunicadores en el tema de


Incendios Forestales de México, Estrategia de Incendios Forestales de Chile, Ley Forestal de Honduras, Plan de Protección contra incendios forestales de Honduras, Plan de Protección y Restauración Forestal 2019 del Parque Nacional Montaña de Celaque y su área de influencia, Estrategia del Manejo de Fuego de la CCAD entre otros documentos. Se cuenta con el Diseño preliminar de Estructura del Plan estratégico de Incendios Forestales (se puede ver en anexos).

Asimismo, se está elaborando un folleto para enseñanza a nivel básico sobre educación ambiental e incendios forestales y su prevención, el cual se pretende distribuir en las diferentes escuelas y organizaciones de la zona de influencia del proyecto, concientizando a las nuevas generaciones sobre la temática planteada y así logrando una conservación adecuada de los recursos naturales. En los anexos se describe la propuesta de estructura del folleto.


se inició el desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de impacto de incendios Forestales, del cual ya se tiene una versión preliminar, el mismo se está desarrollando con las tecnologías de la BigData de Google Earth Engine.

Para el análisis de impacto, la herramienta permite realizar un diagnóstico Pre-incendio y Post-incendio. Las variables que se estiman para dicho análisis son:

- El análisis de severidad de incendios a través del índice NBR (Normalized Burn Ratio)
- El Índice de vegetación de diferencia normalizada, también conocido como NDVI
- Evaluación del Monóxido de Carbono en tiempo real (Sentinel-5P NRTI CO)
- Análisis radar de apertura sintética (SAR) de banda C de doble polarización.
- Índice eficiente de detección de incendios forestales (FDI)

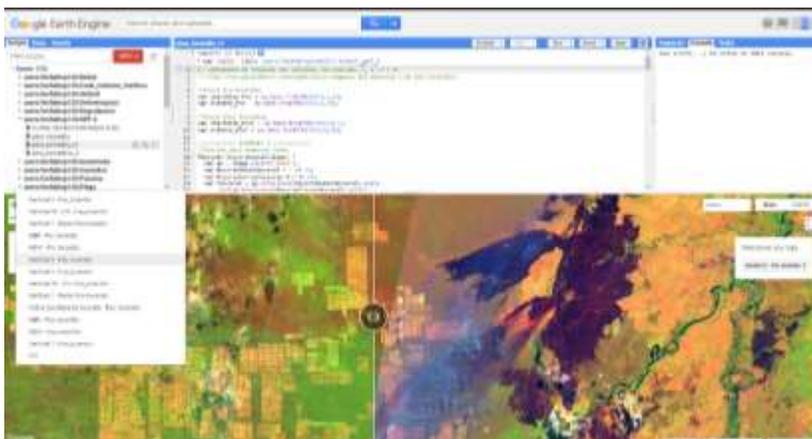

Respecto al desarrollo de un sistema de alerta temprana, la herramienta a través del uso de imágenes satelitales Sentinel, se estima a través del Índice eficiente de detección de incendios forestales (FDI), el cual nos permite observar en que sitios existe alguna anomalía térmica basado en el uso de bandas de infrarrojo cercano. El índice se basa en métodos para clasificar la vegetación y se ha adaptado para detectar áreas quemadas y luego transformar esto un punto de alerta. En la siguiente imagen se pueden observar las alertas para el periodo del 25-30 de marzo, donde los puntos color rojo indican quemaduras en áreas boscosas y los puntos azules en áreas fuera de bosque.

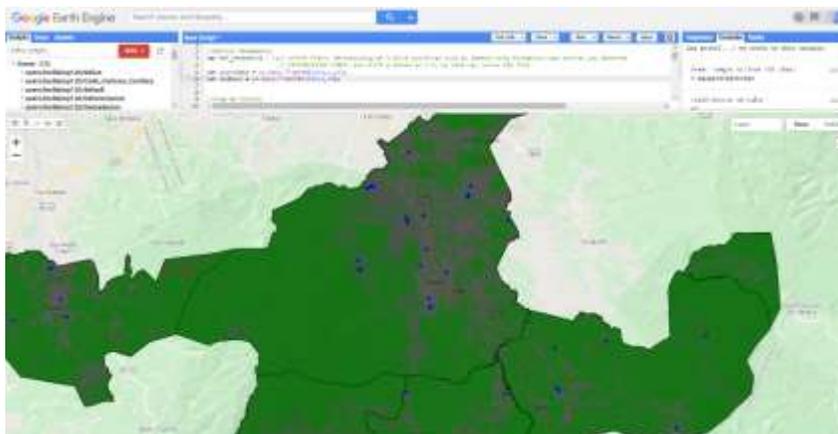

Producto 8: Al menos 30 microcuencas declaradas como zonas abastecedoras de agua por el ICF y según la Ley Forestal.

Avance del trimestre:

Se inició el proceso de obtención de información general de algunas microcuencas que se ha identificado, no obstante, estos estudios preliminares no aseguran el proceso de declaratoria ya que podrían surgir algunas circunstancias que limiten el desarrollo del proceso y que serán verificadas al momento de realizar las diferentes actividades de campo. Se obtuvieron los datos de las siguientes microcuencas:

1. Microcuenca Guerguerence
2. Microcuenca Plan de Leones
3. Microcuenca El Guamal
4. Microcuenca Juniapa
5. Microcuenca El Jute
6. Microcuenca El Cutal

Base de datos de microcuencas identificadas en el área de influencia de CONECTA+:

N°	Municipio	Área Protegida	Microcuenca	Cobertura	Coord. Central	
					X	Y
1	Gracias	Celaque	La Guaca	Conifera y Mixto	321088	1612195
2	Flores - Gracias	Celaque	La Camotera	Mixto y Cafetales	314700	1616007
3	San Manuel de Colohete	Celaque	El Cipresal	Conifera y Mixto	320330	1603170
4	Gracias - Corquin	Celaque	La Calera	Conifera y Mixto	309744	1610015
5	San Manuel de Colohete	Celaque	Quebrada Honda	Conifera y Mixto	321230	1604053
6	Gracias	Puca	Peña Blanca	Latifoliado	336251	1629752
7	Gracias	Puca	Juniapa	Latifoliado	336828	1628650
8	Gracias -La Iguala	Puca	Plan de Leones	Latifoliado	333563	1630099
9	Cololaca - San Sebastian	Pacayita	El Botoncillo	Conifera	306015	1589265
10	Gracias	Celaque	Cerro el Zacatal	Conifera y Latifoliado	317365	1607077
11	Gracias - Belén Gualcho	Celaque	Yaguishal	Mixto y Latifoliado	315833	1607964
12	Cololaca	Pacayita	Plan del Ojo de Agua	Conifera y pastos	304685	1589848
13	Lepaera	Puca	Guerguerense	Latifoliado	329692	1629197
14	La Iguala	Fuera de AP	Suptillo I y II	Conifera	341897	1614717
15	La Iguala	Fuera de AP	El Guamal	Mixto	340661	1625892
16	Gracias		El Suptal			
17	San Isidro	Fuera de AP	Las trancas	Conifera	377471	1610149
18	Intibuca	Mixcure	Montaña verde	Conifera	375228	1606767
19	Intibuca	Mixcure	Peña Blanca	Conifera	375815	1607304
20	Intibuca	Mixcure	Cerro Colorado	Conifera	375815	1604854
21	San Sebastian	Pacayita	El cutal	Conifera	306473.51	1589723.4
22	San Sebastian	Pacayita	El Jute	Conifera	306671.19	1592664.9
23	Belen Gualcho	Celaque	Cerro Verde	Conifera	307622.07	1607372.7
24	Belen Gualcho	Celaque	El Capucal	Conifera	309327.23	1606074.9
25	Santa Cruz de Yojoa	PANACAM	Santa Elena	Conifera y Latifoliado	403564.08	1643439.2
26	Santa Cruz de Yojoa	PANACAM	Santa Cruz	Conifera y Latifoliado	403817.58	1644534.1
27	Taulabe	PANACAM	Cerro Azul y Varsovia	Conifera y Latifoliado	400673.93	1635946.7
28	Santa Cruz de Yojoa	PANACAM	Piedras Amarillas	Latifoliado	404540.9	1645396.5
29	Meambar	PANACAM	Los Cedros	Conifera y Latifoliado	408562.96	1638682.2
30	Siguatepeque	Montecillos	Potrerillos	Conifera	403836.62	1607139.7
31	Siguatepeque	Montecillos	Las Canoas	Conifera	403757.18	1608314.8
32	Siguatepeque	Montecillos	El Cedral	Conifera	400472.31	1608345.2
33	Siguatepeque	Montecillos	El achote	Conifera	404985.22	1603858.4



Resultado 3: Establecimiento de iniciativas de cadenas productivas para aumentar los ingresos de agricultores derivados de sistemas de café y cacao agroforestales sostenibles y los servicios ecosistémicos.


Producto 1: Programa de capacitación y asistencia técnica para 4,000 pequeños y medianos productores vinculado con escuelas de campo implementando mejores prácticas sostenibles, acceso a material genético certificado, planes de finca bajo sistemas agroforestales, certificaciones ambientales que impacten en la productividad y buenas prácticas que favorezcan la biodiversidad y la conectividad de las AP.

Avance del trimestre:

a través de la intervención del IHCAFE la selección del segundo grupo de productores beneficiarios del proyecto ya fue definido, como una manera de potenciar el liderazgo en los jóvenes estudiantes apoyados a través del proyecto, se les asignó la selección de 10 productores de sus comunidades, mismos a los que ellos deberán atender con mayor frecuencia, contando siempre con el apoyo del técnico extensionista.

El plan de capacitación impartido por los técnicos está enfocado a fortalecer los conocimientos que ya tienen los productores, centrándonos en mejores técnicas de cultivo para favorecer la productividad y crear armonía entre el sistema productivo con el entorno. Los alumnos de los técnicos universitarios se capacitan para ser parte de todos estos procesos de extensión y ser entes de cambio en sus comunidades, además de fortalecer sus organizaciones con nuevos conocimientos que vengán a contribuir al mejoramiento del modo de vida de todos los productores. En este trimestre el enfoque de las capacitaciones ha sido viveros y semilleros de café ya que en la mayor parte de las zonas cafetaleras, ya pasó la cosecha, y de acuerdo a la fenología del cultivo, esta es la actividad que corresponde a este periodo de tiempo. en conclusión, han sido jornadas de capacitación, en su mayoría talleres y días demostrativos. A continuación, se muestran algunos gráficos sobre la distribución de los eventos de capacitación en las zonas de influencia del proyecto, y su distribución por género.

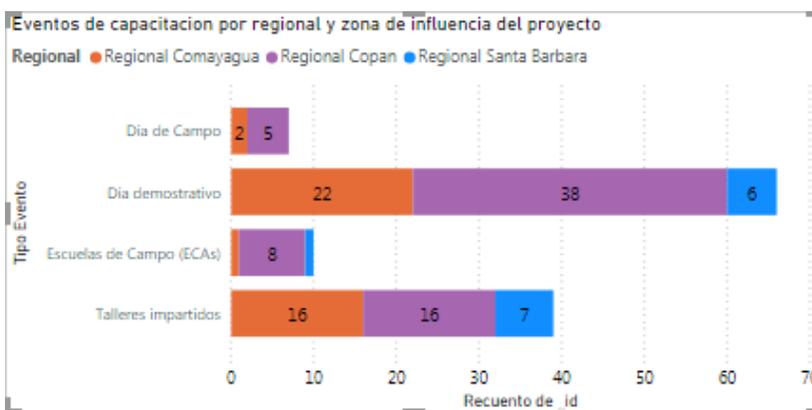

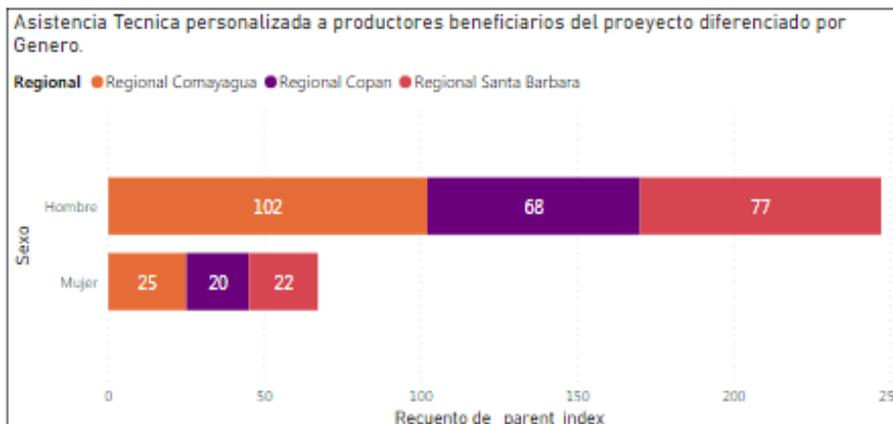

Fuente. Datos tomados en campo por IHCAFE

En cuanto a la diversificación productiva y al trabajo de mejoramiento de las HMP en caficultura para la generación de ingresos, se trabajó en una propuesta que consta de 4 modelos de diversificación productiva a implementar en los corredores biológicos, esta estrategia podría estar implementándose a partir de agosto 2020 en caso que sea aprobado por Junta de Proyecto, en caso contrario a partir del 2021 como está planificado en el proyecto (ver anexos).

Por otro lado en cuanto a la **cadena de valor del cacao, con el apoyo de FUNDER**, durante este primer trimestre han sido identificados 37 Productores/as mas (11 mujeres y 26 hombres) adscritos a la Asociación de Productores Agroindustriales de San Antonio de Cortés (APAGRISAC), que serán incorporados a las acciones de Asistencia Técnica del Proyecto. Adicionalmente se han iniciado acercamientos con la Asociación de Mujeres Chocolateras de San Antonio de Cortés (AMUCHOSAC), con la finalidad de apoyarles en todos sus procesos, ésta organización está conformada por 16 mujeres y 5 hombres que se dedican a agregarle valor al cacao. Estamos procesando la información de 36 socios/as de CAFEL cultivadores de cacao que también serán incorporados a las acciones del Proyecto.

El paquete de Asistencia Técnica diseñado a inicios del año anterior, está siendo revisado y ajustado, en vista de que las Escuelas de Campo (ECA's) requieren profundizar en su estrategia de transferencia desde una perspectiva enfocada en la producción orgánica de cacao y en Sistemas Agroforestales enriquecidos con otras especies generadoras de ingresos. La asistencia técnica que se provee a los productores requiere de modificaciones e incorporaciones en temas de actualidad y relacionadas a las etapas fenológicas del cultivo y del sistema agroforestal. Se han identificado algunos temas que deben ser agregados en el Manual de ECA's, como la asistencia en la producción de abonos orgánicos, labores de cosecha y selección de bellotas, diversificación de los Sistemas Productivos, manejo de registros de ingresos y egresos, entre otros. Se están desarrollando acciones de motivación a los/las Productores/as por la vía de las capacitaciones y diálogo con el mercado para que los asociados a las diferentes Organizaciones comprendan que los precios de sus productos dependerán en gran medida del avance en la certificación orgánica. Junto a Los/las Facilitadores/as de ECA's estamos realizando jornadas para motivar a las familias a iniciar estos procesos, tomando en cuenta que a partir del año 2020 han entrado en vigencia las normas aprobadas por la Unión Europea (UE), especialmente por el tema de precios y acceso a mercado. Las Empresas Certificadoras que operan en el país y en particular las que están relacionadas al cacao, han solicitado generar la ubicación georeferenciada de los productores certificados orgánicos y los que se encuentran en proceso. Al respecto, hemos concertado una alianza con el Programa PROCACAO para complementar este esfuerzo. La Empresa Chocolats Halba se ha sumado a esta iniciativa y las Empresas de Productores están conscientes de colaborar para lograr el objetivo de este trabajo. A partir de las relaciones establecidas con el IHCAFE, se llevó a cabo la II jornada de capacitación sobre los requerimientos para conformar los expedientes, con la finalidad de gestionar la certificación de maderables en fincas cafetaleras y cacaoteras ante el ICF, los participantes proceden de las 3 organizaciones: CRASVIDMIL, APAGRISAC y AMUCALAY que se encargarán de levantar la información de campo. En el contexto del Proyecto, estamos incorporando la conformación de expedientes para la certificación de maderables como incentivo a los productores que además firmen e implementen el contenido del Acuerdo Voluntario para la implementación de buenas prácticas ambientales y sociales.

Durante el período se abordaron 6 temas de asistencia en: i) Preparación de sustratos, ii) Construcción de viveros, iii) Selección de bellotas, iv) Construcción de germinadores de semillas, v) Cuidado de camas en lombricompostaje y vi) Proceso de pre-germinación de semillas de cacao y otras del SAF. Con los convenios y alianzas locales, se han desarrollado

actividades de instalación de viveros, orientados a la reproducción de especies maderables y frutales por semilla. En el caso de la UCENM se logró establecer un semillero con especies como Laurel, Caoba, Guayaba, Carreto y Cacao pre-germinado y que posteriormente será injertado con materiales genéticos adaptables a la zona, con el propósito de establecer al menos dos parcelas demostrativas que servirán de espacio didáctico para los estudiantes de las carreras afines en la UCENM. En las instalaciones del CEA (Centro Educacional Adventista), ubicado en la comunidad de Peña Blanca se construyó un nuevo vivero, área que será utilizada para maderables y frutales incluyendo cacao, ya que también existe la propuesta de establecer un lote de cultivo, que será manejado directamente por este Centro educativo. Un tercer vivero comunal se ha terminado de construir en la comunidad de casas viejas, enmarcado en el convenio firmado con la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, también con la finalidad de producción de plantas maderables y frutales que renueven condiciones ambientales, reforesten aéreas degradadas, protejan suelos y canales hídricos, con la participación comunitaria. En la consecución de brindar servicios técnicos especializados a los actores involucrados en la producción y valor agregado de cacao, se llevaron a cabo 2 jornadas de capacitación práctica en la región de Santa Rita, Copán, con jóvenes, productores y directivos de la Cooperativa CAFEL, sobre elaboración de abonos orgánicos sólidos, Microorganismos de Montaña (MM) sólidos y líquidos, tomando en cuenta la orientación a la producción orgánica de los socios de la Cooperativa y a las exigencias del mercado respecto a la supresión en el uso de productos químicos en la producción de cacao en SAF. Se ha proseguido con el levantamiento de muestras para análisis de suelos en parcelas de cacao para contribuir con la elaboración de productos que fortalezcan la certificación orgánica, durante el período se enviaron 17 muestras al laboratorio de IHCAFE, (15 H y 2 M). Fortalecidas las capacidades en el componente ambiental nutricional, como resultado de la alianza entre el proyecto FUNDER – CONECTA+ en la cadena de cacao y el Laboratorio de suelos del IHCAFE, se capacitó al personal técnico de las asociaciones de productores locales en los procesos de interpretación de los análisis de suelos. Este evento es una primera fase respecto al diseño de una formulación orgánica para abonar las parcelas de cacao con productos naturales elaborados por los propios productores en sus Escuelas de Campo ECA's, respaldado con los resultados de los análisis de laboratorio de los abonos líquidos como Bioles y MM líquido energizado, y abonos sólidos fortificados con el lirio acuático, también evaluado y que representaría un aporte de sustentos esenciales en la nutrición del cacao. En seguimiento al proyecto de investigación de Lombricultura, se le ha dispensado el tiempo y esfuerzo para que las condiciones de compostaje y reproducción sean las ideales, adicionalmente a las 50 libras de lirio acuático picado se agregan 15 libras de estiércol ovino que previamente degradado por un período de 30 días se agregan al espacio de la lombriz para que se lleve a cabo el proceso de compostaje. Hemos continuado con el procedimiento de fermentación de cacao en estructura vertical y giratoria, el principio del manejo de temperaturas constituye un factor clave para obtener un buen producto. En el tercer proceso recién finalizado se obtuvo cacao con altos índices organolépticos de sabor y aroma, se tomaron muestras que se enviaron al laboratorio de FENAPROCACHO para su análisis, cuyos resultados muestran un mal proceso de secado ya que refleja inicios olores adquiridos en esa etapa. Todavía no se tienen resultados concretos del uso de agua energizada en parcelas de cacao establecidas pues falta medir incremento de la productividad, aumento del área productiva de la planta, impacto en el control de enfermedades, etc., y para su efectiva medición se requiere al menos un tratamiento por un período de 6 meses.

Producto 2: Familias productoras que participan en al menos una de las 2 cadenas productivas fortalecen sus capacidades en temas organizativos y de desarrollo empresarial para fomenten la asociatividad y cooperativismo bajo un enfoque de encadenamientos aplicado a la sostenibilidad ambiental y articulado al mercado.

Avance del trimestre:

En la continuidad de las relaciones establecidas con CAFEL, se realizaron dos jornadas de capacitación orientada a los miembros de la Junta Directiva, la primera enfocada al tema financiero para fortalecer a PROGRESA (Facilitadora de financiamiento a sus asociados) y la segunda, sobre el establecimiento de un banco de yemas con policlones adaptados a la región y que servirán en el futuro cercano para producir plantas injertas.

asimismo, se participó en la primera reunión del año 2020 del Comité Regional Nor-Occidental de la Cadena de Cacao, en la que se abordaron temas relacionados a los resultados y avances del año anterior y se procedió al levantamiento de la información de cada Asociación representada con el fin de estructurar el plan de trabajo del presente año.

La Fundación ETEA está desarrollando un proyecto enfocado a fortalecer el emprendedurismo con Jóvenes vinculados a CAFEL, en la II jornada de capacitación sobre elaboración de abonos orgánicos se expuso sobre la importancia de un abordaje compartido y complementario mediante la firma de un convenio para potenciar a la organización juvenil denominada *"Jóvenes en Acción Contra el Cambio Climático"* (JACCC), que permitirá involucrarlos en actividades empresariales de producción de abonos, involucrarse en las Escuelas de Campo, valor agregado al cacao y al café, entre otros.

Se participó en la reunión de la Comisión del SINATEC para presentar la propuesta de implementación del diplomado de catación de cacao, no se logró llegar a un acuerdo pero se mantiene el esquema inicial de formulación de la currícula.

Durante el periodo se identificaron 6 empresas: 2 del departamento Copan, 2 de Santa Bárbara y 2 del departamento de Lempira, generando un acumulado de 36 empresas atendidas.

Ingresada Información de las empresas al programa CROP, proceso de avance de las 36 empresas y 1,504 beneficiarios de los cuales el 25% son mujeres. Ingresando cuatro empresas nuevas con 284 nuevos productores. Se realizó capacitación sobre finalidad de las cajas rurales, con 25 participantes de las siguientes organizaciones: Jóvenes Luchando contra el Cambio Climático en la comunidad de las Malvinas, Santa Rita de Copan y la ESM Mucho Café del Rosario Santa Rita de Copan (12 hombres y 13 mujeres).

Se realizó aplicación de diagnóstico empresarial en las siguientes organizaciones:

- CRAC JACC, Santa Rita de Copan
- CRAC Nueva Esperanza(Etnia Chorti), San Antonio Miramar, Cabañas Copan
- CRAC Nuevo Amanecer (Etnia Chorti), Santa Rita de Copan
- ESM Mucho Café, Santa Rita de Copan.
- Cooperativa Agrícola de Productores de Copan Ruinas Ltda.
- Asociación de productores Nueva Visión (etnia lenca), de San Manuel de Colohete, Lempira.
- Asociación de Productores Mancafe (Etnia Lenca), Mapulaquita, San Manuel Colohete, Lempira.

Se han visitado por parte de asesores empresariales 2 nuevas organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos para ser intervenidas por el Proyecto;

- Asociación de productores de café MANCAFE, ubicada en la comunidad de Mapulaquita, municipio de San Manuel de Colohete, Lempira.
- Asociación de productores Nueva Visión, ubicada en el barrio San Manuel Centro, municipio de San Manuel de Colohete.

Se distribuyeron un total de 12 secadoras solares de 14 programadas en el departamento de Copan; con organizaciones intervenidas por el proyecto:

- CRAC Mucho Café, EACP Vecinos del Trigo, la Union Copan.
- Cooperativa Mixta San Agustin Ltda.
- CRAC Buenos Aires, en San Agustin Copan.
- CRAC Plan Grande en Concepcion Copan.
- CRAC Nuevo Futuro en Candelaria Concepción Copan.
- CRAC Amigos del Ambiente.
- ESM Mucho Cafe en Santa Rita Copan.

Se han establecido nuevas alianzas con Swisscontact e INFOP, con la finalidad de diseñar una currícula orientada a la implementación de un diplomado en Catación de Cacao para identificar las características organolépticas de las muestras que se analicen. Dependiendo de los resultados, en convenio con la UCENM se podrá establecer la escuela de formación en esta disciplina para analizar muestras de microlotes que podrán ser destinados a diferentes mercados. Es importante reconocer el apoyo de la empresa certificadora **Rainforest Alliance** que se suma a esta iniciativa.

En las instalaciones de la Universidad Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), se realizó la reunión de representantes de diversas instituciones, organizaciones y empresas cuya finalidad era establecer los lineamientos teóricos y técnicos para elaborar la currícula del diplomado en Catación de cacao y la metodología curricular para concretizar el funcionamiento de la Escuela de Catación. Participaron: Swisscontact, INFOP, UCENM, ASEPRA, PROGRESSA, Municipalidad de Santa Cruz y FUNDER – CONECTA+.

Desarrollada la jornada de revisión y ajustes al Acuerdo de Desempeño Ambiental que a partir de ahora se conocerá por: **ACUERDO VOLUNTARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS CORREDORES BIOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO CONECTA+/ OPEV**. A la jornada celebrada en la ciudad de Comayagua, participamos personal de OCP, PNUD, IHCAFE, HEIFER Y FUNDER.

Se desarrolló primera reunión de actores de Instituciones públicas y privadas, proyectos, municipalidades, academia, etc. presentes en la región del lago, con la finalidad de conocer los planes de manejo de AMUPROLAGO y Aldea Global, y una exposición sobre el trabajo que desempeña HONDULAGO como actor legal y autoridad en la región del Lago de Yojoa, el principal acuerdo logrado fue designar una comisión para elaborar un plan de trabajo donde se involucren todos los demás actores, como una plataforma o mesa de protección ambiental.

Seguimiento al convenio con la UNITEC para el apoyo del consultorio jurídico gratuito, convenio en proceso de revisión y presentación de plan de trabajo. Primeras visitas en la zona fortaleciendo acciones de formación, orientación, recepción de documentos, subsanaciones, entre otros. Nueve empresas involucradas en procesos legales. Alianzas con instituciones de apoyo Como Ayuda en Acción, PROMUCLIMA, MAPANCE, Eurosan, OCDIH, Coordinación de acciones en conjunto en: Reuniones de la cadena, Capacitaciones, MAPANCE prestara el laboratorio para realizar la catación de al menos 100 muestras del departamento de Lempira entre estos 200 productores beneficiarios del proyecto CONECTA+.

Seguimiento Alianza para usar laboratorio de Catación con Montaña Verde, Fundación Jicatuyo, COCABEL, ASOPROSAM. Seguimiento de acciones de recepción de muestras, perfilación, 32 empresas involucradas. Seguimientos acciones de estrategia comercial a través de alianzas y vinculaciones con compradores y sus fundaciones, entre estas CoHonducafé, OLAM, Beneficio Santa Rosa, Montaña Verde, Beneficio San Vicente, CONEXION, Estucafé, Aroma y Cultura, COMSA, Cafex, BICAFE, Molinos de Honduras, Mercom. Coordinación de acciones con IHCAFE para la participación en foro de Tostadores y Productores a desarrollarse en Marzo, 2020; recopilando muestras de café para la comercialización de lotes comerciales, micro lotes y nano lotes; presentando 42 muestras. Capacitación sobre fortalecimiento de marca e imagen empresarial donde participaron un total 12 personas de 8 empresas beneficiarias del departamento de Lempira (4 mujeres y 8 hombres), acciones vinculadas a través del CDE-Occidente.

Las Organizaciones CRASVIDMIL y APAGRISAC, durante los primeros días del mes de marzo suscribieron los contratos de compra-venta, así como existen las constancias extendidas por CHH indica que ya existe un acuerdo de precios y volúmenes. Seguimiento convenio con Fundación Co Honducafe, establecido plan de trabajo y acciones de trabajo a través de tres proyectos que involucra participación de jóvenes en procesos de formación de calidad, proyectos de secadoras, asistencia técnica. En Copan, seguimiento e identificación, reuniones, revisión de muestras, negociación y formalización con comparadores como ser: HQC, CONNECTION, BECAMO, BENEFICIO SANTA ROSA, CAFEX, BICAFE, CONDUCAFE, OLAM. Reuniones de acercamiento, reuniones de seguimiento para establecer acuerdo, pendiente reuniones revisión de convenios. En proceso cartas de intención de compra, comprometido 20,000 quintales, 5000 quintales beneficio Santa Rosa, 10,000 quintales molinos de Honduras, 5000 quintales con OLAM. En Santa Bárbara, seguimiento para organizar subasta electrónica dirigida por ADECASBA. En Lempira, reunión con CoHonducafé, COMSA, OLAM, CAFEX, Molinos de Honduras, Beneficio Santa Rosa, BICAFE, Conexión, MERCON, CAFEL, se realizó comercialización de 1,000 qq con diferenciales de L. 400.00 por quintal sobre el precio de plaza (L. 1,700.00). Pago de 40 productores, de los cuales participaron 6 mujeres, 34 hombres; en evento Producer & Roaster del Proyecto CONECTA+ de los departamentos de Lempira, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque. Se han realizado cataciones en enero y febrero 2020 con la exportadora MERCOM donde se han comercializado alrededor de 1000 quintales de café de las diferentes empresas atendidas por el proyecto CONECTA+. Se recolectaron un total de 22 muestras de productores en el departamento de Lempira para participar en el Producer and Roaster Forum y fueron entregadas al laboratorio de IHCAFE en Corquin Copan, dicho evento fue cancelado en por la pandemia del COVID-19 y se procedió a retirar las muestras. Todas las muestras están siendo catadas por CONEXION COFFEE para búsqueda de mercados.

Posterior a la visita realizada por los Procuradores de UNITEC, se acordó que AMUCALAY, Caja Rural ELOHIM y Caja Rural Mujeres Prósperas, que son las que actualmente requieren asistencia legal, realizaran reuniones para complementar la documentación solicitada y enviarla a través nuestro, toda la documentación fue entregada a la Directora del Bufete Jurídico Gratuito de UNITEC y daremos seguimiento a los procesos que se vayan dispensando. Desarrollada la reunión con personal de REDMUCH para coordinar actividades con socias de AMUCHOSAC que requieren asistencia en aspectos legales y empresariales. Seguimiento al Actividades a través de la intervención del consultorio jurídico de Unitec acciones formativas, correctivas, recepción de documentos, subsanaciones para legalizar 15 empresas y 5 empresas para actualización de personería jurídica. Seguimiento once empresas en procesos de legalización a través del sector social de la economía, actividades de subsanación de documentos; dos empresas en procesos de complementar documento para iniciar proceso de legalización. Se entregarán libros foliados y sellados con un valor de L 4,500.00 por paquete de libros a 18 empresas.

Se desarrolló jornada de apoyo a las organizaciones con procesos de legalización a consultorio legal gratuito de la UNITEC en coordinación con HEIFER y FUNDER; desarrollando los siguientes procesos:

N°	Organización	Procedencia	Trámite legal
1	CRAC Chimiches	El Aguaje, Las Vegas Santa Bárbara.	Actualización de su personería jurídica
2	CRAC Los Laureles	Los Laureles, Santa Bárbara.	RTN de la organización
3	CRASVIDMIL	Santa Cruz de Yojoa, Cortes.	Marca Registrada

Se desarrolló capacitación sobre temas de legalización por consultorio jurídico gratuito de UNITEC, participaron 8 empresas atendidas en el departamento de Lempira (4 mujeres, 8 hombres).

Se encuentra en proceso de actualización de personerías jurídicas y sus juntas directivas 5 empresas de los departamentos de Lempira y Santa Bárbara.

Departamento	Empresas
Lempira	- EACP fraternidad n.2,
Santa Bárbara	- CRADVLMIL - CRAC Cafetaleros de Santa Rita - ESM GOBENEP - CRAC el Aguaje

Empresas en procesos de legalización a través del consultorio legal gratuito de la UNITEC, en coordinación con HEIFER y FUNDER;

Departamento	Empresas
Lempira	<ul style="list-style-type: none"> - Asoc. De Productores MANCAFE - Asoc. De Productores Nueva Visión - Asoc. De productores Unión y Esfuerzo - APROCASAN - Asoc. De Productores Personas con Visión. - CRAC Uniendo Esfuerzos
Copan	<ul style="list-style-type: none"> - CRAC Joyas Galanas - CRAC Jóvenes contra el Cambio Climático - ESM grupo de Mujeres Mucho Café - Jóvenes Aprocol - CRAC Nuevo Amanecer - CRAC Nueva Esperanza
Santa Bárbara	<ul style="list-style-type: none"> - ESM La Palca - CRAC la Palca - CRAC cerros de agua

Con la participación de los Procuradores del Bufete Jurídico de UNITEC se desarrolló el conversatorio enfocado a dar a conocer los requisitos para gestionar Personerías Jurídicas, Registro Sanitario, Registro de Marca, entre otros, a las organizaciones, Cajas Rurales y agregadores/as de valor individuales interesados en recibir asesoría y respaldo legal. Asistieron representantes de AMUCALAY, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Transformadoras de cacao, Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, entre otros.

Se impartieron 4 módulos de capacitación sobre catación en café; con enfoque de mercados, realizado en las instalaciones de del Mancomunidad Mapance en Gracias, Lempira,;

- Mercado especializado en micro lotes
- Daños primarios del café
- Daños secundarios del café
- Puntuación del café en tasa
- Despulpado
- Presentación ante compradores
- Tipos de secado
- Laboratorio de catación
- Rondas de catación.

Se desarrolló proceso de capacitación del promotorado empresarial en café con el módulo **Fortalecimiento Organizativo**, participando 22 personas de los cuales 6 son mujeres que actúan como representantes de organizaciones beneficiarias en el departamento de Santa Bárbara. Participación en proceso de certificación en gestión de proyectos dos asesores empresariales (Copan, Santa Bárbara) para una mejor gestión de las organizaciones intervenidas con el proyecto Conecta+. Se realizó la capacitación sobre procesos de calidad con enfoque de mercados; participando 21 personas representantes de organizaciones del departamento de Santa Bárbara. Se desarrolló taller de capacitación 43 participantes (11 mujeres y 32 hombres) sobre fortalecimiento Organizacional con la representantes de organizaciones de los departamentos de Lempira, Copan y Santa Bárbara, abordándose los siguientes temas:

- Tipos de empresas, ventajas y desventajas según los sectores
- Implicaciones de las empresas Sociales, Cooperativas, Mercantiles, Civiles y Agrarios.
- Procesos y legalización
- Test de Eneagrama de liderazgo y trabajo en equipo
- Tipo de personalidad para liderazgo
- Rol y Funciones de los cuerpos directivos
- Plan de beneficios

En el departamento de Lempira se impartieron 6 módulos de catación básica para los jóvenes hijos e hijas de productores de las organizaciones beneficiarias participando 15 jóvenes (10 hombres y 5 mujeres). Se desarrolló en el mes de marzo taller de capacitación sobre elaboración de 10 productos a base de café: azitín con aroma a café, cremas exfoliantes, crema corporal, licor de café, crema de licor de café, dulces de café, candelas aromáticas, jaleas, aromatizantes, esencia de café. Participando 33 personas de los departamentos de Lempira, Copan y Santa Bárbara (10 mujeres y 23 hombres).

Los Planes de Negocios de CRASVIDMIL y APAGRISAC ya han sido aprobados por COMRURAL y estamos a la espera del desembolso inicial para acompañar la construcción de infraestructura que contribuirá a mejorar la calidad del cacao que se procese, actualmente se han registrado pérdidas por limitaciones de espacio y procedimientos en las actividades de fermentación y secado.

Los recursos están orientados a construir instalaciones para un adecuado acopio y procesos postcosecha, oficinas administrativas, adquisición de equipo y herramientas.

Implementación del plan de capacitaciones sobre desarrollo empresarial de forma general en proceso de adopción de acuerdo a diagnósticos de las empresas, elaboración de plan de implementación y estrategia de intervención. Capacitación de 18 empresas, 36 participantes, de los cuales 13 son mujeres, 4 empresas en los meses de enero a febrero 2020. Planificado taller para construcción de planes de negocio de las empresas como herramienta de gestión financiera de las empresas. Desarrollo del taller por tres días y construido modelo por cada empresa, 18 empresas participantes con 36 personas involucradas, 13 mujeres involucradas. En proceso construcción de 18 planes de negocios para acceso a financiamiento. Incorporación de asesor especialista en financiamiento; que brindara asistencia y construcción de planes de negocio para empresas intervenidas por el proyecto Conecta+. Definido formato de elaboración de planes de negocios planes de negocios y metodología de capacitación para elaboración con las empresas. Programada capacitación para fortalecer capacidades en 36 organizaciones del proyecto Conecta+ y generar construcción de al menos 22 planes de negocio.

se llevó a cabo la construcción de base de necesidades de financiamiento de organizaciones intervenidas por el proyecto Conecta+, generándose necesidades de inversión en capital de trabajo, inversiones fijas y compra de maquinarias y/o equipos para mejorar aspectos

Desarrollada reunión de trabajo con todas las empresas atendidas por los proyectos CONECTA+ y Aprovechando el Éxito, se invitaron ONGs, exportadoras, intermediarios e instituciones gremiales del café que intervienen en la zona, con el objetivo de lograr establecer la MESA DE CAFÉ del departamento de Lempira. Así mismo se logró identificar todos los actores que intervienen en la cadena de valor de café del departamento de Lempira. En el evento hubieron 40 participantes, de los cuales catorce son mujeres. Intercambio con Montaña Verde en coordinación con IHCAFE, para las organizaciones de Santa Bárbara a fin de generar capacidades en la parte comercial. Se está programando para el segundo trimestre 2020; intercambio de experiencias a cajas rurales en Omoa, Cortes con el objetivo de conocer procesos organizativos, dirección y comercialización.

Producto 3: Programa de apoyo a pequeños y medianos productores de las cadenas productivas para asegurar el acceso con al menos 2 productos financieros e incentivos ambientales que incluyen prácticas e indicadores de sostenibilidad ambiental y salvaguardas sociales, y mecanismos para establecer alianzas con los sectores público, privado y bancario

Avance del trimestre:

La iniciativa financiera denominada “**Progreso Crediticio CAFEL S.A.**” representa una oportunidad para que Productores de Café y Cacao afiliados a la Cooperativa CAFEL, accedan a recursos financieros baratos y flexibles, con montos adecuados a sus necesidades de inversión. Todavía no se ha suscrito el convenio, pero existe mucho interés de FUNDER y HEIFER de fortalecer esta plataforma financiera que sirva como referencia a otras iniciativas similares. Realizada la reunión con representantes de la oficina del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (**SEMPRENDE**) con el propósito de identificar productos financieros que se canalizarán a través de Cajas Rurales para atender a Emprendedores que lo requieran.

se ha iniciado el proceso de vinculación de organizaciones beneficiarias con el programa de Agrocredito de **BANHPROVI** al 8.7% para apoyar aspectos de capital de trabajo e inversiones finas en los departamentos intervenidos. Envío de reporte de necesidades de financiamiento de 32 organizaciones beneficiarias (Copan, Lempira, Santa Bárbara) a **BANHPROVI**, para procesos de precalificación. Seguimiento vinculación con **BANHPROVI**, determinación de necesidades de financiamiento de L 30,640,000.00 para 32 empresas, enunciado resumen:

Necesidades Financiamiento Consolidado					
No de Socios Activos:	532	Mujeres	871	Hombres	1403
Volumen de Ingresos generados por la Organización	Últimos 3 años				
	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Total	
	61,344,000.00	119,000.00	15,000.00	L61,478,000.00	

Necesidad de Financiamiento	C. Trabajo	Infraestructura	Maquinaria
	18,200,000.00	9,490,000.00	2,950,000.00
	L 30,640,000.00		

Seguimiento vinculación con BECAMO de dos empresas de Copan logrando financiamiento de L. 1,125,000 para insumos y equipo.

N.	Organización	Municipio	Financiado	Monto	Destino
1	COMIXAL	San Agustín Copan	BECAMO	1,035,000.00	Compra de insumos y 2 balanzas para 5,000 lb.
2	Crac Buenos Aires	San Agustín Copan	BECAMO	90,000.00	Compra de insumos
Total				L. 1,125,000.00	

Se desarrolló reunión con CAFEL, PROGRESA, FUNDERH, CONECTA+/HEIFER, con el objetivo de definición de la estructura de financiamiento a través de PROGRESA, mediante brazo financiero de CAFEL, considera como experiencia piloto a través de los fondos HEIFER. CRAC Nuevo Amanecer en la comunidad de Gotas de Sangre No 1 en el municipio de Santa Rita de Copan y CRAC Nuevo Nueva Esperanza en la comunidad de San Antonio Miramar (lps. 114,000.00) en Cabañas, Copan; recibieron fertilizante mediante convenio con Consorcio Copan, el monto financiero será recuperado por la CRAC y administrarlo para capital semilla inicial de la organización. Para CRAC Jóvenes Luchando Contra el Cambio Climático (JACC) se gestionó a través de propuestas para los compradores y tostadores que visitan a CAFEL para solicitar capital semilla y fortalecer esta organización.

Concluida la redacción del convenio que debe firmarse entre FUNDER y HEIFER International e identificados los recursos de contrapartida, esperamos que a inicios del segundo trimestre del año se haya firmado el convenio para iniciar su implementación o al menos el pilotaje que se proyecta realizar a través de **PROGRESA** que servirá para ajustar los productos financieros que estarán disponibles para las Empresas Cafetaleras y otras que atiendan Café y Cacao.

En las visitas periódicas que se realizan a las Cajas Rurales, Organizaciones y a través de las Escuelas de Campo (ECA's) se promocionan los incentivos ambientales y los productos financieros disponibles. Estamos en proceso de fortalecimiento de las CRAC's para que puedan intermediar los fondos disponibles y con procesos de educación ambiental y financiera orientados a las familias asistidas por el Proyecto.

Revisadas las herramientas de Educación Financiera elaboradas por el Centro de Servicios Financieros de FUNDER (CSF) que servirán como base para las jornadas enfocadas en estos temas durante el año 2020 para crear conciencia en las familias cacaocultoras sobre el buen manejo del crédito, incentivar el ahorro y las inversiones.

Resultado 4: Gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación.

Producto 1: Las experiencias y lecciones aprendidas identificadas en el monitoreo del corredor biológico árido-húmedo del sur-occidente de Honduras son sistematizadas.

Avance del trimestre:

Se ha iniciado un proceso de sistematización del Proyecto, para ello, se ha contemplado la incorporación al equipo de trabajo de

Producto 2: Programa de cooperación Sur-Sur para el intercambio de conocimientos sobre la producción sostenible de café, cacao y otros productos agroforestales.

Avance del trimestre:

En la implementación de los componentes del Proyecto CONECTA+ del cual es responsable la UICN, actualmente no se han generado documentos de sistematización de experiencias. Únicamente se han elaborado ayudas memorias de reuniones o eventos, informes de avance de los diferentes trabajos realizados.

- Con el fortalecimiento de los comanejadores de las áreas protegidas postulantes al Programa de Lista Verde, en el manejo de la plataforma PANORAMA, más el seguimiento que se les estará dando; se espera que puedan elaborar y compartir sus experiencias a través de la plataforma, lo que vendría a ser una especie de compendio de información de referencia para procesos de sistematización de acciones.

Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación

Actividad de monitoreo y evaluación	Responsabilidad principal	Marco temporal	Reporte de la actividad
Taller de arranque	Oficina de país del PNUD	Trimestre 1 2019	cumplido
Informe de arranque	Coordinador del proyecto	En el plazo de dos semanas a partir del taller de arranque	cumplido
Informes trimestrales	Coordinador del proyecto	15 de abril 15 de julio 15 de octubre	cumplido el informe 1er trimestre 2020
Monitoreo de indicadores en el marco de resultados del proyecto	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente antes de la Junta de Proyecto	Aplica para la Junta de fin de año 2020
Reporte de implementación del proyecto del GEF (PIR)	Coordinador de proyecto, Oficina de País del PNUD y equipo del PNUD-GEF	Anualmente	Junio 2020
Auditoría de modalidad de implementación nacional según las políticas de auditoría del PNUD	Oficina de País del PNUD	Anualmente o con otra frecuencia, según las políticas de auditoría del PNUD	Pendiente
Lecciones aprendidas y generación de conocimiento	Coordinador del Proyecto	Anualmente	se hará para JdP Diciembre 2020
Monitoreo de riesgos ambientales y sociales y planes de gestión correspondientes según sean pertinentes	Coordinador de proyecto Oficina de País del PNUD	Cada 6 meses	Julio 2020
Atención a quejas ambientales y sociales	Coordinador de proyecto Oficina de país del PNUD	Cada 6 meses	Julio 2020
Actividades de monitoreo para la implementación del Plan de Participación de Actores	Experto en pueblos indígenas	Cada 6 meses	Pendiente
Reuniones de la Junta del proyecto	Junta del Proyecto Oficina de País del PNUD Coordinador del Proyecto	Cada 6 meses	Julio 2020 Diciembre 2020
Misiones de supervisión de actividades en campo	Especialista de Programa del PNUD	Anualmente	pendiente

Examen independiente de mitad de período y respuesta del personal directivo	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Entre el 2 ^{do} y el 3 ^{er} PIR.	No aplica aún
Evaluación final independiente incluida en el plan de evaluación del PNUD y la respuesta del personal directivo	Oficina de país del PNUD, equipo del proyecto y equipo del PNUD-GEF	Al menos tres meses antes del cierre de operaciones	No aplica aún
Traducción al inglés de los informes del examen independiente de mitad de período y de la evaluación final	Oficina de país del PNUD	Según sea necesario. El GEF solo aceptará informes en inglés.	No aplica aún
