

**DOCUMENTO DE PROYECTO**  
**Colombia**

**Título del Proyecto:** Ventana de Entidades No-Gubernamentales del Fondo Multidonante de las Naciones para el Posconflicto  
**Número del Proyecto:** 00097044  
**Asociado en la Implementación:** PNUD  
**Fecha de inicio:** 01 de agosto 2016  
**Fecha de finalización:** 31 de Diciembre de 2024

Breve Descripción
<p><i>El Fondo está administrado por la Oficina de Fondos de Participación Múltiple (la “MPTFO” por sus siglas en inglés) del Sistema de Naciones Unidas (SNU) con contribuciones de los donantes que han adherido al mismo. El funcionamiento del Fondo está guiado por sus Términos de Referencia, cuyos procedimientos están descritos en el Manual de Operaciones; a su vez, la operación de la Ventana de Entidades No-Gubernamentales se enmarca dentro de su Guía de Operación. Ambos documentos han sido sujetos a la aprobación del Comité de Dirección del Fondo.</i></p> <p><i>El Fondo opera a través de tres ventanas de implementación: (i) la ventana gubernamental; (ii) la ventana de las Naciones Unidas; y (iii) la ventana de la sociedad civil/sector privado. Esto permite la coordinación y alineación de acciones nacionales e internacionales para responder a las prioridades establecidas por Colombia en Paz, así como la asignación directa de recursos a los actores clave que se requieran en cada momento determinado.</i></p> <p><i>PNUD ha sido designado como agente administrativo de la ventana de Sociedad Civil/Sector Privado – Ventana de Entidades No-Gubernamentales, para lo cual dispondrá de los recursos financieros, técnicos y administrativos que sean requeridos para administrar esta Ventana, así como para brindar servicios de apoyo a la convocatoria, coordinación, comunicación, administración de recursos, monitoreo, administración de auditorías, creación de capacidades y rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados.</i></p>

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): 3. Pronta recuperación y regreso rápido a vías sostenibles de desarrollo en situaciones posteriores a conflictos y desastres (Paz & Conflictividades)
Producto(s) Indicativo(s): 100904, 103854, 103855, 104317, 104318, 104319, 104320, 104321, 106246, 106741, 107452, 107453, 107748, 109324, 110356, 117098, 119028, 119336, 120163, 120352, 121547, 123254, 123255, 123943, 128634, 131450, 131451, 131452, 131834, 132755.

Total, de recursos requeridos:	\$45,632,332.38	
Total, de recursos asignados:	TRAC PNUD:	
	MPTF:	\$45,632,332.38
	Donante:	
	Gobierno:	
	En especie:	
No financiado:		

Acordado por (firmas):

PNUD	
Firma	
Cargo:	
Fecha:	

---

## **I. DESAFÍOS DE DESARROLLO**

El conflicto armado en Colombia está estrechamente ligado a problemáticas de degradación ambiental, pobreza rural y profundización de los rezagos sociales y económicos en el desarrollo de los territorios afectados. La falta de capacidades institucionales para gestionar el desarrollo local y la insuficiente articulación y coordinación de las intervenciones e inversiones financiadas con recursos nacionales, territoriales y de cooperación internacional, impide generar mejores resultados en el abordaje de las problemáticas que afectan a los territorios.

Como resultado, aunque su incidencia ha venido disminuyendo en los últimos años, persiste un círculo vicioso de débil presencia estatal, economía ilegal, degradación del medio ambiente, alta conflictividad y violencia en múltiples regiones del país, que se refleja en mayor medida en las zonas rurales. Esta situación ha perpetuado e incluso ampliado, las brechas entre las diferentes regiones del país. Este es particularmente el caso para el goce efectivo de derechos, el acceso a bienes y servicios (infraestructura, desarrollo social, fomento a la productividad y formalización laboral) y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En este contexto, la construcción de la paz requerirá de esfuerzos de diversa naturaleza. Por un lado, será necesaria la definición de prioridades de inversión para el Estado en el postconflicto, el fortalecimiento de las instituciones que garanticen el acceso y la prevalencia de la justicia, la resolución pacífica de los conflictos y la implementación adecuada de eventuales acuerdos con los actores armados. Por otro lado, se hace necesaria la asignación, concurrencia y eficiente ejecución de los recursos financieros nacionales e internacionales que lo hagan posible.

Para contribuir a la solución de estos desafíos, y en línea con las prioridades del Gobierno, se creó el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto (MPTF, por sus siglas en inglés) para financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana de los acuerdos de paz. El Fondo se utilizará para apoyar y reforzar soluciones inmediatas que puedan tener un impacto fundamental para la construcción y consolidación de paz a más largo plazo, como ha sido definido en la Estrategia de Respuesta Rápida. Las soluciones propuestas parten de los siguientes supuestos:

- El período de tiempo entre la firma y refrendación del acuerdo, el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla y la verificación independiente del cumplimiento de este proceso puede ser un período de inestabilidad y tensión política que pone en riesgo la confianza de la población en la paz, además de generar incentivos para que surjan nuevas formas de violencia.
- Varias de las medidas del Acuerdo del fin del conflicto requieren de ajustes institucionales y legales para ser implementadas. Estos ajustes necesitan tiempo y no son inmediatos.
- El Estado tiene la obligación de dar señales de cumplimiento y compromiso con los Acuerdos del fin del conflicto y prevenir situaciones que generen inestabilidad y pongan en riesgo la implementación de los acuerdos.
- El ELN entra en un proceso de diálogo con el Gobierno.
- Se mantienen las proyecciones macroeconómicas en Colombia con un crecimiento moderado de la economía y sin grandes crisis en el escenario.
- Existirá un mecanismo de monitoreo y verificación a la implementación del Acuerdo del fin del conflicto que ayude a generar confianza y gestione posibles desacuerdos/incidentes entre el Gobierno, la Fuerza Pública y la Guerrilla.

Así mismo, las soluciones propuestas requieren de la participación activa de todos los sectores de la sociedad, tanto instituciones como sociedad civil y sector privado. En este sentido, garantizar que las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado se involucren directamente en las iniciativas de construcción de paz y no solo como beneficiarios, posibilitará su apropiación de los resultados del proceso y por esta vía mayor sostenibilidad de las mismas.

---

## **II. ESTRATEGIA**

La Ventana de Entidades No-Gubernamentales apoyará iniciativas aprobadas por el Comité Directivo del Fondo en el marco del MPTF, brindando servicios de apoyo a la convocatoria, coordinación, comunicación, administración de recursos, monitoreo, administración de auditorías, creación de capacidades y rendición de cuentas de los fondos desembolsados. Estas iniciativas estarán en el marco de los resultados estratégicos del MPTF a saber:

### ***Ámbito Justicia y Seguridad***

1. Consolidadas las bases para romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y violencia, a la vez que se apoya la transformación de la guerrilla en un actor democrático en lo político, lo social y lo económico y la construcción de órdenes sociales democráticos en los territorios.
2. Mejorado el acceso de los ciudadanos en territorios rurales a los diversos mecanismos de justicia formal y alternativa cambiando positivamente su percepción hacia la paz como condición que habilita mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios.
3. Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas.

### ***Ámbito Justicia Transicional y Reconciliación***

4. Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de Verdad, Tribunal Especial) generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia.

### ***Ámbito Socioeconómico***

5. Iniciado el proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto armado a través de intervenciones integrales que generen mercados transparentes y accesibles y a la vez cohesión social y territorial, que creen un equilibrio en la participación activa de la ciudadanía en el desarrollo y que reduzcan el riesgo que poblaciones específicas –por ejemplo, jóvenes sin trabajo, o desmovilizados-, se (re)-vinculen a dinámicas de violencia.<sup>1</sup>

### ***Ámbito Gobernabilidad y Conflictividades***

6. Desarrollada capacidad institucional en las Alcaldías y las Gobernaciones para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales responsables de la implementación de los acuerdos del fin del conflicto que les permitan a todos aprovechar las múltiples oportunidades de la paz para sus territorios.
7. Manejadas de forma constructiva y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan inestabilidad y violencia y generen confianza en que la paz servirá para abordar demandas sociales históricas de las comunidades.

### ***Ámbito Información, comunicación y relacionamiento***

---

<sup>1</sup> Se focaliza la acción en la reducción de las desigualdades horizontales o entre grupos sociales / poblacionales. La presencia de estas desigualdades incrementa la posibilidad que en los contextos de pobreza se desarrolle violencia.

8. Comunicados de forma eficaz y transparente los acuerdos del fin del conflicto, los avances en su implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes interesados y/o desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación

La Ventana parte del hecho que toda iniciativa de construcción de paz implica trabajar con una serie de enfoques que representan un estándar mínimo de intervención. Estos serán aplicados de manera contextualizada, coherente y sistemática en el proyecto:

- 1) **Acción sin daño y análisis con sensibilidad al conflicto:** Cada iniciativa a realizarse en el marco del proyecto contará con un análisis de actores, divisores, conectores y posibles daños a fin de desarrollar estrategias de mitigación y evidenciar las dinámicas y los actores que pueden contribuir a la construcción de paz, así como los riesgos y las oportunidades. Esto implica la utilización de los enfoques de sensibilidad al conflicto, enfoque poblacional, de pertinencia cultural y equidad de género, lo cual permite i) la focalización en los grupos marginados, en desventaja y/o excluidos y ii) el fortalecimiento institucional y el uso de los abordajes *top-down* y *bottom-up* de forma sinérgica.
- 2) **Derechos Humanos:** Incorporar el *Human Rights Based Approach* supone un cambio de paradigma que se traduce en que todas las actividades contribuyen a uno o varios derechos humanos y se realizan con base en los estándares y principios de derechos humanos. Estas actividades centran su actuación en la participación eficaz y con garantías, la responsabilidad de los “portadores de deberes”, la no discriminación y el empoderamiento de los titulares de derechos.

### ***Soluciones digitales<sup>2</sup>***

En el marco del proyecto se busca garantizar que las personas y comunidades beneficiarias de los proyectos y convocatorias seleccionadas por el Fondo Multidonante de las Naciones para el Sostenimiento de la Paz se fortalezcan en el manejo de herramientas tecnológicas, contribuyendo para que la comunicación con las entidades gubernamentales, sea a través canales de comunicación más efectivos y certeros no solo en situaciones de riesgo que se presentan en los territorios, sino en el desarrollo de los proyectos en ejecución.

Asimismo, el acceso a la conectividad garantiza la participación no solo de los participantes, y comunidades beneficiarias sino también facilita el acceso generalizado de la sociedad civil a la información producida en los proyectos y en las diferentes instancias del proceso de paz, incluyendo no solo estrategias de protección y autoprotección de comunidades vulnerables, piezas comunicativas y una gran variedad de insumos asociados a los proyectos, sino también el acceso a los informes de verificación del avance en la implementación del Acuerdo Final.

Lo anterior, contribuye a experimentar con nuevos enfoques y herramientas, escalar soluciones acordes a su cosmovisión y costumbres, mapear los riesgos a los cuales ellos actualmente se están enfrentando y desafíos planteados por las tecnologías digitales y aplicar la previsión para prepararse ante posibles riesgos futuros.

### ***Enfoque de Género***

El proyecto tiene previsto objetivos, actividades, indicadores y presupuesto específico para garantizar que el enfoque de género quede transversalizado en todas las fases del proyecto. Se diseñarán herramientas

---

<sup>2</sup> Please see the [Guideline “Embedding Digital in Project Design”](#).

específicas (estrategia con indicadores, listas de chequeo, etc.) para garantizar la real y efectiva aplicación del enfoque de género en todas las acciones del proyecto.

---

### III. RESULTADOS Y ALIANZAS

Un eje central de las iniciativas del PNUD en Colombia ha tenido como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores nacionales para la construcción de la paz, un aspecto de la construcción de paz que se ha demostrado como exitoso<sup>3</sup>. Al reunir este principio programático central con la estrategia del PNUD de combinar “las operaciones territoriales, el contacto con ONGs nacionales y con los gobiernos nacionales, la agencia tiene la capacidad de apoyar los procesos regionales de construcción de la paz y las infraestructuras de paz a nivel nacional”<sup>4</sup>. El PNUD ha demostrado una capacidad importante para construir y activar densas redes entre actores (gubernamentales y no gubernamentales) en diversas regiones del país, con el fin de apoyar los procesos de consolidación de la paz. En consecuencia, el PNUD ha tratado de cubrir un espacio crítico: contribuir a la articulación de los procesos de consolidación de la paz a nivel local y regional, involucrando principalmente la sociedad civil y las instituciones del gobierno local, con el ámbito nacional, incluyendo el gobierno central.

En línea con lo anterior, la Ventana de Entidades No-Gubernamentales contribuirá a facilitar la vinculación de las **Entidades de la Sociedad Civil (ESC) y del Sector Privado (SP) en las estrategias priorizadas, buscando de esta manera aumentar la base social comprometida con el proceso de paz y aportar a la sostenibilidad de los resultados conseguidos por las estrategias de respuesta rápida e implementación de los acuerdos**. El número de iniciativas seleccionadas y ESC y del SP receptoras de fondos de la Ventana dependerá de i) las decisiones que tome el Comité Directivo del MPTF y de ii) la disponibilidad de fondos.

Para lograr el resultado, el PNUD pondrá a disposición sus recursos, particularmente su experticia y capacidad administrativa técnica y financiera en la administración de fondos, así como el conocimiento adquirido por más de 10 años desarrollando iniciativas de construcción de paz de las ESC y las herramientas metodológicas para garantizar que las acciones desarrolladas contemplen los enfoques de acción sin daño y construcción de paz.

PNUD trabajará en el ámbito nacional, de manera coordinada con la Secretaría Técnica del MPTF, con el fin de mantener un diálogo fluido sobre los avances y retos de las iniciativas aprobadas, todo lo anterior en el marco del mecanismo de monitoreo y evaluación relacionado en la Guía de Operación de la Ventana.

Como base para el relacionamiento con las ESC y del SP, cuyas iniciativas se aprueben por el MPTF, se partirá de las ventajas comparativas del PNUD en cuanto a (i) su alcance territorial; (b) la percepción de imparcialidad y su capacidad de movilizar y crear alianzas con la sociedad civil, las instituciones y el sector privado; y (c) la creación y transferencia de capacidades técnicas para la gobernabilidad y la promoción de la articulación de los diferentes niveles de gobierno<sup>5</sup>.

Los principales riesgos que tendrá que mitigar el proyecto, están relacionados con:

- El rechazo y baja credibilidad en el proceso de paz, que puede disminuir el impacto en términos de percepción y resultados tangibles de las iniciativas aprobadas.
- El surgimiento de nuevas conflictividades sociales, que afecte directamente a las intervenciones de las ESC y del SP en el territorio

---

<sup>3</sup> Evaluación CPD 2008-2015, Julio 2014

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Arbulú (2014), Support for the Country Office, Evaluative Evidence: UNDP Colombia Design of a New Country Programme, p.4-6.

- El vacío de poder que ante la eventual firma de un acuerdo final, disminuirá o desaparecerá la capacidad de control territorial de la guerrilla, exponiendo las iniciativas territoriales a la posible cooptación y control de los territorios y economías ilícitas por parte de nuevos actores armados.
- La disminución o retraso en la llegada o disponibilidad de fondos que pondría en riesgo la implementación de las acciones y logro de los objetivos y crear una percepción negativa sobre la Ventana y en consecuencia el MPTF.

Las principales partes interesadas son: i) las instituciones del gobierno nacional que hacen parte del Comité Directivo del MPTF (Ministerio de Postconflicto, OACP, DNP, APC, Cancillería), ii) las agencias del SNU, representadas por el Coordinador Residente, iii) las ESC con representación en el Comité directivo y ESC que han manifestado interés o entregado propuestas para ser evaluadas.

La Secretaría Técnica del MPTF dará a conocer para cada convocatoria el procedimiento de selección que especificará los mecanismos de identificación, evaluación, selección, vinculación y documentación requerida.

La duración de la Ventana de Sociedad Civil está definida por el MPTF. Desde el PNUD se promoverá la articulación de las iniciativas de las ESC y del SP con otras iniciativas institucionales y de la Cooperación Internacional, de tal manera que las iniciativas puedan ser sostenibles una vez finalice el periodo de apoyo. De igual modo se procurará incluir en cada propuesta un componente de gestión de conocimiento que permita la transferencia de las buenas prácticas, metodologías y lecciones aprendidas a instituciones relacionadas con las iniciativas u otras ESC articuladas en el proceso.

#### Cooperación Sur-Sur

Las acciones de CS-S que se puedan concretar desde este proyecto se fundamentan en los componentes de gestión de conocimiento a incluir y desarrollar por cada iniciativa y se enmarcan dentro del apoyo que tiene previsto dar el PNUD al gobierno (APC, Cancillería, DNP) para posicionar al país como un socio estratégico para recibir y canalizar la Cooperación Sur-Sur y Triangular y como punto de referencia en áreas como la construcción de paz y la innovación social.

#### Sostenibilidad y Escalamiento

Con base en el seguimiento a las propuestas aprobadas, la evaluación prevista para este proyecto y las herramientas que se desarrollen dentro del marco de gestión de conocimiento de cada iniciativa, unido a la amplia experiencia del PNUD en temas de construcción de paz, se identificarán y sistematizarán -en alianza con otros aliados nacionales/territoriales-, aquellas iniciativas que por su contribución a los efectos del MPTF puedan servir como experiencias a replicar en otros países.


Por la importancia primordial del liderazgo nacional en la implementación de los acuerdos de paz, la cooperación internacional asume un rol complementario a los esfuerzos nacionales. Esta propuesta está diseñada para apoyar, fortalecer y contribuir a las prioridades establecidas por el Gobierno Colombiano para el alistamiento y el contexto post-acuerdo, promoviendo así la sostenibilidad de los resultados mediante la inclusión de las prioridades de construcción de paz – con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres - en la planeación e implementación gubernamental a nivel territorial y nacional. En este sentido, las líneas de trabajo presentadas en este proyecto han sido desarrolladas a partir del marco de resultado del MPTF junto con las autoridades nacionales, con la visión de expandir o complementar programas, políticas o planes existentes, logrando así una sostenibilidad de los resultados. Asimismo, la propuesta está enfocada en fortalecer capacidades nacionales y territoriales para la paz, en particular de las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres, lo cual promueve la sostenibilidad de los resultados ya que ayuda a los

individuos, grupos, organizaciones, comunidades y entidades a desarrollar sus habilidades para desempeñar funciones, resolver problemas y conflictos, establecer y alcanzar resultados.

#### IV. GESTIÓN DEL PROYECTO (1 / 2 -

PNUD, como Agente de Gestión (AG) se encargará de diseñar e implementar el proyecto que permita vincular a las Entidades No-Gubernamentales seleccionadas y administrar eficientemente todas las asignaciones de recursos realizadas siguiendo para tal efecto las políticas y procedimientos establecidos por el PNUD (POPP, por sus siglas en inglés). Para las tareas y responsabilidades del Agente de Gestión se cobrará un 3% de costos indirectos generales de gestión (GMS, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se podrán cargar al Fondo otros costos directos relacionados con las funciones del AG que no hayan sido cubiertos por los costos generales (por ejemplo: identificar y/o convocar ESC, gestión de evaluaciones y auditorías etc.).

#### Rol de la Ventana de Sociedad Civil

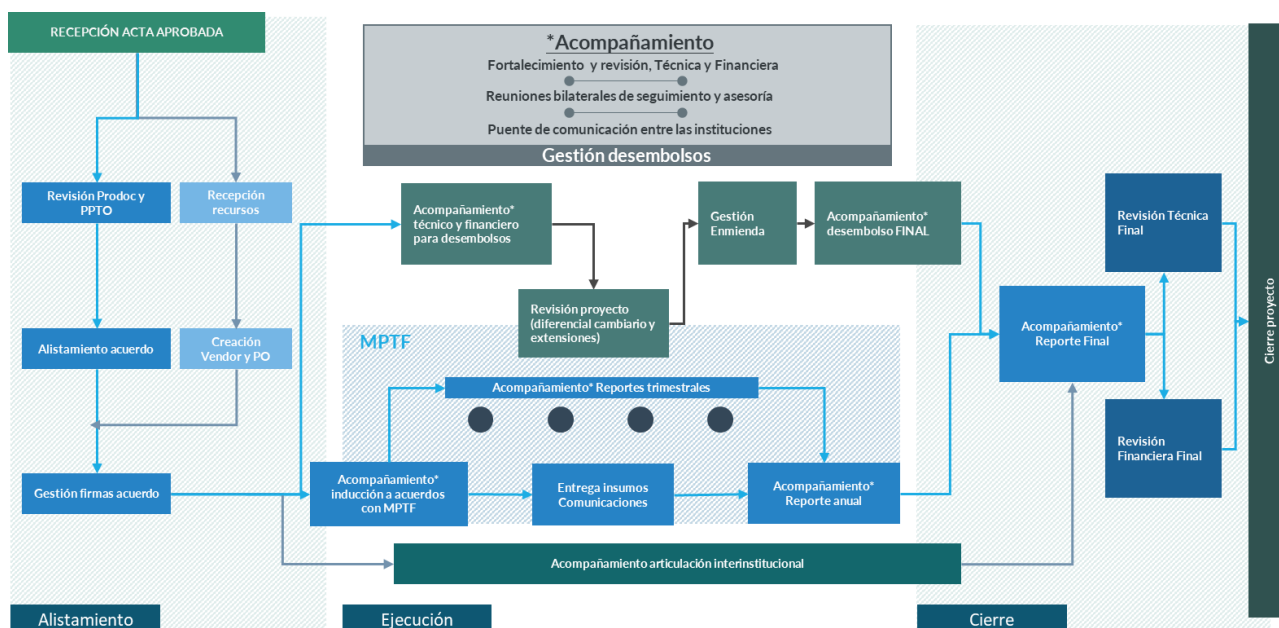


#### Rol del PNUD





### **Ventana Sociedad Civil en el PNUD**

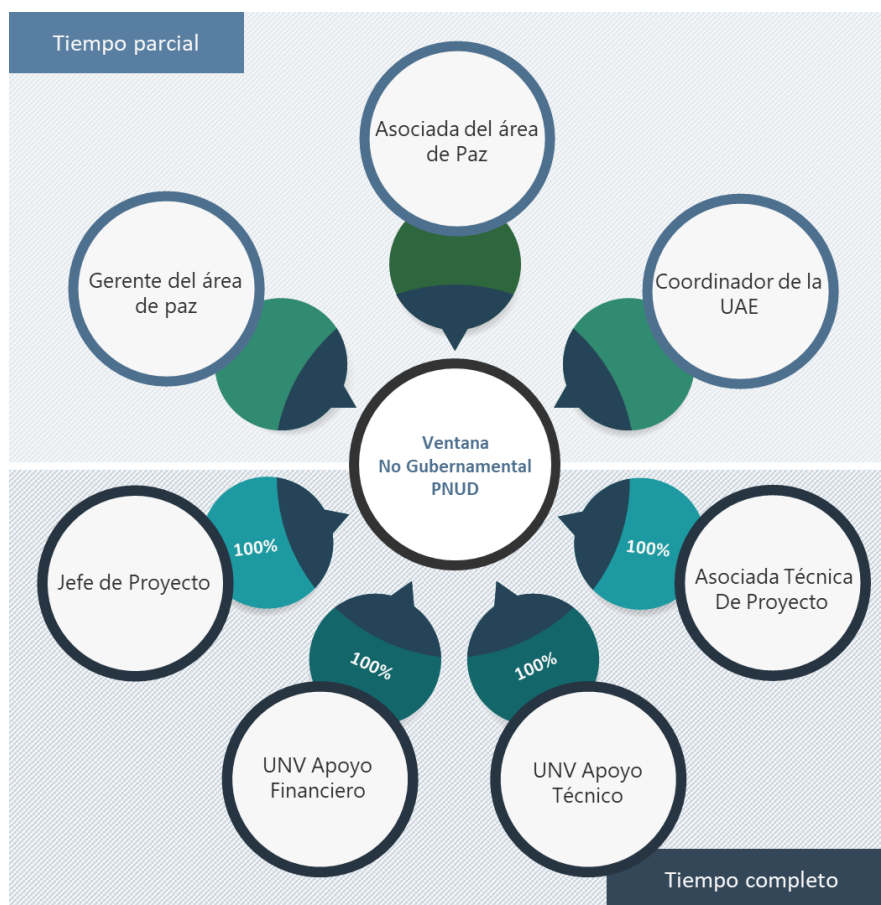

El proyecto se desarrollará en los departamentos, municipios, comunidades o localidades que se especifiquen en los documentos de proyectos de las propuestas aprobadas. El PNUD procurará, mediante el acompañamiento técnico a las organizaciones proponentes, que los enfoques transversales sean claramente identificables y que se realicen acciones para garantizarlos.

El PNUD siguiendo sus políticas y procedimientos realizará una auditoría externa durante la ejecución del proyecto y una evaluación al final del mismo.

V. MARCO DE RESULTADOS<sup>6</sup>

<b>Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:</b> Fortalecimiento de las capacidades nacionales y territoriales para la transición hacia la paz								
<b>Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:</b> Porcentaje de personas en los sectores focalizados con una mejor percepción de los diálogos de paz, desagregado por sexo y edad, Línea base: 29% (2015) Meta: 49% (2019)								
<b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:</b> Capacidades desarrolladas para la implementación de los acuerdos de paz en los procesos de alistamiento, estabilización y respuesta rápida y en el diseño y la implementación de la arquitectura institucional								
<b>Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: 00097044 MPTF Ventana de Entidades No-Gubernamentales</b>								
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
			Valor	Año	Año 1	Año 2	FINAL	
<b>1. Ruptura del vínculo entre política y violencia</b> <i>Consolidadas las bases para romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y violencia, a la vez que se apoya la transformación de la guerrilla en un actor democrático en lo político, lo social y lo económico y la</i>	Percepción de resiliencia de las Juntas de Acción Comunales (JAC)	<i>Encuesta dirigida a líderes comunitarios (Min Postconflicto)</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a la pregunta de percepción (a través de la encuesta).</i>
	Percepción de aceptabilidad de la	<i>Encuesta dirigida a víctimas de las FARC/President</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a la pregunta de</i>

<sup>6</sup> El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

<i>construcción de órdenes sociales democráticos en los territorios</i>	inclusión social de personas reinsertadas	<i>es de JACs y líderes de sujeto colectivos (Min Postconflicto)</i>						<i>percepción (a través de la encuesta).</i>
<b>2. Mecanismos de justicia formal y alternativa</b> <i>Mejorado el acceso de los y las ciudadanos en territorios rurales a los diversos mecanismos de justicia formal y alternativa cambiando positivamente su percepción hacia la paz como condición que habilita mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios.</i>	Percepción de acceso a los servicios de justicia ofrecidos por el Estado	<i>Encuesta dirigida a usuarios de las ferias y jornadas y usuarios del Sistema Local de Justicia.</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i>
<b>3. Seguridad en los territorios y la confianza en el Estado</b> <i>Mejorada la percepción de los y las ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas.</i>	Cambio en la percepción que tiene la población con relación a la seguridad para la movilidad y el uso del territorio	<i>Encuesta dirigida a presidentes de JAC</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i>
	Percepción sobre grado de la sensibilidad de la reacción del Estado frente a la extorsión	<i>Encuesta dirigida a personas que han realizado denuncias por extorsión</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i>
<b>4. Reparación a víctimas</b> <i>Acelerado y concretizado el proceso de reparación a</i>	Confianza de las víctimas en el Estado	<i>Encuesta dirigida a representantes de sujetos</i>	TBC		TBC	TBC		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de</i>

<i>víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de Verdad, Tribunal Especial) generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia.</i>		<i>colectivos y a las víctimas indemnizadas.</i>						<i>percepción (a través de la encuesta).</i>
<b>5. Rehabilitación económica y de infraestructura</b> <i>Iniciado el proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto armado a través de intervenciones integrales que generen de mercados transparentes y accesibles y la vez cohesión social y territorial, que creen un equilibrio en la participación activa de la ciudadanía en el desarrollo y que reduzcan el riesgo que poblaciones específicas –por ejemplo.</i>	Percepción de mejora de la calidad de vida de la población	<i>Encuesta dirigida a beneficiarios del proyecto de RR de productividad agropecuaria, a comunidades donde se ha mejorado las vías, y a profesores de instituciones educativas beneficiadas.</i>	<i>TBC</i>		<i>TBC</i>	<i>TBC</i>		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta</i>
	Prevención de reclutamiento	<i>Encuesta dirigida a líderes de comunidades, actores locales y beneficiarios de proyectos de la ERR</i>	<i>TBC</i>		<i>TBC</i>	<i>TBC</i>		<i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i>

<p><b>6. Capacidad institucional en las Alcaldías y las Gobernaciones</b></p> <p><i>Desarrollada capacidad institucional en las Alcaldías y las Gobernación para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales responsables de la implementación de los acuerdos del fin del conflicto que les permitan a todos aprovechar las múltiples oportunidades de la paz para sus territorios.</i></p>	<p>Evaluación de desempeño integral</p>	<p><i>El índice anual del DNP del desempeño integral de las entidades territoriales, desagregado al nivel de municipio y departamento</i></p>	<p>TBC</p>		<p>TBC</p>	<p>TBC</p>		<p><i>La evaluación del desempeño integral del DNP se basa en un análisis de cuatro componentes: Eficacia, eficiencia, gestión y requisitos legales.</i></p> <p><i>Escala: 5. Sobresaliente, 4. Satisfactorio, 3. Medio, 2. Bajo, 1. Crítico</i></p>
<p><b>7. Conflictividad social</b></p> <p><i>Manejadas de forma constructiva y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan inestabilidad y violencia y generen confianza en que la paz servirá para abordar demandas sociales históricas de las comunidades.</i></p>	<p>Percepción por parte de la comunidad, acerca del reconocimiento de las JAC y otras organizaciones como actores en la mediación y resolución de problemas comunitarios</p>	<p><i>Encuesta dirigida a comunidades</i></p>	<p>TBC</p>		<p>TBC</p>	<p>TBC</p>		<p><i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i></p>
	<p>Percepción de resiliencia de las JAC</p>	<p><i>Encuesta dirigida a líderes comunitarios</i></p>	<p>TBC</p>		<p>TBC</p>	<p>TBC</p>		<p><i>Se mide el promedio de las calificaciones otorgadas a las preguntas de percepción (a través de la encuesta).</i></p>
<p><b>8. Pedagogía para la paz</b></p> <p><i>Comunicados de forma eficaz y transparente los acuerdos del</i></p>	<p><i>Por Definir</i></p>	<p><i>Por Definir</i></p>	<p>TBC</p>		<p>TBC</p>	<p>TBC</p>		<p><i>Por Definir</i></p>

<i>fin del conflicto, los avances en su implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes interesados y/o desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

### Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.		
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva del MPTF y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado -con	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)			

	medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.				
<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y sus aprendizajes con los actores relevantes.	Por definir por la Junta Directiva del Proyecto	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.		



VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>78</sup>

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año									Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
<b>Producto 1</b> Consolidadas las bases para romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y violencia, a la vez que se apoya la transformación de la guerrilla en un actor democrático en lo político, lo social y lo económico y la construcción de órdenes sociales democráticos en los territorios.	<i>Participar en proyectos de mejoramiento en los tiempos de respuesta a la extorsión mediante denuncia digital y campaña de prevención y denuncia</i>	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$574,204.4	\$143,551.1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 717,755.50
	<i>Contribuir al alistamiento del proceso de DDR</i>	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 0.00
	Subtotal para el Producto 1													\$ 717,755.50
<b>Producto 2.</b> Mejorado el acceso de los y las ciudadanos en territorios rurales a los diversos mecanismos de justicia formal y alternativa cambiando positivamente su percepción hacia la paz como	<i>Apoyar la creación y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia en 106 municipios</i>	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$2,636,800.6	\$121,786.2	\$1,918,089.2	\$159,348.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 4,836,023.97
	Subtotal para el Producto 2													\$ 4,836,023.97

<sup>7</sup> En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

<sup>8</sup> Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año										Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Fuente de Financiamiento		Descripción del Presupuesto	Monto	
condición que habilita mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios															
<b>Producto 3:</b> Mejorada la percepción de los y las ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas	Realizar acciones de desminado de 20 municipios de más afectación, señalización y RR	\$0.0	\$1,155,341.1	\$3,270,927.3	\$403,934.4	\$746,499.7	\$211,743.3	\$702,520.2	\$1,181,723.5	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 7,672,689.46	
	Contribuir al fortalecimiento del enfoque de género en la Policía Rural para atender mejor violencia sexual y violencia intrafamiliar	\$0.0	\$0.0	\$1,388,418.6	\$1,113,359.7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 2,501,778.30	
	Subtotal para el Producto 3													\$ 10,174,467.76	
<b>Producto 4:</b> Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana (Comisión de Verdad, Tribunal	Participar en los procesos de mejoramiento de capacidades de la Unidad de Restitución de Tierras para actuar en el sur del país	\$0.0	\$21,921.9	\$787,371.6	\$232,173.4	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 1,041,466.79	
	Facilitar proceso de desvinculación de menores del conflicto armado	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$393,444.2	\$1,503,026.5	\$46,121.7	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 1,942,592.34	
	Subtotal para el Producto 4													\$ 2,984,059.13	

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año									Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Especial) generando mejores condiciones para la no repetición y creando las bases iniciales para la reconciliación en Colombia.														
<b>Producto 5:</b> Iniciado el proceso de rehabilitación económica y de infraestructura de los territorios más afectados por el conflicto armado a través de intervenciones integrales que generen de mercados transparentes y accesibles y la vez cohesión social y territorial, que creen un equilibrio en la participación activa de la ciudadanía en el desarrollo y que reduzcan el riesgo que poblaciones específicas –por ejemplo, jóvenes sin trabajo, o desmovilizados-, se (re)-vinculen a dinámicas de violencia.	Apoyar proyectos de construcción y/o mejoramiento de pequeña infraestructura social y económica y oportunidades de empleo	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 0.00
	Desarrollar acciones para la asignación de 145 mil cupos para jóvenes víctimas y desmovilizados	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 0.00
	Realizar acciones en el marco de la estrategia de sustitución de cultivos de uso ilícito (erradicación forzosa en 127 municipios y acuerdos voluntarios en 11 zonas priorizadas)	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1,648,000.0	\$412,000.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 2,060,000.00

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año									Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
	<i>Promover iniciativas para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos criminales</i>	\$0.0	\$1,267,054.9	\$2,989,162.7	\$775,705.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 5,031,923.18
	<i>Implementar proyectos de producción rápida de alimentos para el autoconsumo, educación nutricional, e impulso a proyectos productivos</i>	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1,305,889.3	\$832,693.7	\$206,910.7	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 2,345,493.63
	<i>Subtotal para el Producto 5</i>													9,437,416.81
<b>Producto 6:</b> Desarrollada capacidad institucional en las Alcaldías y las Gobernación para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales	<i>Apoyar iniciativas en el marco del proyecto “Manos a la Paz: universitarios voluntarios”</i>	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 0.00
	<i>Promover acciones relacionadas con el Alistamiento institucional para la paz</i>	\$0.0	\$0.0	\$191,551.3	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 191,551.32

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año									Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
responsables de la implementación de los acuerdos del fin del conflicto que les permitan a todos aprovechar las múltiples oportunidades de la paz para sus territorios.	Facilitar espacios en el marco del Plan de Alistamiento para la formulación e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 0.00
Subtotal para el Producto 6														191,551.32
<b>Producto 7:</b> Manejadas de forma constructiva y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan inestabilidad y violencia y generen confianza en que la paz servirá para abordar demandas sociales históricas de las comunidades.	Contribuir al desarrollo de la estrategia “Fortalecimiento de grupos de veeduría ciudadana y ejercicios de control social asociados a la estrategia de respuesta rápida y la implementación temprana de los acuerdos”	\$0.0	\$0.0	\$86,983.8	\$394,678.4	\$1,198,815.3	\$546,245.3	\$1,858,809.1	\$2,193,042.7	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 6,278,574.51
Subtotal para el Producto 7														\$ 6,278,574.51
<b>Producto 8:</b> Comunicados de forma eficaz y transparente los acuerdos del fin del conflicto, los avances en su implementación, las dinámicas de	Implementar iniciativas de de la Estrategia de Pedagogía de los Acuerdos de Paz	\$1,614,978.7	\$2,700,743.6	\$94,120.2	\$328,977.3	\$770,680.6	\$1,005,723.0	\$710,647.2	\$2,058,879.2	\$0.0	PNUD	MPTF	Grants 72600	\$ 9,284,749.74
Subtotal para el Producto 8														\$ 9,284,749.74

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año									Resp	PRESUPUESTO PREVISTO		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes interesados y/o desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación.														
Costo de Apoyo (GMS)		\$151,456.3	\$431,068.0											\$ 585,524.27
Direct Costs Budget		\$0.0	\$1,208.7	\$52,146.7	\$95,354.5	\$259,538.6	\$355,417.2	\$596,966.5	\$364,801.5	\$51,500.0				\$ 1,776,933.64
TOTAL														\$ 45,681,532.38



Comité Directivo:

El Comité de Directivo estará conformado de la siguiente manera: por parte del PNUD el Director de País, o su delegado(a); y, por parte de MPTF el gerente de la OCR o su delegado.

La función principal de este Comité es dar dirección estratégica al proyecto en atención a las prioridades definidas por el MPTF y el PNUD en los temas relacionados con la Ventana No-Gubernamental. Así mismo, evaluará los resultados del proyecto y definirá directrices para su mejoramiento.

El Especialista de Programa del Área de Paz y Desarrollo, con el apoyo del equipo técnico del área de paz y desarrollo y otras áreas del PNUD, o su designado, se encargará de garantizar que el proyecto cuente con las herramientas técnicas y metodológicas relacionadas con la incorporación de los enfoques de construcción de paz, acción sin daño y sensibilidad al conflicto, así como brindar asistencia técnica al Comité Directivo y la dirección del proyecto, en las temáticas relacionadas con convocatorias, evaluación de capacidades, etc.

Las funciones principales del Comité Directivo son:

- a. Hacer seguimiento estratégico y financiero al proyecto.
- b. Identificar alertas en el desarrollo del proyecto y determinar posibles soluciones.
- c. Definir lineamientos de la actuación del equipo del proyecto en función de las orientaciones generadas en el Comité Directivo.
- d. Definir los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión. Estos lineamientos incluirán el uso de logos de las entidades, mensajes a difundir a terceros, entre otros.
- e. Participar en los mecanismos de coordinación y articulación con otras entidades de gobierno que puedan ser aliadas del proyecto que sean solicitadas por el MPTF.
- f. Aprobar informes de avance y reportes financieros del proyecto.

Arreglos Administrativos y de Gestión

Financieros

El inicio del proyecto sólo se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento. Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD.

#### Servicios administrativos y de apoyo

De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). Para sufragar esos gastos de GMS, se imputará a las Contribuciones de donantes un cargo del 3%. Así mismo, en la medida en que correspondan inequívocamente a un determinado programa/proyecto, todos los gastos directos de implementación, incluidos los gastos de la Entidad de Ejecución o de un Asociado en la Implementación, se incorporarán en el presupuesto del programa/proyecto en correspondencia con la partida presupuestaria pertinente y se imputarán en consecuencia al programa/proyecto.

Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

#### Variaciones Cambiarias

Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (USD\$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de la revisión presupuestal.

#### Previsiones o Variaciones Cambiarias

Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo.

Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que éstas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.

#### Transferencia de Equipos

La transferencia de los equipos adquiridos a través del presente proyecto está condicionada al compromiso formal por parte del organismo de ejecución, que dichos equipos sean para el servicio del proyecto y sus propósitos, hasta la finalización de las actividades del proyecto. El director del proyecto será responsable de la localización y uso de estos bienes adquiridos a través del proyecto.

#### Publicaciones

No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto.

#### Terminación de proyecto

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que exista la prórroga; 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de su objeto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito.



## Arreglos de auditoría

La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD. Si el Informe de Auditoría anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera observaciones pertinentes a la Contribución, la Oficina del País pondrá esa información en conocimiento del Fondo.

---

## IX. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado en 1973 entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS).

El PNUD acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno de los fondos del proyecto recibidos conforme al Documento de Proyecto se utilice para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999. Este listado puede consultarse en [http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml). Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.

De acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas del PNUD, se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (<http://www.PNUD.org/ses>), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (<http://www.PNUD.org/secu-srm>).

El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación.

**X. ANEXOS**

- 1. Informe de Calidad del Proyecto**
- 2. Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental**
- 3. Análisis de Riesgo**
- 4. Evaluación de Capacidades:**
- 5. Términos de referencia de la Junta del Proyecto y TdR de los principales puestos de gestión.**
- 6. Disposiciones sobre On-Granting aplicables al socio ejecutor.**

**PLAN DE PAGOS**  
**Proyecto 97044 - MPTF Ventana de Entidades No Gubernamentales**

Output	MPTF ID	Descripción
100904	101799	Pedagogía para la Paz - Comunicados de forma eficaz y transparente los acuerdos del fin del conflicto, los avances en su implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios
103854	103157	Reparaciones Colectivas - Acelerado y concretizado el proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional pactadas en La Habana
103855	103753	Mejora Seguridad - Minas - Mejorada la percepción de los y las ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas.
104317	112644	Conflictividad Social - Manejadas de forma constructiva y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas que prevengan inestabilidad y violencia
104318	106165	Prevención de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el marco del Posconflicto
104319	116693	Ruptura Política y Violencia - Consolidadas las bases para romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y violencia, a la vez que se apoya la transformación de la guerrilla en un actor democrático en lo político, lo social y lo económico
104320	113002	Justicia Formal y Alternativa - Mejorado el acceso de los y las ciudadanos en territorios rurales a los diversos mecanismos de justicia formal y alternativa cambiando positivamente su percepción hacia la paz como condición que habilita mayor justicia, equidad, tranquilidad.
104321	112647	Capacidad Institucional - Desarrollada capacidad institucional en las Alcaldías y las Gobernación para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales responsables de la implementación de los acuerdos
106246	106164	Fortalecimiento Voceros de Paz - Marco legal para la implementación del acuerdo Final con énfasis en los puntos 2, 3 y 6 formulado y aprobado, contribuyendo a poner en marcha el proceso de reincorporación política, social y económica.
106741	103754	Direct Cost Budgets - Costos directos asociados a la implementación a las iniciativas de la ventana
107452	107397	Seguimiento Acuerdos - Verificación de la implementación del Acuerdo Final, asegurando que los Notables cuenten con la información y el análisis provisto por su Secretaría Técnica
107453	107715	Barómetro - Estrategia de seguimiento y asistencia técnica a los Acuerdos de Paz
107748	108158	Minas II “Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario y Gestión Territorial (2017 – 2018)”
109324	109015	Pastoral Social / Programa de Construcción de Confianza y Paz Territorial en Clave PDET para Chocó, Guaviare (7 Municipios)
110356	110280	Enfoque de Género en el Servicio de Policía - Fortalecimiento del enfoque de género en la policía rural, y mejorar la respuesta frente a las diferentes formas de violencia basada en género.
117098	117684	Plan de contingencia en apoyo a familias erradicadoras de coca-Proyecto PNIS. Crear una ayuda puente entre fases del PNIS que asegure el compromiso de los beneficiarios del PNIS con este programa.
119028	119013	Blended Finance - Promover el desarrollo de los municipios sujetos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a través del apalancamiento de recursos privados que, junto con recursos de la cooperación internacional, aporten a la construcción de paz

**PLAN DE PAGOS**  
**Proyecto 97044 - MPTF Ventana de Entidades No Gubernamentales**

Output	MPTF ID	Descripción
119336	119876	Sostenibilidad de las actividades de Desminado Humanitario "DESMINADO HUMANITARIO III" - Entrega de zonas libres de sospecha de minas antipersonal a las comunidades y autoridades locales, y fortalecer dinámicas de desarrollo que se han identificado a partir de la liberación de tierras.
120163	120640	Líderes - Fortalecimiento de la capacidad de protección y autoprotección para redes de defensores y/o redes de organizaciones de derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos en Colombia
120352	120641	Secretaría Técnica CSIVI - Proveer a la CSIVI, los acompañantes internacionales y la sociedad colombiana, en particular las autoridades y comunidades de regiones PDET, información veraz sobre el cumplimiento de la implementación de todos los puntos del Acuerdo.
121547	121873	Instancia Pueblos Étnicos - Hacer seguimiento de la implementación del Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación, a través de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
123254	124710	Iniciativas comunitarias desarrolladas por organizaciones de la sociedad Civil que promuevan la convivencia y la reconciliación en escenarios de reincorporación
123255	125590	Participación/acceso a instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)
123943	125589	Mejoramiento de las capacidades técnicas, metodológicas y operativas del acompañamiento a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), para la cualificación del desempeño de sus funciones y como parte del proceso de reincorporación integral, en el contexto de la excepcionalidad derivada del covid-19.
128634	128986	BAROMETRO II
131450	131602	Defensores II
131451	N/a	Participación en Proceso de Búsqueda
131452	133396	Legado Comisión de la Verdad
131834	132577	Humanicemos
132755	133048	Componente Comunes

Output	MPTF ID	R e v.	FECH A ESTIM ADA DE DEPO SITO	FECHA DEL DEPOSI TO	Valor Moneda Original	Mone da	Tasa Op.	USD	Estad o	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBR E FUENTE	DONAN TE	NOMBR E DONAN TE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
100904	101799	A	sep-16	20-sep-16	1.000.000,00	USD	1	1.000.000,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		"Pedagogía sobre el acuerdo de paz"
100904	101799	A	sep-16	4-oct-16	210.537,00	USD	1	210.537,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		"Pedagogía sobre el acuerdo de paz"
100904	103753	A	dic-16	20-dic-16	2.574.773,00	USD	1	2.574.773,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103854	103157	A			22.821,71	USD	1	22.821,71	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		"Pedagogía sobre el acuerdo de paz" ARTE DE VIVIR - Rep Col
100904	103753	B	dic-16	20-dic-16	(2.010.938,64)	USD	1	- 2.010.938,64	Transf erido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	B	dic-17	20-dic-16	309.000,63	USD	1	309.000,63	Transf erido	002519	HANDICAP INTERNATI ONAL	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	B	dic-17	20-dic-16	517.568,41	USD	1	517.568,41	Transf erido	009510	Campaña Colombian a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	B	dic-16	20-dic-16	154.369,60	USD	1	154.369,60	Transf erido	009512	Fun Restrepo B	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	B	dic-17	20-dic-16	515.000,00	USD	1	515.000,00	Transf erido	009513	Halo Trust	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	B	dic-17	20-dic-16	515.000,00	USD	1	515.000,00	Transf erido	009514	APN	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	4.259.702,00	USD	1	4.259.702,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	(4.259.702,00)	USD	1	- 4.259.702,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	920.365,66	USD	1	920.365,66	PAGA DO	002960	Save The Children	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s

Output	MPTF ID	R e v.	FECH A ESTIM ADA DE DEPO SITO	FECHA DEL DEPOSI TO	Valor Moneda Original	Mone da	Tasa Op.	USD	Estad o	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBR E FUENTE	DONAN TE	NOMBR E DONAN TE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	1.092.062,54	USD	1	1.092.062,54	PAGA DO	009509	Fundación Plan	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	1.137.007,62	USD	1	1.137.007,62	PAGA DO	009515	Aldeas Infantiles	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s
104318	106165	B	jul-17	21-jul-17	1.110.266,18	USD	1	1.110.266,18	PAGA DO	009516	Círculo de Obreros	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñ@s
106246	106164	B	jul-17	21-jul-17	1.633.712,77	USD	1	1.633.712,77	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		CEPDIPO
106246	106164	B	jul-17	21-jul-17	(1.633.712,77)	USD	1	- 1.633.712,77	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		CEPDIPO
106246	106164	B	jul-17	21-jul-17	1.633.712,77	USD	1	1.633.712,77	PAGA DO	009518	Centro Pensamien to Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%		CEPDIPO
106741	103754	B	jul-17	13-jul-17	104.423,83	USD	1	104.423,83	PAGA DO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget (Cepdipo)
106741	103754	B	jul-17	13-jul-17	163.838,00	USD	1	163.838,00	PAGA DO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget (Prevención)
106741	103754	B	oct-17	1-nov-17	39.291,00	USD	1	39.291,00	PAGA DO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget (Pedagogía)
106741	103754	B	dic-17	20-dic-16	94.753,00	USD	1	94.753,00	Transf erido	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - Minas I (pendientes de trasladar al output)
107452	107397	B	oct-17	1-nov-17	617.975,00	USD	1	617.975,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)
107452	107397	B	oct-17	1-nov-17	(617.975,00)	USD	1	- 617.975,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)
107452	107397	B	oct-17	1-nov-17	285.647,18	USD	1	285.647,18	PAGA DO	003607	CERAC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
107452	107397	B	oct-17	1-nov-17	332.327,82	USD	1	332.327,82	PAGADO	009508	CINEP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)
107453	107715	B	nov-17	21-nov-17	1.027.866,00	USD	1	1.027.866,00	PAGADO	009517	Pastoral Social/Kroc	30000	TP	12641	MPTF	3%		Barómetro (Kroc)
107748	108158	B	nov-17	19-dic-17	566.500,00	USD	1	566.500,00	PAGADO	002519	HANDICAP INTERNACIONAL	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	B	nov-17	19-dic-17	874.926,00	USD	1	874.926,00	PAGADO	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	B	nov-17	n/a	0,29	USD	1	0,29	Ajustado	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	B	nov-17	19-dic-17	927.000,00	USD	1	927.000,00	PAGADO	009513	Halo Trust	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	B	nov-17	19-dic-17	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	009534	ATEXX Expertos Explosivos	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
106741	103754	C	jul-18	16-jul-18	23.745,00	USD	1	23.745,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - CINEP/CERAC
106741	103754	C	jul-18	16-jul-18	38.417,00	USD	1	38.417,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - Pastoral Social / KROC
106741	103754	C	jul-18	16-jul-18	84.608,00	USD	1	84.608,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - Minas II
107748	108158	C	nov-17	n/a	0,29	USD	1	- 0,29	Ajustado	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	C	feb-18	1-mar-18	412.000,00	USD	1	412.000,00	PAGADO	009971	PERIGEO	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas II
109324	109015	C	feb-18	22-feb-18	607.682,00	USD	1	607.682,00	PAGADO	009517	Pastoral Social	30000	TP	12641	MPTF	3%	19/02/2020	Confianza y Paz (ppta inicial)

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
110356	110280	D	abr-18	25-abr-18	1.618.262,00	USD	1	1.618.262,00	PAGADO	010655	ALIANZA PARA LA PAZ ONG	30000	TP	12641	MPTF	3%	17 meses	Enfoque de Género en el Servicio de Policía
100904	103753	E	dic-16	20-dic-16	(563.834,36)	USD	1	- 563.834,36	Transferido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103854	103157	E	nov-18		(899,86)	USD	1	- 899,86	Devolución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		"Pedagogía sobre el acuerdo de paz" ARTE DE VIVIR - Rep Col (REMANENTE)
103855	103753	E	dic-17	20-dic-16	206.000,00	USD	1	206.000,00	Transferido	002519	HANDICAP INTERNACIONAL	30000	TP	12641	MPTF			Minas I
103855	103753	E	dic-17	20-dic-16	254.921,91	USD	1	254.921,91	Transferido	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%	Act.1	Minas I
103855	103753	E	dic-16	20-dic-16	102.912,45	USD	1	102.912,45	Transferido	009512	Fun Restrepo B	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
104320	113002	E	ago-18	20-nov-18	2.753.923,00	USD	1	2.753.923,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-20	Víctimas
104321	112647	E	ago-18	19-oct-18	1.064.292,04	USD	1	1.064.292,04	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Manejo Conflict. y Sit. Human.
104321	112647	E	ago-18	n/a	484.692,00	USD	1	484.692,00	Transferido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
106246	106164	E	ago-18	18-sep-18	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	6 MESES	CEPDIPO
106741	103754	E	ago-18	20-nov-18	9.054,00	USD	1	9.054,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - CEPDIPO
106741	103754	E	jul-18	16-jul-18	53.491,00	USD	1	53.491,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - Alianzas para la Paz



Output	MPTF ID	R e v.	FECH A ESTIM ADA DE DEPO SITO	FECHA DEL DEPOSI TO	Valor Moneda Original	Mone da	Tasa Op.	USD	Estad o	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBR E FUENTE	DONAN TE	NOMBR E DONAN TE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
109324	109015	E	jul-18	31-jul-18	275.834,00	USD	1	275.834,00	PAGA DO	009517	Pastoral Social	30000	TP	12641	MPTF	3%	19/02/2020	Confianza y Paz (Adición)
104317	112644	F	ago-18	19-oct-18	381.692,00	USD	1	381.692,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
104317	112644	F	ago-18	19-oct-18	103.000,00	USD	1	103.000,00	PAGA DO	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad (Actividad 2)
104321	112647	F	ago-18	19-oct-18	- 484.692,00	USD	1	- 484.692,00	Transf erido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
106741	103754	F	nov-18	20-nov-18	58.863,00	USD	1	58.863,00	PAGA DO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - PDET
106741	103754	F	nov-18	20-nov-18	121.062,00	USD	1	121.062,00	PAGA DO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%		Direct Cost Budget - VÍCTIMAS
100904	101799	H	feb-19	14-mar-19	(23.810,91)	USD	1	- 23.810,91	Devol ución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		"Pedagogía sobre el acuerdo de paz"
104317	112644	H	ago-18	19-oct-18	271,04	USD	1	271,04	Transf erido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
104321	112647	H	ago-18	19-oct-18	- 271,04	USD	1	- 271,04	Transf erido	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
106246	106164	H	feb-19	12-feb-19	232.368,23	USD	1	232.368,23	PAGA DO	009518	Centro Pensamien to Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-19	CEPDIPO
106246	106164	H	feb-19		(0,23)	USD	1	- 0,23	Ajusta do	009518	Centro Pensamien to Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-19	CEPDIPO
103855	103753	I	jul-19		(0,63)	USD	1	- 0,63	Devol ución	002519	HANDICAP INTERNATI ONAL	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
103855	103753	I	jul-19		(14.639,17)	USD	1	- 14.639,17	Devolución	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
103855	103753	I	jul-19		(16.478,03)	USD	1	- 16.478,03	Devolución	009512	Fun Restrepo B	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas I
104318	106165	I	jul-19		(1,95)	USD	1	- 1,95	Devolución	002960	Save The Children	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñas
104318	106165	I	jul-19		(80.910,16)	USD	1	- 80.910,16	Devolución	009509	Fundación Plan	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñas
104318	106165	I	jul-19		(0,92)	USD	1	- 0,92	Devolución	009515	Aldeas Infantiles	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñas
104318	106165	I	jul-19		0,10	USD	1	0,10	Devolución	009516	Círculo de Obreros	30000	TP	12641	MPTF	3%		PREVENCIÓN RECLUTAMIENTO Niñas
104319	116693	I	jun-19	3-jul-19	717.756,00	USD	1	717.756,00	PAGADO	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	3-abr-20	CEPDIPO / CSIVI
117098	117684	J	sep-19	9-nov-19	2.060.000,00	USD	1	2.060.000,00	PAGADO	012117	PASO COLOMBIANA	30000	TP	12641	MPTF	3%		PNIS - Sustitución de cultivos de coca
104320	113002	K	nov-19	19-nov-19	18.879,00	USD	1	18.879,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-20	Víctimas (adición CITPAX)
106741	103754	K	abr-20	31-mar-21	26.260,00	USD	1	26.260,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-may-20	Direct Cost Budget - CEPDIPO3
106741	103754	K	abr-20	27-mar-20	43.667,00	USD	1	43.667,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-mar-20	Direct Cost Budget - PASO COLOMBIA
106741	103754	K	abr-20	27-mar-20	43.665,90	USD	1	43.665,90	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-ene-21	Direct Cost Budget - MINAS III
106741	103754	K	abr-20	27-mar-20	52.612,91	USD	1	52.612,91	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Blended Finance

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
119028	119013	K	dic-19	6-dic-19	618.000,00	USD	1	618.000,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	K	ene-20	24-mar-20	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	K	dic-19	6-dic-19	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	003331	MERCY CORPS 003831	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	K	dic-19	6-dic-19	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	012296	CORPOCA MPO	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	K	dic-19	6-dic-19	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	012297	ACUMEN	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	K	dic-19	6-dic-19	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGADO	012298	IC FUNDACION	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119336	119876	K	feb-20	3-feb-20	475.735,27	USD	1	475.735,27	PAGADO	002519	Humanity & Inclusion	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas III
119336	119876	K	feb-20	3-feb-20	616.124,27	USD	1	616.124,27	PAGADO	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas III
119336	119876	K	feb-20	3-feb-20	163.311,46	USD	1	163.311,46	PAGADO	009513	Halo Trust	30000	TP	12641	MPTF	3%		Minas III
104317	112644	L	ago-18	19-oct-18	- 1,04	USD	1	- 1,04	Ajuste a Cant	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
104320	113002	L	abr-20	3-jun-20	61.800,00	USD	1	61.800,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	30-jun-20	Víctimas (adición FLIP y ENS)
106246	106164	L	feb-19		0,23	USD	1	0,23	Ajuste a Cant	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-19	CEPDIPO
106741	103754	L	abr-20	27-mar-20	(52.612,91)	USD	1	- 52.612,91	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Blended Finance

Output	MPTF ID	R e v.	FECH A ESTIM ADA DE DEPO SITO	FECHA DEL DEPOSI TO	Valor Moneda Original	Mone da	Tasa Op.	USD	Estad o	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBR E FUENTE	DONAN TE	NOMBR E DONAN TE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
119028	119013	L	abr-20	27-mar-20	52.613,00	USD	1	52.613,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Blended Finance
119028	119013	L	dic-19	6-dic-19	(309.000,00)	USD	1	- 309.000,00	PAGA DO	003331	MERCY CORPS 003831	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	L	dic-19	6-dic-19	309.000,00	USD	1	309.000,00	PAGA DO	003831	MERCY CORPS 003831	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
120163	120640	L	mar-20	1-abr-20	1.436.924,00	USD	1	1.436.924,00	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	L	mar-20	1-abr-20	154.500,00	USD	1	<b>154.500,00</b>	PAGA DO	012118	CCJ	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Convocatoria líderes
120352	120641	L	mar-20	10-abr-20	306.612,04	USD	1	306.612,04	PAGA DO	003607	CERAC	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Secretaría Técnica CSIVI (CINEP/CERAC)
120352	120641	L	mar-20	10-abr-20	355.566,96	USD	1	355.566,96	PAGA DO	009508	CINEP	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Secretaría Técnica CSIVI (CINEP/CERAC)
104317	112644	L	may-20		(2.680,76)	USD	1	- 2.680,76	Devol ución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
104317	112644	L	may-20		(619,04)	USD	1	- 619,04	Devol ución	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad (Actividad 2)
104321	112647	L	may-20		(19.335,57)	USD	1	- 19.335,57	Devol ución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	1 AÑO	PDETS - Mejora Seguridad
106246	106164	L	abr-20		(194,92)	USD	1	- 194,92	Trasla do	009518	Centro Pensamien to Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-19	CEPDIPO Remanente para Direct Cost Budget (va para 106471)
107452	107397	L	may-20		(331,01)	USD	1	- 331,01	Devol ución	003607	CERAC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)
107452	107397	L	may-20		(396,82)	USD	1	- 396,82	Devol ución	009508	CINEP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica Notables (Cinep+Cerac)

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
107453	107715	L	may-20		(956,00)	USD	1	- 956,00	Devolución	009517	Pastoral Social/Kroc	30000	TP	12641	MPTF	3%		Barómetro (Kroc)
107748	108158	L	may-20		(56,93)	USD	1	- 56,93	Devolución	002519	HANDICAP INTERNACIONAL	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	L	may-20		(87,91)	USD	1	- 87,91	Devolución	009510	Campaña Colombiana a Minas	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
107748	108158	L	may-20		(50.138,15)	USD	1	- 50.138,15	Devolución	009513	Halo Trust	30000	TP	12641	MPTF	3%	18-dic-18	Minas II
106741	103754	L	abr-20		194,92	USD	1	194,92	Traslado	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-19	CEPDIPO Remanente para Direct Cost Budget (viene del output 103246)
121547	121873	M	may-20	29-may-20	504.700,00	USD	1	504.700,00	PAGADO	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Instancia Pueblos Étnicos
106741	103754	N	jun-20	3-jun-20	21.884,00	USD	1	21.884,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - CINEP/CERAC (II)
106741	103754	N	jun-20	3-jun-20	82.536,00	USD	1	82.536,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Líderes
106741	103754	N	jul-20	31-mar-21	16.079,00	USD	1	16.079,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - ONIC
123254	124710	N	oct-20	13-nov-20	103.000,00	USD	1	103.000,00	PAGADO	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Iniciativas comunitarias - Convivencia y Reconciliación
123254	124710	N	oct-20	13-nov-20	1.881.000,00	USD	1	1.881.000,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Iniciativas comunitarias - Convivencia y Reconciliación
104319	116693	N	jun-19	3-jul-19	- 0,50	USD	1	- 0,50	Traslado	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%	3-abr-20	CEPDIPO / CSIVI

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
106741	116693	N	jun-19	3-jul-19	0,50	USD	1	0,50	Traslado	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	3-abr-20	CEPDIPO / CSIVI Remanente
123255	125590	N	nov-20	22-ene-21	2.060.000,00	USD	1	2.060.000,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Acceso Sistemas de Justicia
123943	125589	N	nov-20	21-ene-21	515.000,00	USD	1	515.000,00	Pendiente	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%		Apoyo Comisión Acuerdo Final
123254	124710	O	oct-20	13-nov-20	498,00	USD	1	498,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Iniciativas comunitarias - Convivencia y Reconciliación
104320	113002	O	N/A	n/a	(76.015,24)	USD	1	- 76.015,24	Devolución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	31-mar-20	Víctimas
123255	125590	O	nov-20	22-ene-21	81.158,00	USD	1	81.158,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Acceso Sistemas de Justicia
123255	125590	O	nov-20	22-ene-21	(303.767,60)	USD	1	- 303.767,60	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Acceso Sistemas de Justicia
123255	125590	O	nov-20	22-ene-21	149.267,60	USD	1	149.267,60	PAGADO	013471	ACIN	30000	TP	12641	MPTF	3%		Acceso Sistemas de Justicia
123255	125590	O	nov-20	22-ene-21	154.500,00	USD	1	154.500,00	PAGADO	012118	CCJ	30000	TP	12641	MPTF	3%		Acceso Sistemas de Justicia
106741	103754	Q	mar-21	31-mar-21	60.722,00	USD	1	60.722,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Reconciliación
106741	103754	Q	mar-21	31-mar-21	9.352,00	USD	1	9.352,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - CEPDIPO4 (2021)
106741	103754	Q	mar-21	31-mar-21	64.543,00	USD	1	64.543,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - VÍCTIMAS II
120163	120640	Q	oct-21		216.180,52	USD	1	216.180,52	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	10 meses	Convocatoria líderes

Output	MPTF ID	R e v.	FECH A ESTIM ADA DE DEPO SITO	FECHA DEL DEPOSI TO	Valor Moneda Original	Mone da	Tasa Op.	USD	Estad o	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBR E FUENTE	DONAN TE	NOMBR E DONAN TE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
120163	120640	Q	oct-21		72.100,00	USD	1	72.100,00	PAGA DO	012118	CCJ	30000	TP	12641	MPTF	3%	6 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	Q	oct-21		62.477,74	USD	1	62.477,74	PAGA DO	013471	ACIN	30000	TP	12641	MPTF	3%	6 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	Q	oct-21		72.100,00	USD	1	72.100,00	PAGA DO	014171	ANZORC	30000	TP	12641	MPTF	3%	7 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	Q	oct-21		72.100,00	USD	1	72.100,00	PAGA DO	014172	RUTA PACIFICA	30000	TP	12641	MPTF	3%	9 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	Q	oct-21		72.100,00	USD	1	72.100,00	PAGA DO	014173	CODHES	30000	TP	12641	MPTF	3%	4 meses	Convocatoria líderes
120163	120640	Q	oct-21		72.045,41	USD	1	72.045,41	PAGA DO	014174	OFB	30000	TP	12641	MPTF	3%	6 meses	Convocatoria líderes
128634	128986	Q	oct-21		606.494,00	USD	1	606.494,00	PAGA DO	009517	Pastoral Social	30000	TP	12641	MPTF	3%	18 meses	Barómetro II
120163	120640	S	mar- 20	1-abr-20	(5.086,67)	USD	1	- 5.086,67	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Convocatoria líderes
131450	131602	T	may- 22	27-abr- 22	2.035.811,11	USD	1	2.035.811,11	PAGA DO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II
131450	131602	T	may- 22	27-abr- 22	154.500,00	USD	1	154.500,00	PAGA DO	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II
131450	131602	T	may- 22	27-abr- 22	146.579,30	USD	1	146.579,30	PAGA DO	010655	ALIANZA PARA LA PAZ ONG	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II
131450	131602	T	may- 22	27-abr- 22	154.286,79	USD	1	154.286,79	PAGA DO	011515	SISMA MUJER	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II
131450	131602	T	may- 22	27-abr- 22	144.200,00	USD	1	144.200,00	PAGA DO	012218	CORSOC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II

Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
131450	131602	T	may-22	27-abr-22	154.458,80	USD	1	154.458,80	PAGADO	014707	CREDHOS	30000	TP	12641	MPTF	3%		Defensores II
131451		T			800.000,00	USD	1	800.000,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Participación en Proceso de Búsqueda
131452	133396	T	sep-22	27-sep-22	1.634.383,00	USD	1	1.634.383,00	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	T	sep-22	n/a	(34.383,00)	USD	1	- 34.383,00	Por ajustar	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
119028	119013	T			76.220,00	USD	1	76.220,00	Pendiente	012298	IC FUNDACION	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
119028	119013	T			61.800,00	USD	1	61.800,00	Pendiente	012296	CORPOCA MPO	30000	TP	12641	MPTF	3%		Blended Finance
120352	120641	T	may-22	11-may-22	109.147,04	USD	1	109.147,04	PAGADO	009508	CINEP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Secretaría Técnica CSIVI (CINEP/CERAC)
120352	120641	T	may-22	11-may-22	107.544,36	USD	1	107.544,36	PAGADO	003607	CERAC	30000	TP	12641	MPTF	3%	12 meses	Secretaría Técnica CSIVI (CINEP/CERAC)
121547	121873	T	jul-22	25-jul-22	262.428,55	USD	1	262.428,55	PAGADO	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Instancia Pueblos Étnicos
123943	125589	T			(27.080,38)	USD	1	- 27.080,38	Devolución	009518	Centro Pensamiento Dialógico	30000	TP	12641	MPTF	3%		Apoyo Comisión Acuerdo Final
131834	132577	U	jul-22	14-jul-22	1.081.500,00	USD	1	1.081.500,00	Pagado	014894	Humanicemos	30000	TP	12641	MPTF	3%		Humanicemos
106741	128986	V	jul-22	25-jul-22	12.565,00	USD	1	12.565,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Barómetro II
106741	131602	V	jul-22	25-jul-22	132.726,00	USD	1	132.726,00	PAGADO	001981	UNDP	11100	DCB	12641	MPTF	3%	31-dic-21	Direct Cost Budget - Líderes Defensores II



Output	MPTF ID	R e v.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda Original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	NOMBRE AG. IMPL.	FUENTE	NOMBRE FUENTE	DONANTE	NOMBRE DONANTE	GMS	VIGENCIA	OBSERVACIONES
132755	133048	V	ago-22	30-ago-22	254.937,36	USD	1	254.937,36	PAGADO	009518	CEPDIPO	30000	TP	12641	MPTF	3%		Fort CSIVI-Comunes
132755	133048	W	ago-22	30-ago-22	(0,36)	USD	1	- 0,36	Ajuste a Cant	009518	CEPDIPO	30000	TP	12641	MPTF	3%		Fort CSIVI-Comunes
131452	133396	W	sep-22	n/a	34.383,00	USD	1	34.383,00	Ajuste a Cant	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	102.811,51	USD	1	102.811,51	PAGADO	013471	ACIN	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	97.850,00	USD	1	97.850,00	PAGADO	015222	ASOM	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	102.737,35	USD	1	102.737,35	PAGADO	015224	AWA TORTUGA ÑA	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	87.550,00	USD	1	87.550,00	PAGADO	015229	HOMBRES EN MARCHA	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	103.000,00	USD	1	103.000,00	PAGADO	014174	OFB	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	101.558,00	USD	1	101.558,00	PAGADO	015223	VIVA LA CIUDADANIA	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
131452	133396	W	sep-22	27-sep-22	(595.506,86)	USD	1	- 595.506,86	PAGADO	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Legado Comisión de la Verdad (CEV)
123254	124710	W	oct-20		(2.291,01)	USD	1	- 2.291,01	Devolución	009972	ONIC	30000	TP	12641	MPTF	3%		Iniciativas comunitarias - Convivencia y Reconciliación
123254	124710	W	oct-20		(39.614,65)	USD	1	- 39.614,65	Devolución	001981	UNDP	30000	TP	12641	MPTF	3%		Iniciativas comunitarias - Convivencia y Reconciliación

Listado Organizaciones de la Sociedad Civil que participan de proyectos en la Ventana de Sociedad Civil

Listado OSC / Partes Responsables
ACIN
ACUMEN
ALIANZA PARA LA PAZ
ANZORC
ASOM
AWA TORTUGAÑA
BAROMETRO
CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS
CCJ
CEPDIPO
CERAC
CINEP
CODHES
CORPOCAMPO
CORSOC
CREDHOS
HALO TRUST
HOMBRES EN MARCHA
HUMANICEMOS
HUMANITY & INCLUSION
IC FUNDACION
MERCY CORPS
OFB
ONE EARTH FUTURE FOUNDATION-PASO COLOMBIA
ONIC
RUTA PACIFICA
SISMA MUJER
VIVA LA CIUDADANIA
AYUDA POPULAR NORUEGA
FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO
ATEXX
PERIGEO
ALDEAS INFANTILES
CIRCULO DE OBREROS
FUNDACION PLAN
SAVE THE CHILDREN
CINEP
CERAC

Listado OSC / Acuerdos de Subvención de Bajo Valor
2ORILLAS
3 CABILDOS INDIGENAS (NASA)
5TA CON 5TA CREW
ACCION CULTURAL POPULAR
ACIMVIP
ACIN
ANMUCIC
ANZORC
AREDMAG
ASMUPROPAZ
ASOCOLEMAD
ASODECAS
ASOM
ASOPEP
ASOPUINAVE
AWÁ TORTUGANA
CAHUCOPANA
CAMPOGUAVIARE
CANTOYACO
CARIBE AFIRMATIVO
CCAJAR
CEPAC
CIER
CINCCO
CINDE
CIRCULO DE ESTUDIOS
CITPAX
CODHES
COHARPEP
COLECTIVO OFB
CONTRAVIA
CORPOAYARI
CORPOMANIGUA
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ MAGDALENA MEDIO
CORPORACION REGION
CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA
CORPORACION YIRA CASTRO
CREDHOS
CREER
DEJUSTICIA
DH COLOMBIA
E. COMUN JAIME PARDO
EDUCAR ORINOQUIA
ESCUELA NACIONAL SINDICAL
FENALPER
FUN FRATERNIDAD
FUNDACION CONCERN UNIVERSAL
FUNDACION FRANCISCANA
FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA - FLIP
FUNDACION PARA LA RECONCILIACIÓN
FUNDACION PROACTO
FUNDACION PROGRESAR NORTE SANTANDER
FUNDACION PROLONGAR
FUNDECOS
FUNDEURCA
HOMBRES EN MARCHA
HUMANAS
IELCO

Listado OSC / Acuerdos de Subvención de Bajo Valor
IMP - CORPORACION ALINZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ
ISAIAS DUARTE CANCINO
KANKUAMO
KUSUTO
LIMPAL
MALEUA
MOE
MONTES MARÍA
MOVICE
OFB
PANURE
PASTORAL SOCIAL APARTADÓ
PASTORAL SURORIENTE
PLATAFORMA SUR
PROYECTAMOS
PROYECTO NASA
RED CAQUETA
RED CHAPARRAL
REDEPAZ
RUTA PACIFICA
SIDOC
SISMA MUJER
TIEMPO DE MUJERES
U SABANA
U TECNOLOGICA DEL BOLIVAR
U. JAVERIANA
UBP BUCARAMANGA
UNIPA
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
ASOFAVIDA
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS - CSPP (En representación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE)
CORPORACION JURIDICA LIBERAL-CJL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL
ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPAR

Acta PAC – Extensión a 2021

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
PAC

Fecha del Comité: 15 de julio de 2019	
Presencial: X	Virtual:

<p><b>Proyecto No.:</b> No. 97044 <b>Título:</b> Ventana No Gubernamental - Agente de Gestión Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz <b>Fecha Inicio:</b> 1 de agosto 2016 – Fecha fin: 31 diciembre 2019 <b>Nombre de la agencia de ejecución:</b> PNUD <b>Modalidad de Ejecución:</b> DIM</p> <p><b>CPD</b> 3. Pronta recuperación y regreso rápido a vías sostenibles de desarrollo en situaciones posteriores a conflictos y desastres (Paz &amp; Conflictividades)</p> <p><b>UNDAF</b> En el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 2015 – 2019 (UNDAF por sus siglas en inglés) busca consolidar el papel del SNU en torno a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto por la equidad para el período 2018 – 2022, concentrándose en dos áreas de resultados que se refuerzan mutuamente: <i>construcción de paz y desarrollo sostenible</i>.</p> <p>El Secretario General en su Informe sobre Consolidación y Sostenimiento de la Paz sugiere que por la magnitud y la naturaleza del reto que entraña sostener la paz también exige crear alianzas estratégicas y operacionales más estrechas entre los Gobiernos nacionales, las Naciones Unidas y otros interesados clave, como las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de mujeres, las organizaciones de jóvenes y el sector privado, que tengan en cuenta las prioridades y políticas nacionales.</p> <p><b>Presupuesto total del Proyecto:</b> <u>USD\$ 35.000.000</u> <b>Monto Total de Financiamiento aprobado Fase I 2016-2019:</b> <u>USD\$20.000.000</u> <b>Monto Total no financiado incluye Fase II 2019-2021:</b> <u>USD\$15.000.000</u></p> <p><b>Objetivo de la Presentación:</b> Se solicita aprobación de la extensión del proyecto 97044 hasta el 31 de diciembre de 2021 y la modificación del presupuesto establecido en el PRODOC, incorporando USD\$ 15.000.000 adicionales, para un presupuesto total de USD\$ 35.000.000, de acuerdo a la aprobación de la Segunda Fase del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, según el acta del Comité Directivo del 6 de diciembre de 2018.</p> <p><b>Nueva fecha de terminación:</b> diciembre 31/ 2021 <b>Funcionario que solicita el análisis del PAC:</b> Juliana Correa <b>Funcionario Responsable del Acuerdo:</b> Verónica Ríos <b>Contraparte/Donante:</b> Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz</p>
--

**Justificación:**

El proyecto tiene pertinencia ya que, se aprobó la segunda fase del fondo, incluyendo al PNUD como Agente de Gestión de la Ventana de Sociedad Civil y Sector Privado hace parte integral de la implementación.

Esta arquitectura permite recibir recursos del Fondo que serán administrados por el PNUD a través de la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con los reglamentos, normas, directivas y procedimientos.

Las entidades no-gubernamentales deberán disponer de capacidad operativa para la implementación inmediata de proyectos que sean aprobados por el Comité Directivo del Fondo, respondiendo a necesidades urgentes del mecanismo.

Para la realización de las tareas y las responsabilidades del Agente de Gestión se cobrará un máximo de 3% de costos indirectos (GMS); según se requiera, se podrá cargar al Fondo costes directos específicos de cada proyecto. Los costes directos se calcularán en función del volumen de trabajo requerido para cada entidad implementadora.

Se entiende que los costes directos disminuirán gradualmente, a medida que las entidades implementadoras demuestren sus capacidades de implementación, así como el cumplimiento de sus responsabilidades programáticas y financieras.

Las convocatorias y proyectos que se aprueben a través del agente de gestión estarán enmarcados en los siguientes 4 ámbitos:

Ámbitos	Actividades específicas
<p><b><u>Ámbito Estabilización</u></b></p> <p>Este ámbito apunta a fortalecer la presencia y capacidad estatal en los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de cerrar brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad en estos territorios.</p>	<p>Apoyar procesos de rehabilitación económica de los territorios PDET, a través de intervenciones integrales que generen mercados transparentes y accesibles y a la vez cohesión social y territorial, permitiendo la participación activa de la ciudadanía y la transformación pacífica de los conflictos.</p>
<p><b><u>Ámbito Reincorporación</u></b></p> <p>Este ámbito responde a la necesidad de implementar acciones que promuevan, como fundamento de la paz territorial la coexistencia, la convivencia, la reconciliación y la no estigmatización hacia la generación y el fortalecimiento de la confianza, en aras de consolidar las bases para romper de una vez y para siempre cualquier vínculo entre política y violencia, a través de la reincorporación social, económica y productiva de los excombatientes con enfoque comunitario, con particular énfasis en las 16 regiones con PATR.</p>	<p>Desarrollar proyectos de reincorporación con enfoque comunitario que permita fortalecer lazos entre la población excombatiente y las comunidades de acogida en términos de desarrollo económico local y cohesión social. Generar proyectos de reincorporación con enfoque de género que permitan empoderar a las mujeres excombatientes y a sus familias en su ruta de reincorporación a la vida civil.</p>
<p><b><u>Ámbito Víctimas</u></b></p> <p>Este ámbito responde al compromiso de brindar una reparación integral y dar un tratamiento especial a las víctimas en la estabilización de los territorios PDET.</p>	<p>Apoyar al proceso de reparación a víctimas en particular los procesos de reparación colectiva en paralelo a las nuevas acciones de justicia transicional generando mejores condiciones para la no repetición y la reconciliación en Colombia.</p>

### Ámbito Comunicación

Este ámbito responde a la necesidad de hacer un seguimiento permanente y de comunicar de manera eficaz los avances del proceso de estabilización a los actores involucrados, a la opinión pública, y a la comunidad internacional. De manera específica, bajo este ámbito se busca

Comunicar de forma eficaz y transparente los avances en la implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación.

### Descripción de Actividades:

La incorporación del presupuesto está estructurado con fundamento en los documentos que soportan los nuevos términos de referencia aprobados, actas comité de dirección, convocatorias y proyectos, así la información compartida por la Secretaría Técnica del Fondo:

### PIPELINE 10 MILLONES DE DOLARES



ÁMBITO	TEMA/ACTIVIDAD	LOGAR	MECANISMO	MONTO TENTATIVO
ESTABILIZACIÓN	Protección a líderes y defensores/as DDHH	5 PATRS	VENTANA SC	1,5 M
REINCORPORACIÓN	Formación y acompañamiento psicosocial	170 POET	VENTANA SC	2 M
VÍCTIMAS Y JUSTICIA TRANSICIONAL	Acceso víctimas al SIVJRNR	170 POET	VENTANA SC – VENTANA ONU	2 M
	Territorialización SIVJRNR / Pedagogía	170 POET	VENTANA SC – VENTANA ONU	2 M
COMUNICACIÓN	Pedagogía y avance implementación	NACIONAL	VENTANA SC	0,5 M
	Prevención y medios rurales	NACIONAL	VENTANA SC	0,5 M

\* Desminado Humanitario USD\$ 1.500.000

Con este insumo, se realizó la siguiente proyección:

Ámbitos	Convocatorias	Montos tentativos
Fase I	Montos por formalizar	USD\$ 3.155.427
Estabilización	Protección a líderes y defensores/as DDHH	USD\$ 1.500.000
	Desminado Humanitario	USD\$ 1.500.000
Reincorporación	Formación y acompañamiento psicosocial	USD\$ 2.000.000
	Fundación Paso por Colombia	USD\$ 2.000.000
Víctimas y Justicia	Acceso víctimas al SIVJRNR	USD\$ 1.000.000
	Territorialización SIVJRNR	USD\$ 1.000.000
Comunicación	Pedagogía y avance de la implementación	USD\$ 500.000
	Prevención y medios locales	USD\$ 500.000
	Centro de Pensamiento y Dialogo Político	USD\$ 700.000
TOTAL 2019		USD\$ 6.200.000
TOTAL 2020		USD\$ 4.500.000
GMS 3%		USD\$ 450.000
Recuperación costos directos (estimado)		USD\$ 694.573
GRAN TOTAL		USD\$ 15.000.000

Se está realizando el ajuste de los cambios a lo largo del documento PRODOC y al AWP. Se aclara que, en el AWP, se crean todas las actividades listadas anteriormente, y aunque la adición será por un total de USD\$ 15.000.000, se planeará solamente los valores y convocatorias que ya están pactadas por un valor de USD\$ 8.000.000.

**Estrategia de monitoreo, Auditoria e investigaciones:**

- Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante
- Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo
- Informe finales y anuales de proyecto
- Todos los pagos realizados por el PNUD bajo el Acuerdo de Parte Responsable y/o Enmiendas estarán sujetos a una auditoria por auditores internos o externos del PNUD o por otros agentes autorizados y calificados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del Acuerdo y durante un periodo de cinco (5) años posteriores a la finalización de las actividades o la terminación del presente Acuerdo y/o enmiendas.

**Riesgos de la adición/proyecto:**

**Análisis de Riesgos:**

El objetivo final de una estrategia de gestión de riesgos a nivel del Fondo es facilitar el alcance de los objetivos programáticos de las intervenciones del mismo, en el contexto del riesgo en el que se opera. Todos los programas o proyectos aprobados por el Fondo tendrán que tener una estrategia de gestión de riesgos. La estrategia debe garantizar que se cumpla con la multiplicidad de necesidades y expectativas de las principales partes interesadas.

- **Tiempo de ejecución del acuerdo**  
**Mitigación:** Seguimiento y acompañamiento permanente por parte del equipo para identificar los cuellos de botella de manera oportuna con el fin de implementar las acciones correctivas del caso.
- **Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio.**  
**Mitigación:** Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se requieran para el logro de los resultados planteados.
- **Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio.**  
**Mitigación:** Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el marco del comité técnico constituido por el PNUD.
- **La indefinición de políticas claras por parte del Gobierno Nacional en temas relacionados con paz puede generar demoras en el marco del avance de los proyectos de reincorporación que se desarrollen desde la cooperación internacional.**  
**Mitigación:** el avance en la implementación de los acuerdos, y la articulación con diferentes estrategias de reincorporación económica, política y social pueden disminuir el riesgo de la falta de definición de políticas en tema de reincorporación, así como el seguimiento al rol de acompañantes del punto 3.
- **El contexto de violencia e inseguridad en algunos territorios puede impactar negativamente el desarrollo de diferentes proyectos en términos de titulación de tierras y reincorporación.**  
**Mitigación:** un constante desarrollo de análisis de ASD y sensibilidad al conflicto, además del cumplimiento de estrategias de protección y autoprotección.

**Entidades/Socios involucrados:** Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz

**Direct Project Costing (DPC):** Se contempló el cobro máximo del 4 % Costos directos y 3% de GMS



<p><b>Territorio(s) de Intervención:</b> Nacional</p> <p><b>Consideraciones operativas:</b> Manual de operaciones de la Ventana No Gubernamental.</p> <p><b>Otros comentarios importantes para el PAC</b></p>
<p><b>Comentarios del PAC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Asegurar los ajustes al presupuesto según las estimaciones presentadas</b> R/ Actualmente se están realizando los ajustes y se verán reflejados en la revisión presupuestal.</li> <li>• <b>Proceder con el cierre de los outputs que ya finalizaron</b> R/ Se están implementando las acciones correspondientes, al momento están cerrados operacionalmente dos proyectos y tres están en proceso de cierre.</li> <li>• <b>Importante resaltar las lecciones aprendidas de la fase previa de la ventana, para asegurar su aplicabilidad en la nueva fase.</b> R/ Desde el equipo de la Ventana se está avanzando en la sistematización y en la estrategia de gestión de conocimiento, buenas prácticas y un esquema aprendizajes tempranos. Así mismo, se está preparando la evaluación de medio término, que se espera arroje aspectos relevantes para avanzar en la generación de un modelo de gestión.</li> <li>• <b>Potencializar las convocatorias y las OSC que se vinculan por la ventana, con el accionar programático y territorial de la oficina.</b> R/ Se atenderá la recomendación, y se buscará poner a disposición de la oficina a nivel nacional y territorial. A lo largo de la implementación de la primera fase, se evidencio la oportunidad de reforzar y materializar los enfoques transversales en cada una de las intervenciones, así como brindar insumos para robustecer las discusiones técnicas y académicas.</li> <li>• <b>En negociación de costos directos involucrar recursos para el tema de seguimiento y monitoreo. Tener en cuenta la experiencia previa con víctimas.</b> R/ En el rol de Agente de Gestión, se tiene la responsabilidad de proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, monitoreo y administración de auditorías, creación de capacidades, rendición de cuentas de los fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados. En la negociación, se cargará al presupuesto de las propuestas aprobadas para cada organización los costos directos relacionados con las responsabilidades establecidas para el Agente de Gestión.</li> <li>• <b>Acompañamiento al MPTF en convocatorias.</b> R/ Existe total disposición de acompañamiento a lo largo de todo el ciclo de las convocatorias, en tanto sea solicitada por la Secretaria Técnica del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz.</li> </ul>

- Buscar canal de información de apoyo por parte de territorios cuando aplique.

R/ Se asume el compromiso que, en el marco de las reuniones de alistamiento para la implementación de los proyectos, se establezca el tipo de requerimientos y posibilidades de apoyo en los territorios y el tipo de información requerida.

- Ver si es viable el seguimiento y apoyo en monitoreo a nivel territorial para optimización de costos.

R/ En el caso que sea posible, se atenderá la recomendación, sin embargo, la estrategia de optimización de costos de monitoreo usualmente se coordina con la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante.

Miembros del PAC: Ver listado asistencia



Daniel Vargas

Presidente del PAC

Fecha:

DD

## Revisión T – Extensión a 2024

DocuSign Envelope ID: 2C99D3B5-3F89-4EFD-8A52-0836D265BFBC



### PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO GOBIERNO DE COLOMBIA Presupuesto del Proyecto

Award: 00097044  
Título del Programa: "Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de la Paz y la Estrategia de Respuesta Rápida"

Outputs: 100904, 103854, 103855, 104317, 104318, 104319, 104320, 104321, 106246, 106741, 107452, 107453, 107748, 109324, 110356, 117098, 119028, 119336, 120163, 120352, 121547, 123254, 123255, 123943, 128634, 131450, 131451, 131452




Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	ACTUAL Rev. T MAY/22	ANTERIOR Rev. S 11/MAR/22	VARIACIÓN
<b>PNUD</b>			
01-UNDP-IPF/TRAC - (Trac 1.1)	-	-	-
BCPR / CPR TTF	-	-	-
	-	-	-
<b>Costos compartidos</b>			
MPTF (Fondo 30000)	41,013,490.96	35,401,941.88	5,611,549.10
MPTF (Fondo 11100)	1,126,650.14	1,126,650.14	-
<b>SUBTOTAL DE INSUMOS</b>	<b>42,140,141.10</b>	<b>36,528,592.01</b>	<b>5,611,549.10</b>
Recup. Costos Ind. - MPTF - 3% (F:30000)	1,230,404.73	1,062,058.26	168,346.47
Recup. Costos Ind. - MPTF - 3% (F:11100)	33,799.50	33,799.50	-
<b>SUBTOTAL DE GMS</b>	<b>1,264,204.23</b>	<b>1,095,857.76</b>	<b>168,346.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43,404,345.34</b>	<b>37,624,449.77</b>	<b>5,779,895.57</b>

#### Breve Descripción:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de diciembre de 2024 para cumplir con las actividades programadas, de acuerdo con Acta del MPTF del 21 de septiembre de 2021 (adjunta).
2. Ajustar el Plan de Trabajo Plurianual (Annual Work Plan 2022 y 2023) con base en el gasto en que incurrió el proyecto durante el año 2021 reflejado en el CDR oficial para dicha vigencia (adjunto).
3. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$138,020.00 (Output:00119028; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: Varios), correspondiente a la iniciativa "Blended Finance" (MPTF-ID 119013), para ser implementados por las siguientes Partes Responsables:  
IC FUNDACION (012298): USD\$ 78,220.00 (Output 00119028)  
CORPOCAMPO (012296): USD\$ 61,800.00 (Output 00119028)
4. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$216,691.40 (Output:00120352; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: Varios), correspondiente a la Convocatoria "Secretaría Técnica de CSIV" (MPTF-120641) iniciativas en curso, para ser implementados por las siguientes Partes Responsables:  
CINEP (009508): USD\$ 109,147.04 (Output 00120352)  
CERAC (003607): USD\$ 107,544.36 (Output 00120352)
5. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$262,428.55 (Output:00121547; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: Varios), correspondiente a la "Instancia Pueblos Étnicos - Hacer seguimiento de la implementación del Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación, a través de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos." (MPTF-121873), para ser implementado la ONIC (009972).
6. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$2,789,836.00 (Output:00131450; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: Varios), correspondiente a la "Defensores II" desarrolladas por organizaciones de la sociedad Civil que promuevan la prevención, protección y autoprotección de defensores/as de Derechos Humanos, líderes/as sociales y comunitarios, incluidos líderes/as ambientales, líderes/as de procesos de restitución de tierras (MPTF-ID 00131602), para ser implementados por las siguientes Partes Responsables:  
PNUD (001981): USD\$ 2,035,811.11  
ONIC (009972): USD\$ 154,500.00  
ALIANZA PAZ (010655): USD\$ 146,579.30  
CORSOC (012218): USD\$ 144,200.00  
SISMA MUJER (011515): USD\$ 154,286.79  
CREDHOS (014707): USD\$ 154,458.80
7. Por lo anterior, modificar el Marco de Resultados creando el output 00131450 - "Defensores II".
8. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$800,000.00 (Output:131451; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: 001981), correspondiente a "Grupos Motor" desarrolladas por organizaciones de la sociedad Civil para fortalecer la composición, construcción de confianza, trabajo colaborativo, cohesión social, funcionamiento y posicionamiento territorial de los Grupos Motor de tres (3) subregiones POET (Pacífico Nariense, Catatumbo y Chocó) (MPTF-ID por definir).
9. Por lo anterior, modificar el Marco de Resultados creando el output 00131451 - "Grupos Motor".
10. Incorporar al valor total del proyecto la suma de USD\$1,600,000.00 (Output:131452; F:30000; D:12641; GMS:3%; AI: 001981), correspondiente al "Legado Comisión de la Verdad" desarrolladas por organizaciones de la sociedad Civil que fortalezcan el trabajo de aliados de la sociedad civil para preparar la recepción, difusión, apropiación y la sostenibilidad del Legado que la Comisión de la Verdad (MPTF-ID por definir).
11. Por lo anterior, modificar el Marco de Resultados creando el output 00131452 - "Legado Comisión de la Verdad".

DocuSign Envelope ID: 2C99D3B5-3F89-4EFD-8A52-0836D265BFBC

12. Dar por concluidas oficialmente las actividades del output 00123943 y dar CIERRE OPERACIONAL al mismo.
13. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD\$27.080,38 de presupuesto y caja (Output: 00123943; F:30000; D:12641, AI: 009815) correspondientes a recursos remanentes no utilizados ni comprometidos de la iniciativa "Apoyo Comisión Acuerdo Final" (MPTF-125589), para ser devueltos al MPTF de acuerdo con instrucciones adjuntas, así como reflejar los gastos reales en que incurrió el proyecto en USD\$ 487.919,62.
14. Dar por concluidas oficialmente las actividades del output 00117098 y dar CIERRE OPERACIONAL y FINANCIERO al mismo, así como reflejar los gastos reales en que incurrió el proyecto en USD\$2.060.000,00.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
  PNUD	 167D6562D44041D	18-May-2022	Sara Ferrer Olivella, Representante Residente
