

## Révision substantive du document de projet

**Titre du projet :** Projet relèvement Post-catastrophe

**Numéro du projet :** 0099905

**Partenaires de mise en œuvre :** PNUD

**Date de début :** 3 novembre 2016 **Date de fin :** 24 juin 2024

**Date de réunion PAC :** 3 octobre 2017

**Année de la révision :** 2022

### Brève description du projet

Le projet de relèvement Post-Catastrophe vise à soutenir le relèvement à long terme, la résilience aux chocs futurs et le développement durable, tout en répondant aux besoins immédiats de la population touchés par les catastrophes naturelles. Afin d'atteindre les résultats attendus, le projet soutient le renforcement de la connaissance approfondie des risques et de la vulnérabilité du territoire en tant qu'outil d'aide à la décision pour orienter les efforts de relèvement et de développement, tout en faisant le lien entre l'humanitaire et le développement.

Il renforce ainsi la gouvernance en privilégiant les capacités nationales et locales en matière de planification, de coordination et de mise en œuvre liées aux efforts de relèvement. Le projet appuie également la restauration des moyens de subsistance par la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi, de la réhabilitation des infrastructures communautaires, ainsi que la mise en place de formations pour la génération de revenus à court, moyen et long terme. Le projet favorise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la restauration et la préservation de l'environnement en tant qu'objectifs clés pour « reconstruire en mieux » Haïti. Chaque activité a été définie pour contribuer à ces objectifs. Le projet répondra aussi au résultat stratégique 5 u Plan stratégique du PNUD 2017-2021, en particulier les produits 5.5 et 3.1 relatifs au Programme de pays pour Haïti et sera réalisé à travers les produits suivants :

- ✓ Produit 1 : la durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'Etat en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.
- ✓ Produit 2 : L'atomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.

- ✓ **Produit 3 :** Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.

Le projet fera l'objet d'une modalité de mise en œuvre directe, exécutée par le bureau de pays du PNUD en Haïti. La durée du projet s'étendra de novembre 2016 à décembre 2023. La réalisation des activités du projet sera conduite de manière séquentielle selon les zones géographiques et échelonnée en fonction de la disponibilité du financement.

<p><b>Effet auquel contribue le projet (PNUAD/DPP) :</b> Réalisation 5 du descriptif de programme de pays- Les institutions nationales, régionales et locales, et la société civile, améliorent la gestion de l'espace rural et urbain, de l'agriculture et de l'environnement, et les mécanismes de prévention et de réduction des risques pour améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et au changement climatique.</p> <p><b>Produit(s) indicatif(s) et marqueur de genre :</b> Produit 5.5 du descriptif de programme pays- Cadres politiques et mécanismes institutionnels mis en place aux niveaux nationaux et sous nationaux pour la gestion pacifique des conflits et des tensions émergentes et récurrentes.</p> <p>Produit 3.1 du descriptif de programme pays- Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles et la prévention et la gestion des risques</p>	<b>Total des ressources nécessaires :</b>	<b>30,272,145.00 USD</b>
	<b>Ressources mobilisées</b>	
	PNUD Trac-1 et TRAC-3	Trac 1: 1,566,846 Trac 3: 150,000.00 USD
	Funding windows- Financement du PNUD:	750,000.00 USD
	Japon	500,000.00 USD
	Nouvelle-Zélande	178,063.00 (250,000 NZD)
	Maurice	200,000.00 USD
	Onu Femmes	60,000.00 USD
	Gouvernement FAES	1,995,000 USD
	PAM	539,697.00 (2017) 277,639.00 (2018)
	Digital Good	18,000.00 USD
	Canada	8,065,035.24 USD (10,150,000 CAD) 2,991,060, 00 USD (4,000,000.00 CAD) <sup>1</sup>
	Corée (KOICA) <sup>2</sup>	2480578,00 USD
Norvège <sup>3</sup>	3,500,746.00 USD (27,000,000 NOK)	

<sup>1</sup> Dédié à la mise en œuvre des actions en réponse au tremblement de terre du 14 Aout 2021

<sup>2</sup> Dédié à la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées internes de la localité de Lahaie.

<sup>3</sup> Dédié au renforcement de la prévention des risques naturels et de la gouvernance territoriale dans le département du sud

### Justification de la révision substantive

Ce projet a reçu une contribution financière de la part du CANADA qui permettra la mise en œuvre des activités, au profit des communautés des communes de Pestel, Corail, Beaumont, Camp Perin, Iles Cayemites et Roseaux affectées par le séisme du 14 Aout 2021, qui vont nécessiter une extension de la durée du projet. A cet effet, une révision substantive du document de projet s'avère essentielle.



Les fonds disponibles à date demeurent toujours en dessous des besoins prévus dans le document de projet et ne permettront pas la mise en œuvre des activités planifiées. De plus, comme il a été mentionné dans le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud, les besoins relatifs aux axes stratégiques et secteurs concernées par les interventions du PNUD restent non-couvert.

### Elément de la révision substantive

La révision substantive proposée inclut les éléments suivants :

- ✓ L'ajout d'une nouvelle contribution de la part du gouvernement du Canada pour un montant de 2,991,060.00 USD ;
- ✓ Une extension de la durée du projet jusqu'au 30 Juin 2024 ;
- ✓ La nouvelle priorisation des activités sur le financement acquis et la répartition qui en découle, jusqu'au 30 Juin 2024 (Cf. Annexe 1)

Lu et approuvé par (signatures) :

Programme des Nations Unies pour le développement	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
 Fernando Hiraldo Représentant Résident	RICARD PIERRE Ministre 
Date : 22 juin 2022	Date : 22/06/2022

Annexe 1 : Note de proposition d'actions et d'orientation des interventions Post Séisme

Annexe 2 : Plan de travail pluriannuel

Annexe 3 : Le budget de mise en œuvre des activités



Canada



## Projet Relèvement PostCatastrophe

# Réponse au Tremblement de terre du 14 Aout 2021

*Note de proposition d'actions et d'orientation des interventions Post  
Seisme*

Financé par la Coopération Canadienne

Septembre 2020

## Table des Matières

I. Mise en contexte .....	3
II. Justification de la proposition.....	4
III. Objectifs de cette intervention .....	5
IV. Axes d'intervention .....	5
V. Egalite hommes-femmes .....	5
VI. Environnement et résilience .....	6
VII. Leçons apprises.....	6
VIII. Lien des activités proposées avec les résultats du projet.....	7
IX. Localisation géographique .....	10
X. Communication .....	11
XI. Stratégie de mise en œuvre .....	11
XII. Budget de la proposition.....	12
CIBLES (par fréquence de collecte des données) .....	13
Sources et moyens de vérification.....	13

## I. Mise en contexte

Le 14 Aout 2021, Haïti a connu pour une seconde fois en 10 ans un terrible tremblement de terre de magnitude 7.2 ayant touché 3 départements du sud d'Haïti touchant près de 16 % de population nationale. Le bilan s'élève à 2 248 personnes tuées, 12 763 personnes blessées et 329 personnes portées disparues<sup>1</sup>.

Le PNUD par sa mission s'est tout de suite mobilisé aux côtés du gouvernement et des partenaires humanitaires et de développement afin de jeter les bases d'un relèvement rapide et d'actions de développement à plus long terme et conformes aux ODD. Dans son rôle d'intégrateur et de renforcement de capacités, le PNUD espère apporter son soutien aux différentes victimes de cette tragique catastrophe se trouvant, bien avant le séisme, dans une situation précaire et fragile.

Tout en tenant compte des leçons apprises dans la réponse au désastre occasionné par le Séisme du 12 Janvier 2010, le PNUD en étroite collaboration avec le Gouvernement et en respect aux directives du MPCE pour le PDNA et le relèvement dans le Sud-Ouest d'Haïti propose des actions prioritaires clés, sans lesquelles plusieurs milliers de personnes resteront privées de moyens de subsistance de base et de moyens de logement ce qui ne va qu'aggraver les problèmes de protection des jeunes filles et la santé des plus vulnérables.

Le PNUD s'appuiera sur l'expérience et les leçons apprises des interventions au cours de la période post-séisme 2010 et post-Matthew 2016 pour renforcer la gouvernance de la reconstruction et la restauration des moyens de subsistance dans les zones affectées par le séisme du 14 Aout 2021.

Par ailleurs, se basant sur les expériences et leçons apprises du programme Relèvement PostCatastrophe après le passage de l'ouragan Matthew en 2016, une approche intégrée conciliant une stratégie autour de trois points essentiels sera priorisée : « reconstruire en mieux », « améliorer les moyens de subsistance » tout en réduisant l'impact des débris sur l'environnement. Cette approche de relèvement rapide prépare le terrain pour une stratégie de sortie efficace, et ainsi sert de transition ou chevauchement entre actions humanitaires et des solutions durables pour la fourniture d'une aide au développement national après le séisme. Ces actions rapides vont aussi cimenter un processus cherchant à développer des capacités pour le relèvement au moyen et long terme.

Un accent sera mis sur le Nexus Humanitaire et Développement pour soutenir l'assistance urgente à l'aide au relèvement précoce des communautés affectées pour reconstruire les vies, les moyens de subsistance et réhabiliter les infrastructures sociales essentielles, par des activités à forte intensité de travail. La prise en compte de la dimension genre sera intégrée dans toutes les phases du projet. Toutes actions et activités seront mises en œuvre suivant les normes d'intégration du genre qui incluront le leadership des femmes et une participation égale dans la mise en œuvre et à la conception des interventions ; des collectes et d'analyses de données précises et sexospécifiques sur les besoins différenciés des femmes et des hommes dans les zones touchées par le récent tremblement de terre ; La mise en place d'outils pratiques pour faciliter l'intégration de la dimension genre et inclusion dans les interventions; d'assurer le suivi des actions mises en œuvre et d'évaluer l'impact de la prise des notions genre et inclusion.

---

<sup>1</sup> Rapport de situation #11 de la DGPC

## II. Justification de la proposition

L'ampleur de l'impact sur les populations bénéficiaires dans la zone du projet PostCatastrophe -en pleine clôture au moment du tremblement de terre- est grande. Environ un 40% des bénéficiaires des projets sont victimes de dégâts dans bâtiments et infrastructure, pertes et décapitalisation des moyens de subsistance. Le PNUD, engagé au côté du Gouvernement dans la réponse, reconnaît le besoin de minimiser ces effets pour soutenir la durabilité et continuité les résultats du projet.

Sur le terrain, les partenaires (autorités locales et départementales, et bénéficiaires) sollicitent l'appui du projet en matière de relèvement afin d'améliorer les conditions de vie des personnes affectées sur le principe de la sécurité humaine. Les institutions, au niveau central, ont également émis une demande de soutien urgent vis-à-vis du renforcement des institutions de crise affectées par le séisme (notamment la DGPC avec le soutien au COUD/COUC et la Direction de l'Administration Pénitentiaire/DAP en appui aux prisons endommagées (Anse-à-Veau et Jérémie) ayant nécessité le transfert urgent de prisonniers dans des centres carcéraux déjà en sureffectifs. Le PNUD, tenant compte des directives du Gouvernement et des évaluations préliminaires de besoins effectuées par l'ensemble des secteurs et les différents sous-groupes de rédaction du PDNA, a identifié la nécessité de faire les interventions en lien avec un appui efficace pour améliorer le processus d'autoréparation, de réhabilitation des infrastructures communautaires et publics dans les zones affectées grâce à l'accès à l'information, la formation, aux matériaux de bonne qualité et aux subventions pour les familles vulnérables et de favoriser la relance économique durable à travers les mesures d'urgence en faveur de l'emploi dans la gestion et la valorisation des débris, la protection de l'environnement, la réhabilitation des infrastructures communautaires et autres initiatives menées par la communauté. Le projet favorisera l'égalité des sexes, l'engagement communautaire pour de bonnes mises en place du relèvement précoce et renforcement de la résilience économique.

Ces activités sont liées aux résultats obtenus dans le cadre du projet PostCatastrophe, profitant des capacités déjà installées en termes de consultants, expérience et connaissance du terrain. Ceci permet une rapide expansion des activités en cours et appui des agents d'implémentation avec une courbe d'apprentissage réduite.

En termes de stratégie, le PNUD au cours de cette continuité dans la mise en œuvre du projet Relèvement PostCatastrophe, le PNUD entend mettre à disposition ces expériences au support de la durabilité des actions dans la Grand'Anse :

- **Coordination institutionnelle** : Pour assurer une approche centrée sur le nexus humanitaire-développement-paix qui coordonne les interactions au niveau institutionnel central et les partenaires sur le terrain, selon les priorités et besoins identifiées par les institutions de réponse humanitaire, les agents de développement, les institutions de financement et la société civile. Ceci permettra de garantir de la transparence au niveau des résultats et la durabilité des interventions grâce à l'appropriation de processus de la part des bénéficiaires.
- **Réplique des bonnes pratiques et histoires de succès** : La commune de Dame Marie est une « commune phare » en terme d'approche intégrée de préparation au désastre (plan de contingence multirisque), plan de relèvement post désastre, activités de relèvement rapide a activités de relèvement économique<sup>2</sup> en passant par le leadership des autorités dans la construction durable des

---

<sup>2</sup> [https://www.lenational.org/post\\_free.php?elif=1\\_CONTENUE/economies&rebmun=3094](https://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/economies&rebmun=3094)

logements pour les déplacés<sup>3</sup>. L'expérience serait à répliquée dans d'autres communes du département.

- **Solutions prêtes et testées, implémentées en coordination avec les institutions publiques** : Les expériences du PNUD avec le Bureau Technique d'Évaluation du Bâtiment (BTEB) au MTPTC, UCLBP pour la construction de maisons durables à Dame Marie (Build better) et du Centre d'Appui aux Maisons Endommagées (CARMEN) et notre prochain engagement en appui au gouvernement pour le processus de PDNA et HBDA (Household and Building Damage Assessment) sont des acquis et des expériences solides.

**Liaison des actions** : actions de relèvement rapide, qui préparent le terrain pour des solutions durables, enchaînées à des processus qui visent à renforcer la résilience des communautés et les institutions pour la reconstruction et le relèvement économique.

### III. Objectifs de cette intervention

Le PNUD, à travers le réaménagement du projet PostCatastrophe, veut contribuer à appuyer les efforts des autorités gouvernementales en matière de relèvement afin d'améliorer les conditions de vie des personnes affectées à la suite du séisme du 14 Août 2021 dans les communes de Pestel, Corail, Beaumont, Camp Perin, Iles Cayemites et Roseaux.

### IV. Axes d'intervention

Le PNUD a défini trois grandes lignes d'action pour renforcer les activités menées dans la Région Grand'Anse.

1. Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations et des familles vulnérables en appuyant les infrastructures de crises<sup>4</sup> et en agissant sur la protection de l'environnement, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation sur la protection de l'environnement ;
2. Le relèvement sociale et économique des communautés est accéléré en renforçant les activités génératrices de revenus ou entrepreneuriales grâce aux méthodologies Ann Ale et BBJ et pour récupérer les chaînes de valeur en rétablissant les infrastructures mineures liées à la production ;
3. La vulnérabilité des populations ciblées est réduite à travers l'emploi de courte durée visant à renforcer le pouvoir d'achat et la consommation. Dépendant des conditions et besoins, le PNUD, en coordination avec les mairies, développera des programmes d'emploi de courte durée pour le nettoyage des débris dans les espaces urbains et/ou des zones agricoles affectées

### V. Egalité hommes-femmes

Le projet développera des stratégies pour améliorer l'insertion économique des femmes, en faisant attention aux problèmes liés à la violence contre les femmes, et les difficultés d'accès et participation

---

<sup>3</sup><https://reliefweb.int/report/haiti/le-pnud-et-koica-s-engagent-pour-la-relocalisation-de-d-plac-s-du-cyclone-matthew-et-l>

<sup>4</sup> Dans le cadre de ce résultat, une action sera conduite en appui aux prisons de Jérémie (département de la Grand'Anse) et de Anse à Veau (département des Nippes), toutes deux endommagées par le séisme et ayant nécessité le transfert urgent des prisonniers vers la prison de Petit Goâve le 15/8/2021. Suite à une évaluation conduite conjointement par la DAP et le PNUD, une évaluation des dommages fixe entre 150,000 – 200,000 US\$ le coût des réparations.



dans des initiatives de relèvement. Des actions d'emploi de courte durée seront visées pour encourager pour la participation des femmes (services d'alimentation, garde des enfants, etc.) Pour réduire le risque d'épisodes de violence contre les femmes, des sessions informatives pour la communauté et ménages seront menées avant le début des activités.

Dans ce processus, le PNUD intègre des approches conduisant à des actions qui génèrent des transformations dans les communautés et les rôles entre hommes et femmes, tenant compte des constructions sociales et réalistes. L'objectif principal est de développer des mécanismes qui permettent aux femmes de participer en sécurité aux initiatives. Une spécialiste genre sera embauchée pour développer une analyse de genre, training pour les ONG, fonctionnaires et consultants pour détecter et prévenir la violence contre les femmes.

## **VI. Environnement et résilience**

Les débris causent un problème important déjà dans le complexe scénario post séisme. Un des objectifs les plus importants en dehors de la génération des opportunités d'emplois de court terme, est la disposition et la gestion rationnelle des débris générés par le séisme, en réduisant les impacts sur la santé et la sécurité de la population, ainsi l'aménagement des espaces de décharges des déchets afin d'éviter la pollution de l'air, des sources d'eau, des espaces d'exploitation agricole. Il en est de même pour le recyclage des matériaux qui seront réutilisés dans la construction en termes de recyclage dans la réparation et la reconstruction des maisons.

## **VII. Leçons apprises**

Pour améliorer l'efficacité-cout et les retards enregistrés dans les efforts de construction ou réhabilitations des maison et infrastructures détruites, ainsi que des installations des coopératives affectées dues aux effets de séisme, le PNUD va faire en sorte de d'établir des partenariats dans une approche holistique avec les acteurs de développement local œuvrant dans la zone et ayant des expériences avérées dans la conduite des travaux de constructions. Une des institutions à considérer, est l'Institut de Technologie et d'Animation (ITECA)<sup>5</sup> ayant une solide expérience dans la construction des maisons parasismiques ans le milieu paysan, avec l'apport des autorités locales (Maires, CAESC/ASEC), les organisations communautaires et les bénéficiaires dans des actions de relèvement qui s'inscrivent dans un processus a plus long terme.

Le partenariat avec des ONG locales dans la reconstruction des maisons détruites au profit des familles vulnérables et qui maîtrise parfaitement la notion de participation et mobilisation communautaire, constituent des atouts qui peut pousser les bénéficiaires surtout à être parties prenantes dans la reconstruction. Car les bénéficiaires après la signature d'un protocole d'accord auront à fournir des matériaux locaux, de l'eau comme intrant pour les chantiers, des mains d'œuvre locales, et autres. L'ONG locale partenaire aura à travailler également avec les autorités locales dans certains cas où il serait nécessaire pour la mise à disposition d'espace de reconstruction standard dans la mesure où un bénéficiaire ne procéderait pas d'espace suffisant pour l'implantation de sa maison en reconstruction. Ces mécanismes favorisent une meilleure coordination et entente entre les acteurs, toujours avec le support technique de l'ONG locale, partenaire de la reconstruction.

---

<sup>5</sup> ITECA a déjà plus de 1,000 maisons paysannes construites à son actif. Elle déjà collaboré avec d'autres institutions et bailleurs après le tremblement de terre du 12 Janvier 2010. Cette organisation a continué sa collaboration avec Développement et Paix à la suite du passage de Mathieu dans le grand sud d'Haiti. Et selon un article du journal "Lapresse" de Montréal, ces maisons construites ont résisté au séisme du 14 Aout 2021.

Lors de l'évaluation finale du projet, sur la base de ses observations, ses rencontres et son appréciation globale du projet, le consultant nous a présente des recommandations recouvrant des domaines de pertinence, efficacité, efficience et voir durabilité de l'action. Deux domaines sont retenus dans ce cas d'espèce :

- **Pertinence** : après analyse des témoignages recueillis et des observations, le consultant a conclu que de par ses objectifs et axes d'intervention et au regard des activités conduites et des résultats obtenus, **"Le PNUD devait considérer étendre le projet a d'autres départements comme le Sud et les Nippes. Il faudrait alors capitaliser sur les leçons apprises du projet"**. Certes cette nouvelle proposition ne prend en compte de nouveaux départements comme il a été proposé, mais vu au fait que certaines communes, comme Iles Cayemites, Beaumont, Roseaux n'ont pas été touchées par certaines activités du projet et vu les dégâts enregistrés dans les autres communes concernées, le PNUD estime c'est un bon point d'ancrage pour le relèvement.
- **Efficacité** : D'une part le consultant a conclu que la stratégie de sortie du projet n'a pas été implémentée faute de temps. Et pour accompagner les mairies dans la mise en œuvre des plans de relèvement, il a proposé au PNUD **"d'accompagner les mairies pour s'assurer d'une appropriation effective, (1) en renforçant le plan de maintenance des matériels, (2) dans la mise en œuvre des plans, en facilitant la dissémination et l'appropriation de ces plans par les autres acteurs de développement du département, (3) la recherche de financement pour les plans, dans le maintien des acquis du projet serait souhaitable"**. Cette considération n'est pas limitée seulement a l'accompagnement des autorités dans l'implémentation des plans, et le suivi des matériels distribués ainsi que des bâtiments réhabilités, elle s'étend également aux bénéficiaires des activités de relèvement économique.

A cote du travail du consultant, le projet a retenu lui aussi des enseignements de cette expérience. Et l'un d'entre eux a été ce qui suit : *Les projets de développement sont implémentés sur une durée relativement longue. Haiti spécialement est exposée au risque de catastrophes naturelles, surtout avec le phénomène du réchauffement climatique. Il est important que les partenaires techniques et financiers ainsi que les opérateurs prennent en compte ce facteur et se préparent dans tout projet de développement a des éventuels fonds de contingence afin de consolider les résultats obtenus dans un projet de développement en cours de réalisation. Et la proposition ou recommandation a été de mettre en place, "Un fond stratégique de réponse aux éventuelles catastrophes naturelles serait un atout dans le cadre de l'exécution d'un projet de développement de long terme "*

Se basant sur ces différents enseignements et recommandations, considérant que le séisme du 14 Aout 2021 a touche gravement ces communes faisant parties du projet, le PNUD estime que cette extension pourrait aider à consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet PostCatastrophe, et d'étendre cet accompagnement a d'autres communes qui n'ont pas été ciblées pour cette composante du projet et de nouvelles communes de autres partenaires faisant parties de cette proposition.

## VIII. Lien des activités proposées avec VIII les résultats du projet<sup>6</sup>

Résultats intermédiaires du PROJET	Nouvelle Activités proposées lies aux résultats intermédiaires	Cibles
------------------------------------	--	--------

<sup>6</sup> Cadre de mesure de rendement du projet en annexe B

<p><b>Résultat immédiat 1110</b> : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation des efforts de relèvement post-Mathieu qui favorisent la participation des citoyens, l'égalité des sexes, la transparence, la redevabilité et la réduction continue des risques.</p>	<p>Extrant 1114. Soutenir les activités nationales de réduction des risques, en améliorant la considération des dimensions genre et diversité</p>	<p>12 PCCM et &amp; 7 PCD valides</p> <p>1 campagne de vulgarisation autour des 12 PCCM</p> <p>1 exercice- Simulation de table (SIMEX)</p> <p>7 ateliers de partage et de vulgarisation des PCD dans les communes bénéficiaires</p>
<p><b>Résultat intermédiaire 1300</b> : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes</p>	<p><i>1301- La vulnérabilité des populations ciblées est réduite à travers l'emploi de courte durée visant à renforcer le pouvoir d'achat et la consommation.</i></p> <p><i>Extrant 1301- Les capacités locales sont renforcées pour la reconstruction résiliente des maisons détruites des familles vulnérables, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation des risques ;</i></p>	<p>60 maisons des familles vulnérables détruites par les séisme avec 60% de femmes propriétaires et/ou monoparentales, reconstruites</p> <p>4 activités de sensibilisation sur l'égalité de sexe et la violence basée sur le genre, réalisées</p> <p>3 communes sont ciblées par des activités liées à la réhabilitation des infrastructures, l'élimination des débris, la réhabilitation des routes et d'autres services communautaires</p> <p>2,000 personnes pour les activités à haute intensité de Main d'œuvre avec 40% de femmes</p>
<p><b>Résultat intermédiaire 1310</b> : La capacité des communes et des organisations communautaires de base à réhabiliter les infrastructures communautaires clés et à gérer leurs systèmes opérationnels pour accroître la résilience en cas de catastrophe est renforcée, tout en tenant compte des priorités de réduction des risques des femmes et des groupes vulnérables.</p>	<p><i>Extrant 1301- Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations et des familles vulnérables en agissant sur la protection de l'environnement, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation sur la protection de l'environnement</i></p>	<p>3 infrastructures publiques stratégiques de la Grande 'Anse sont réhabilités,</p> <p>1 infrastructure publique stratégique des Nippes est réhabilitée</p> <p>6 communes bénéficient de la création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants</p>

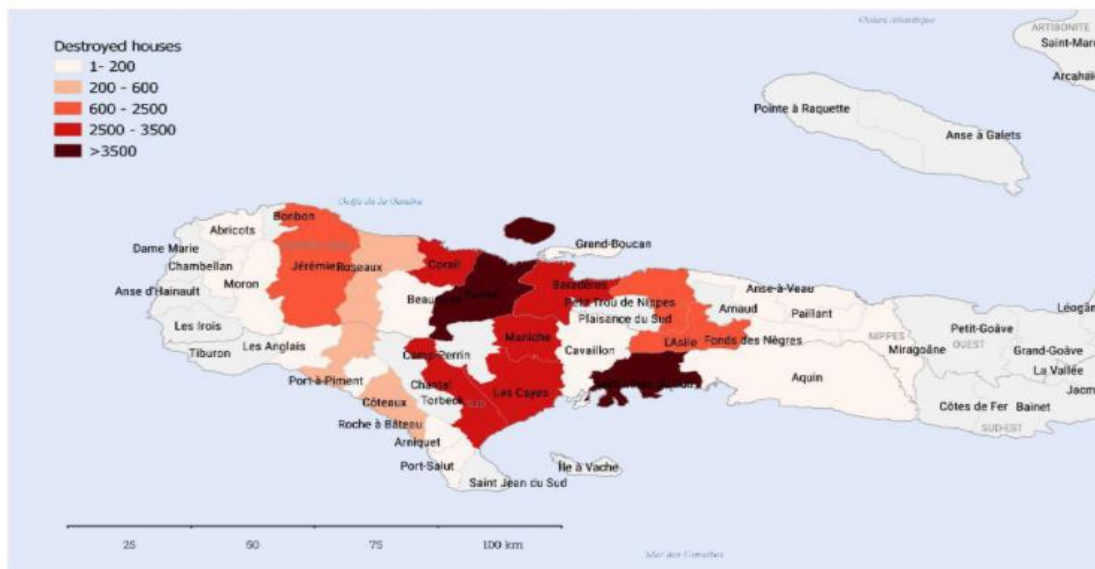
		<p>200,000 plantules produites et 2,000 mètres linéaires ravins traités (traitement mécanique et végétal)</p> <p>56 km de pistes agricoles réhabilités avec gravier, pierre et sable</p> <p>1.2 km de canaux en maçonnerie pour évacuer les eaux des mornes</p> <p>460 ml de ravins rectifiés pour faciliter l'évacuation des eaux de pluies</p>
<p><b>Résultat immédiat 1320 :</b> La capacité des entrepreneurs et des coopératives et associations de producteurs à rétablir les entreprises, à créer des emplois « verts » et à saisir les opportunités d'activités génératrices de revenus durables est renforcée, en mettant particulièrement l'accent sur le soutien économique des femmes.</p>	<p><i>Extrant 1321- Le relèvement sociale et économique des communautés est accéléré en renforçant les activités génératrices de revenus ou entrepreneuriales grâce aux méthodologies Ann Ale et BBJ et pour récupérer les chaînes de valeur en rétablissant les infrastructures mineures liées à la production ; et la réhabilitation des espaces d'achat d'un groupe de coopérative; ainsi des plantations de café seront régénérées.</i></p>	<p>60 nouvelles entreprises individuelles avec 80% de femmes propriétaires bénéficieront des activités de relèvement économique</p> <p>15 nouvelles coopératives et associations seront renforcées techniquement avec la méthodologie Ann Ale, le financement de leurs Plans d'Affaires et un support en marketing avec des matériels visuels.</p> <p>15 coopératives et associations dont 1,500 bénéficiaires avec 60% de femmes, renforcées</p> <p>60 petites entreprises du projet touchées par le séisme seront recapitalisées</p> <p>6 infrastructures ou espaces d'achat des coopératives caféières seront réhabilitées</p> <p>150 ha de plantation de café seront régénérées</p> <p>2,000 personnes pour des emplois verts avec 40% de femmes</p>

## IX. Tableau des bénéficiaires

#	Description des bénéficiaires	Nombre de bénéficiaires	Commentaires
1	Reconstruction des maisons détruites	<b>300</b>	60 maisons pour autant de ménages
2	Plan Communal de Contingence Multirisques	<b>468,301</b>	Le PCCM cible l'ensemble de la population du département
3	Plan Communal de Développement	<b>327,811</b>	Pour le PCD 7 communes sont concernées et comme le PCCM, il concerne l'ensemble de la population de la commune
4	Sensibilisation de la population sur l'égalité de sexes	<b>125,000</b>	
5	Travaux à Haute Intensité de Main-Œuvre (HIMO)	<b>10,000</b>	
6	Emplois verts	<b>1,000</b>	
7	Bénéficiaires directs des plantules fruitières et forestières	<b>300</b>	
8	Recapitalisation des entreprises individuelles	<b>120</b>	
9	Recapitalisation des coopératives et associations	<b>10,000</b>	

## X. Localisation géographique

Communes de Pestel, Corail, Beaumont, Camp Perin, Iles Cayemites, Roseaux



*Project Location Map: Department of South and targeted communes*

## XI. Communication

En coordination avec le gouvernement une communication intense sera priorisée, il s'agit de sensibiliser la population sur la position à adopter en matière de changement de comportement et de construction durables, les mesures de préventions des risques et de préparation à la catastrophe et la mise en œuvre des recommandations. Les principales activités de cet axe sont :

- Campagne de sensibilisation à travers des médias du département, et au moyen des supports de communication développés,
- Production d'affiches
- Développement et diffusion de spots de sensibilisation,
- Fabrication de banderoles, tableau d'affichages, branding, pancartes

## XII. Stratégie de mise en œuvre

Le PNUD travaillera avec les autorités au niveau national, départemental et local. Il impliquera : le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), le Ministère des travaux publics, transports et communication, Les mairies et les ASECs/CASECs. Les Organisations de Base et Associations de femmes dans les zones ciblées, les Associations de personnes à mobilité réduites.

**XIII. Budget de la proposition**

<b>ACTIVITES</b>	<b>BUDGET</b>
Act. 1	559,500.00 USD
Act. 2	1,138,000.00 USD
Act. 3	940,000.00 USD
Assurance qualité	132,000.00 USD
Total	2,769,500.00 USD
Couts direct (8%)	221,500.00 USD
<b>Total</b>	<b>2,991,060.00 USD</b>

**Effet visé, comme indiqué dans le Cadre de ressources et de résultats du programme national /PNUAD :** Les institutions nationales, régionales et locales, et la société civile, améliorent la gestion de l'espace rural et urbain, de l'agriculture et de l'environnement, et les mécanismes de prévention et de réduction des risques pour améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

**Indicateurs d'effets, comme spécifiés dans le Cadre de ressources et de résultats du programme national [ou mondial/régional], comprenant les baselines et cibles :** Position d'Haïti dans l'indice pour la gestion des risques (INFORM) ; Ligne de base : 6,1 (2015) ; Cible : 5 (2021)

Produit 3.1 indicatif du Descriptif de programme de pays : Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles ainsi que la réduction et la gestion des risques.

**Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD :**

Produit 1.1, Produit 4.4, Produit 4.5, Produit 5.1, Produit 5.5, Produit 6.1

**Titre du projet et numéro du projet dans ATLAS :** PID99905\_Projet de relèvement post-catastrophe

PRODUITS ATTENDUS	INDICATEURS DE PRODUIT	SOURCE DES DONNÉES	BASELINE		CIBLES (par fréquence de collecte des données)				Sources et moyens de vérification
			Valeur	Annee	2021	2022	2023	FINALE	
<b>Produit 1 :</b> <b>La durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'État en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.</b>	<b>1.1</b> Pourcentage des membres de la société civile (notamment les femmes, les jeunes, et les personnes handicapées) impliqués dans l'élaboration des Plans Communaux de Développement satisfaits par la prise en compte de leurs besoins et priorités dans les PCD	Projet		2020	70%	70%	70%	70%	Fiches de présence et compte-rendu /rapports d'activités  Rapport évaluation finale du projet sur zone y compris évaluation qualitative de l'implication des acteurs du cadre de concertation
	<b>1.2</b> Proportion des bénéficiaires des activités « cash-for-work » ayant utilisé l'argent reçu pour relancer et/ou démarrer une activité génératrice de revenu					50%	50%	50%	Rapport Enquête auprès des maires



<b>Produit 2 :</b> <b>L'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.</b>	<b>2.1</b> Proportion des femmes bénéficiaires des activités « cash-for-work » ayant augmenté leur pouvoir décisionnel de dépenses domestiques grâce à l'argent reçu	Projet		2020	50%	50%	50%	50%	Rapports
	<b>2.2</b> Proportion des bénéficiaires des activités « cash-for-work » ayant utilisé l'argent reçu pour relancer et/ou démarrer une activité génératrice de revenu	Commune		2020	50%	50%	50%	50%	Enquêtes, rapport,
<b>Produit 3 :</b> <b>Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.</b>	<b>3.1</b> Proportion d'associations et de coopératives appuyées ayant augmenté leur revenu et/ou ayant renforcé leur intégration dans le marché après décapitalisation	Projet	40%	2020	60%	60%	60%	60%	Enquêtes, rapport
	<b>3.2</b> Proportion d'entreprises insérées dans les filières « vertes » <sup>31</sup> et fonctionnelles 12 mois après avoir reçu l'appui	Projet	40%	2020	50%	50%	50%	50%	Enquêtes, rapport

Plan de travail pluriannuel									
Produits escomptés	Activités planifiées	2022	2023	Partie responsable	Source des fonds	Budget prévisionnel par année			
						Description du budget	Montant 2022 Jan - Déc	Montant 2023 Jan - Déc	Total
<b>Produit 1 : La durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'État en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.</b>									
<b>Résultat de l'activité 1.1.</b>  <b>Les capacités nationales et locales sont renforcées pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation des efforts de relèvement post-Mathieu qui favorisent la participation des citoyens, l'égalité des sexes, la transparence, la redevabilité et la réduction continue des risques.</b>	1.1.1. Soutenir les activités nationales de réduction des risques, en améliorant la considération des dimensions genre et diversité.  - Appui technique et financier à l'imprimerie des PCCM pour diffusion auprès des autorités, partenaires et communautés. - Appui technique et financier à la réalisation des SIMEX.			PNUD MPCE	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00
						71600 - Voyages	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 7,500.00
						72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
						72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
						74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
						71300 - Consultant national	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
			75700 - Formation	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00			
	1.1.2. La coordination de l'aide assurée par le gouvernement haïtien, notamment celle en lien avec les efforts de relèvement à la suite de catastrophes naturelles, est améliorée  - Appui technique au fonctionnement de l'ATLD. - Appui technique et			PNUD MPCE	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
						72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
						74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00

	financier a l'imprimerie des PCD.  - Appui technique a la vulgarisation et l'utilisation des PCD dans les communes.					71300 - Consultant national	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ <b>5,000.00</b>
	1.1.3. Appui au système carcéral de deux départements, le Sud et la Grande.  -Appui financier a la réhabilitation de deux prisons dans les départements des Nippes et de la Grande Anse  - Réhabilitation des infrastructures publiques détruites par le séisme			<b>PNUD MPCE</b>	<b>MAEC</b>	71400 - Contrats de service	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ <b>45,000.00</b>
						71600 - Voyages	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ <b>10,000.00</b>
						72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 80,000.00	\$ 190,000.00	\$ <b>270,000.00</b>
						72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$	\$ 10,000.00	\$ <b>10,000.00</b>
						74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 2,000.00		\$ <b>2,000.00</b>
						71300 - Consultant national	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ <b>10,000.00</b>
	<b>Sous-total Résultat 1</b>						\$ <b>227,500.00</b>	\$ <b>332,000.00</b>	\$ <b>559,500.00</b>
<b>Produit 2 : L'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.</b>									
<b>Résultat de l'activité 2.1.</b> <b>Le relèvement sociale et économique des communautés est accéléré en renforçant les</b>	2.1.1. Quatre communes sont renforcées par le biais des chaînes de valeurs identifiées et de l'appui technique à 33 coopératives et 240 entreprises - Appui financier a un groupe d'entreprises			<b>PNUD</b>	<b>MAEC</b>	71400 - Contrats de service	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ <b>120,000.00</b>
						71600 - Voyages	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ <b>20,000.00</b>
						72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ <b>10,000.00</b>

<b>activités génératrices de revenus ou entrepreneuriales grâce aux méthodologies Ann Ale et BBJ et pour récupérer les chaînes de valeur en rétablissant les infrastructures mineures liée à la production</b>	individuelles dans les communes touchées par le séisme bénéficiant des premières actions du projet. - Appui financier a un groupe de coopératives bénéficiant des premières actions du projet -Appui technique et financier d'un nouveau groupe d'entreprises individuelles					72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises \$ 180,000.00	\$ 276,000.00	\$ 456,000.00
						71300 - Consultant national \$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
						75700 - Formation \$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00
	2.1.2. La création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants - Production et transplantation des arbres fruitiers et forestiers - Création d'emplois verts dans les communes - Facilitation des travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre - Régénération des plantations caféières - Traitement et correction de ravins - Appui technique et financier a la réhabilitation de six coopératives			<b>PNUD</b>	<b>MAEC</b>	71400 - Contrats de service \$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
						71600 - Voyages \$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
					72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises \$ 180,000.00	\$ 250,000.00	\$ 430,000.00	
	<b>Sous-total Résultat 2</b>					<b>\$ 486,000.00</b>	<b>\$ 652,000.00</b>	<b>\$ 1,138,000.00</b>
<b>Produit 3 : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.</b>								
<b>Résultat de l'activité 3.1.</b>	3.1.1. Reconstruction des maisons détruites dans les 3			<b>PNUD</b>	<b>MAEC</b>	71400 - Contrats de service \$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 75,000.00

Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations et des familles vulnérables en agissant sur la protection de l'environnement, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation sur la protection de l'environnement ;	communes								
	- Appui technique et financier à la reconstruction de certaines maisons détruites par le séisme du 14 Aout 2021					71600 - Voyages	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
						72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 250,000.00	\$ 550,000.00	\$ 800,000.00
						74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
						71300 - Consultant national	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
3.1.2. Formation des cadres des mairies, visibilité communication  - Soutien à l'organisation des ateliers de travail au profit des cadres des mairies sur l'occupation des espaces géographiques par les populations  - Support financier aux mairies dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la problématique de l'environnement									
						71600 - Voyages	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
						72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
						71300 - Consultant national	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
						75700 - Formation	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
<b>Sous-total Résultat 3</b>							<b>\$ 320,000.00</b>	<b>\$ 620,000.00</b>	<b>\$ 940,000.00</b>
Assurance qualité Frais généraux de fonctionnement Suivi Communication Evaluation finale		x	x				\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
		x	x				\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 47,000.00
		x	x				\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
		x	x				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
			x				\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00

	Audit		x			\$ -	\$ 10,000.00	\$ <b>10,000.00</b>
	<b>Sous-total</b>					\$ <b>48,500.00</b>	\$ <b>83,500.00</b>	\$ <b>132,000.00</b>
	<b>Sous-total 1+2+3</b>					\$ <b>1,082,000.00</b>	\$ <b>1,687,500.00</b>	\$ <b>2,769,500.00</b>
	<b>Coûts indirects (8%)</b>					\$ <b>86,560.00</b>	\$ <b>135,000.00</b>	\$ <b>221,560.00</b>
	<b>BUDGET TOTAL</b>					\$ <b>1,168,560.00</b>	\$ <b>1,822,500.00</b>	\$ <b>2,991,060.00</b>
