



Plan de travail

Titre du projet : Projet relèvement Post-catastrophe

Numéro du projet : 00131469

Partenaires de mise en œuvre : PNUD

Date de début : 3 novembre 2016 **Date de fin :** 31 décembre 2024

Date de réunion PAC : 3 octobre 2017

Année de la révision : 2022

Brève description du projet

Le projet de relèvement Post-Catastrophe vise à soutenir le relèvement à long terme, la résilience aux chocs futurs et le développement durable, tout en répondant aux besoins immédiats de la population touchés par les catastrophes naturelles. Afin d'atteindre les résultats attendus, le projet soutient le renforcement de la connaissance approfondie des risques et de la vulnérabilité du territoire en tant qu'outil d'aide à la décision pour orienter les efforts de relèvement et de développement, tout en faisant le lien entre l'humanitaire et le développement.

Il renforce ainsi la gouvernance en privilégiant les capacités nationales et locales en matière de planification, de coordination et de mise en œuvre liées aux efforts de relèvement. Le projet appuie également la restauration des moyens de subsistance par la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi, de la réhabilitation des infrastructures communautaires, ainsi que la mise en place de formations pour la génération de revenus à court, moyen et long terme. Le projet favorise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la restauration et la préservation de l'environnement en tant qu'objectifs clés pour « reconstruire en mieux » Haïti. Chaque activité a été définie pour contribuer à ces objectifs. Le projet répondra aussi au résultat stratégique 5 u Plan stratégique du PNUD 2017-2021, en particulier les produits 5.5 et 3.1 relatifs au Programme de pays pour Haiti. Et sera réalisé à travers les produits suivants :

- ✓ Produit 1 : la durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'Etat en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.
- ✓ Produit 2 : L'atomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.
- ✓ Produit 3 : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.

Le projet fera l'objet d'une modalité de mise en œuvre directe, exécutée par le bureau de pays du PNUD en Haïti. La durée du projet s'étendra de novembre 2016 à décembre 2023. La réalisation des activités du projet sera conduite de manière séquentielle selon les zones géographiques et échelonnée en fonction de la disponibilité du financement.

<p>Effet auquel contribue le projet (PNUAD/DPP) : Réalisation 5 du descriptif de programme de pays- Les institutions nationales, régionales et locales, et la société civile, améliorent la gestion de l'espace rural et urbain, de l'agriculture et de l'environnement, et les mécanismes de prévention et de réduction des risques pour améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et au changement climatique.</p> <p>Produit(s) indicatif(s) et marqueur de genre : Produit 5.5 du descriptif de programme pays- Cadres politiques et mécanismes institutionnels mis en place aux niveaux nationaux et sous nationaux pour la gestion pacifique des conflits et des tensions émergentes et récurrentes.</p> <p>Produit 3.1 du descriptif de programme pays- Les acteurs nationaux disposent des connaissances, des capacités et des outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles et la prévention et la gestion des risques</p>	Total des ressources nécessaires :	30,272,145.00 USD
	Ressources mobilisées	
	PNUD Trac-1 et TRAC-3	Trac 1 : 1,566,846 Trac 3 : 150,000. USD
	Funding windows- Financement du PNUD:	750,000.00 USD
	Japon	500,000.00 USD
	Nouvelle-Zélande	178,063.00 (250,000 NZD)
	Maurice	200,000.00 USD
	Onu Femmes	60,000.00 USD
	Gouvernement FAES	1,995,000 USD
	PAM	539,697.00 (2017) 277,639.00 (2018)
	Digital Good	18,000.00 USD
	Canada	8,065,035.24 USD (10,150,000 CAD) 2,991,060.00 USD (4,000,000.00 CAD) ¹
	Corée (KOICA) ²	2,480,578.00 USD
	Norvège	3,500,746.00 USD (27,000,000 NOK)

Lu et approuvé par (signatures) :

Programme des Nations Unies pour le développement
Mactar Fall
Représentant Résident a.i
Date :

¹ Dédié à la mise en œuvre des actions en réponse au tremblement de terre du 14 Aout 2021

² Dédié à la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes déplacées internes de la localité de Lahaie.

Table des matières

I.	Index des sigles	3
II.	Informations de base sur le Projet.....	4
III.	contexte organisationnel	6
IV.	Nouvelle orientation du projet Post-Catastrophe en réponse au séisme du 14 Aout 2021	7
V.	Stratégie de Partenariats pour la mise en œuvre du Projet.	9
VI.	Lien des activités proposées avec les résultats De la Phase 1 du projet.....	10
VII.	La gestion du rendement du Projet	11
VIII.	Planification budgétaire	12
IX.	Chronogramme d'Activité pour la période de Juillet 2023-Juin 2024.....	16
X.	Modèle logique du projet	18
XI.	Risques et Mesures de Mitigation.....	19

I. INDEX DES SIGLES

ASEC	Assemble Section Communale
ATLD	Agence Technique Locale et Départementale
AVETI	Adaptation Climatique et Valorisation Économique Des Filières Agricoles
BTEB	Bureau Technique d'Evaluation du Bâtiment
CASEC	Conseil d'administration de la Section communale
CARMEN	Centre d'Appui aux Maisons Endommagées
CECI	Centre d'Etude et de coopération Internationale
COUC	Centres d'Opération d'Urgence Communale
COUD	Centres d'Opération d'Urgence Départementale
DAP	Direction de l'Administration Pénitentiaire
DCT	Direction des Collectivités Territoriales
DGPC	Direction Générale de la Protection Civile
FAES	Fond d'assistance Economique et Sociale
GRD	Gestion des Risques et des Désastres
HBDA	Household and Building Damage Assessment
KOICA	Agence coréenne de Coopération Internationale
MAEC	Comité Départemental de gestion des risques et des désastres
MARNDR	Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
MPCE	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
MTPTC	Ministère des Travaux publics, transports et communication
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
PCD	Plans Communaux de Développement
PCCM	Plan Communal de Contingence Multirisque
PAM	Programme Alimentaire Mondiale
PDNA	Evaluation des besoins Post-Catastrophe
PNUAD/DPP	Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
<i>PRIPS</i>	Plan de Relèvement Intégré de La Péninsule Sud
PRR	Plans de réduction des risques
UCLBP	Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics

III. CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Les évènements de ces dernières années montrent que les aléas naturels n'épargnent aucun pays. Des centaines de milliers de personnes ont péri et des millions d'autres ont perdu leurs moyens de subsistance dans des catastrophes provoquées par des aléas naturels. Cette situation est susceptible de s'aggraver avec le changement climatique qui pourrait augmenter la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, mais également avec l'intensification des activités humaines couplée à la croissance démographique. Les désastres qui ont frappé Haïti ces dernières années, ont démontré la vulnérabilité particulière du territoire haïtien. Le récent séisme de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter du 14 Aout 2021 en est une preuve. Cette catastrophe a provoqué des dommages considérables au niveau de la péninsule Sud du pays touchant près de 16 % de population nationale. Les dommages causés sont estimés à environ 1,12 milliards de dollars américains² soit l'équivalent de 7,8% du PIB d'Haïti en 2019. A noter que ce séisme est survenu en pleine saison cyclonique, et seulement quelques jours après la catastrophe, la Péninsule Sud et le département du Sud-est étaient frappés les 17 et 18 août 2021 par la dépression tropicale Grace. A côté de la précarité engendré par les dégâts des catastrophes naturels récurrents, il faut aussi ajouter les pertes dues à des troubles socio-politiques dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Conscient de de cette situation et aussi dans l'objectif d'appuyer les efforts des autorités gouvernementales en matière de relèvement afin d'améliorer les conditions de vie des personnes affectées à la suite du séisme du 14 Aout 2021 dans les communes de Pestel, Corail et Beaumont, le PNUD a réaménagé le projet Post Catastrophe après la modification numéro 4 de l'entente avec le gouvernement du Canada relative au financement de ce dit projet. Afin d'atteindre les résultats attendus, le projet soutient le renforcement de la connaissance approfondie des risques et de la vulnérabilité du territoire en tant qu'outil d'aide à la décision pour orienter les efforts de relèvement et de développement, tout en faisant le lien entre l'humanitaire et le développement. Il renforce ainsi la gouvernance en privilégiant les capacités nationales et locales en matière de planification, de coordination et de mise en œuvre liées aux efforts de relèvement. Le projet appuie également la restauration des moyens de subsistance par la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi, de la réhabilitation des infrastructures communautaires, ainsi que la mise en place de formations pour la génération de revenus à court, moyen et long terme. Il favorise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la restauration et la préservation de l'environnement en tant qu'objectifs clés pour « reconstruire en mieux » Haïti.

La mise en œuvre des activités est conduite de manière séquentielle par zone géographique et en fonction des financements disponibles. Ainsi, les activités de création d'emplois d'urgence (« cash for work ») ont

² MPCE, Post Disaster Needs Assessment (PDNA), Décembre 2021

démarré en novembre 2021 couvrant les 4 communes les plus affectés du département de la Grand 'Anse. Grâce à un financement additionnel du projet post-catastrophe, le PNUD est en train d'implémenter de nouvelles activités et dans ce cadre, le présent document de plan de travail pluriannuel est élaboré pour la période allant de janvier à décembre 2024.

IV. LES STRATEGIES TRANSVERSALES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

La mise en œuvre de la phase 2 du projet relèvement post-catastrophe se fera non seulement sur la base des principes directeurs qui sont en autres : la coordination institutionnelle, le réplique des bonnes pratiques et histoires de succès, solutions prêtes et testées, l'implémentation en coordination avec les institutions publiques ; mais aussi suivant des stratégies transversales en lien avec le genre, la prise en compte de l'environnement, la visibilité et la communication.

Stratégie d'intégration du genre dans la mise en œuvre du projet

Le projet continue avec l'implémentation des stratégies pour améliorer l'insertion économique des femmes, en faisant attention aux problèmes liés à la violence contre les femmes, et les difficultés d'accès et participation dans des initiatives de relèvement.

Dans ce processus, le PNUD intègre des approches conduisant à des actions qui génèrent des transformations dans les communautés et les rôles entre hommes et femmes, tenant compte des constructions sociales et réalistes. L'objectif principal est de développer des mécanismes qui permettent aux femmes de participer en sécurité aux initiatives. Primo, une spécialiste genre a été embauchée pour développer une analyse de genre, formation pour les membres de la sociétés civiles, fonctionnaires et consultants pour détecter et prévenir la violence contre les femmes. Segundo, une attention particulière est portée aux questions sexo-spécifiques afin que chacune des activités du projet contribue aux résultats en matière d'égalité des sexes. Pour ce faire, le projet fera la mise à jour de l'analyse comparative sur l'implication, le rôle, la place des femmes et des hommes dans les activités communautaires et les interrelations entre femmes et hommes. Le projet réalisera aussi une évaluation participative et inclusive à mi-parcours à travers un comité de protection des femmes (pour la durabilité des actions dans les communautés) sur les effets et les impacts du projet sur la situation des femmes et des hommes et sur les inégalités entre femmes et hommes, ainsi que les processus de transformation des rapports sociaux femmes-hommes. Cette évaluation sera réalisée via l'établissement des groupes de travail sur le l'égalité des sexes, la diversité et la jeunesse en utilisant les données tirées des travaux qui ont conduit à la ligne de base de la phase 2 du projet.

Mise à part de ces actions qui sont globales et concernent tous les axes ; le projet adopte de manière spécifique les approches suivantes :

- Des actions d'emploi de courte durée visées à encourager la participation des femmes sont en train d'être réalisées. Pour réduire le risque d'épisodes de violence contre les femmes, des sessions informatives pour la communauté et ménages continueront.
- Des activités de formation et de sensibilisation seront réalisées à l'occasion de la commémoration de chaque date importante dans la lutte du respect des droits de la femme dans le monde et en Haïti particulièrement.
- Soutien à l'amélioration de l'accès des citoyens aux mécanismes de règlement des griefs qui sont sensibles aux droits humains et à l'égalité entre les sexes, établissant ainsi une culture de responsabilité et de respect, en particulier pour les droits et réclamations des femmes, et qui renforce la cohésion sociale et le développement durable.
- Soutien aux réseaux de femmes et aux mouvements de la société civile pour que les perspectives d'égalité entre les sexes soient intégrées dans les politiques et la planification de développement, y compris celles liées à la transparence et à la responsabilisation, et promotion d'espaces de concertation au niveau local permettant un dialogue inclusif et une participation active des femmes dans les affaires publiques locales.
- Appui pour dépasser les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans le marché du travail, afin de transformer les normes traditionnelles de genre et réduire les obstacles à l'autonomisation économique des femmes ;
- Promotion de la participation égale des femmes et des hommes en tant que bénéficiaires du relèvement et du développement local. Le projet mettra l'accent d'une part sur l'augmentation de la participation des femmes comme bénéficiaires des activités de « *cash-for-work* » et d'autre part sur le renforcement du rôle des femmes dans la prise de décisions économiques au sein de leurs communautés. Les maisons détruites qu'avaient des femmes comme chef de ménage sont priorisées dans le cadre de la reconstruction des maisons.
- Renforcement de la participation des femmes aux processus décisionnels pour la réduction des risques de catastrophe. Cela comprend le renforcement des capacités des organisations de femmes à participer à la formulation et à la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies, ainsi que le renforcement des capacités des institutions concernées pour intégrer les perspectives de genre ;
- Assurer l'accès des femmes à des moyens de subsistance durables et « verts » et leurs droits à des biens productifs est essentiel à cet effort.

Grâce à ces stratégies, le PNUD vise à contribuer globalement à accroître la participation, la prise de décision et le leadership des femmes dans les initiatives du projet ; à améliorer l'accès et le contrôle par les femmes des ressources et des bénéfices du projet.

Stratégie de prise en compte de l'environnement dans la mise en œuvre du projet

L'un des résultats visés par la phase 2 du projet relèvement post-Catastrophe consister à favoriser les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement en améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes. Puisqu'une catastrophe naturelle peut détruire en une minute les progrès de développement enregistrés pendant plusieurs décennies voire d'un siècle, le projet est dans l'obligation d'agir sur la prévention des risques naturels en protégeant l'environnement. Beaucoup d'actions sont envisagés de manière transversale en vue de prendre en compte la question d'environnement dans nos actions.

- Dès le démarrage de la phase 2 du projet un diagnostic de l'impact environnemental et social du projet a été réalisé où les risques environnementaux et sociaux ont été identifiés ainsi que leur moyen de gestion. Le projet va poursuivre avec l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale qui était l'une des recommandations de ce diagnostic.
- Le projet va travailler conjointement avec la direction départementale de l'environnement pour réaliser les activités de remédiation environnementale.
- Comme il a été indiqué dans le précédent document de travail, le projet va continuer à utiliser les expertises de l'expert en Sauvegardes Environnementales et Sociales (SES) du bureau pour les aspects d'assurance de qualité en matière des analyses d'impacts environnementaux et sociaux.
- Pour les activités de reconstruction des maisons et la réhabilitation des infrastructures publiques le projet engagera à chaque fois des consultants qui seront sur place pour faire la surveillance environnementale et la sécurité au travail.

Stratégie de visibilité et de communication du projet

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, en coordination avec le gouvernement une communication intense sera priorisée. La population sera sensibilisée sur la position à adopter en matière de changement de comportement et de construction durables, les mesures de préventions des risques et de préparation à la catastrophe et la mise en œuvre des recommandations. Ainsi les activités suivantes seront implémentées :

- Campagne de sensibilisation à travers des médias du département, et au moyen des supports de communication développés,

- Production d'affiches, développement et diffusion de spots de sensibilisation,
- Fabrication de banderoles, tableau d'affichages, branding, pancartes.

V. LIEN DES ACTIVITES PROPOSEES AVEC LES RESULTATS DE LA PHASE 1 DU PROJET

Résultats intermédiaires du PROJET	Nouvelle Activités proposées lies aux résultats intermédiaires	Cibles
Résultat immédiat 1110 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation des efforts de relèvement post-Mathieu qui favorisent la participation des citoyens, l'égalité des sexes, la transparence, la redevabilité et la réduction continue des risques.	Extrant 1114. Soutenir les activités nationales de réduction des risques, en améliorant la considération des dimensions genre et diversité	Validation de 12 PCCM et 7 PCD; 1 campagne de vulgarisation autour des 12 PCCM 1 exercice- Simulation de table (SIMEX) 7 ateliers de partage et de vulgarisation des PCD dans les communes bénéficiaires
Résultat intermédiaire 1300 : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes	<i>1301- La vulnérabilité des populations ciblées est réduite à travers l'emploi de courte durée visant à renforcer le pouvoir d'achat et la consommation.</i> <i>Extrant 1301- Les capacités locales sont renforcées pour la reconstruction résiliente des maisons détruites des familles vulnérables, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation des risques ;</i>	Construction de 36 maisons des familles vulnérables détruites par le séisme avec 60% de femmes propriétaires et/ou monoparentales. Réalisation de 4 activités de sensibilisation sur l'égalité de sexe et la violence basée sur le genre; Réhabilitation des infrastructures, l'élimination des débris, la réhabilitation des routes et d'autres services communautaires au niveau de 3 communes. 2,000 personnes pour les activités à haute intensité de Main d'œuvre avec 40% de femmes
Résultat intermédiaire 1310 : La capacité des communes et des organisations communautaires de base à réhabiliter les infrastructures communautaires clés et à gérer leurs systèmes opérationnels pour accroître la résilience en cas de catastrophe est renforcée, tout en tenant compte des priorités de réduction des risques des femmes et des groupes vulnérables.	<i>Extrant 1301- Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations et des familles vulnérables en agissant sur la protection de l'environnement, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation sur la protection de l'environnement</i>	Réhabilitée de 2 infrastructures publiques stratégiques de la Grande 'Anse; Réhabilitation d'une infrastructure publique stratégique (prison de l'Anse-à-veau) des Nippes. Création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants 200,000 plantules produites et 2,000 mètres linéaires ravins traités (traitement mécanique et végétal)

		<p>56 km de pistes agricoles réhabilités avec gravier, pierre et sable</p> <p>1.2 km de canaux en maçonnerie pour évacuer les eaux des mornes</p> <p>460 ml de ravins rectifiés pour faciliter l'évacuation des eaux de pluies</p> <p>Installation de 205 structures de stockage d'eau de pluie.</p>
<p>Résultat immédiat 1320 : La capacité des entrepreneurs et des coopératives et associations de producteurs à rétablir les entreprises, à créer des emplois « verts » et à saisir les opportunités d'activités génératrices de revenus durables est renforcée, en mettant particulièrement l'accent sur le soutien économique des femmes.</p>	<p><i>Extrant 1321- Le relèvement sociale et économique des communautés est accéléré en renforçant les activités génératrices de revenus ou entrepreneuriales grâce aux méthodologies Ann Ale et BBJ et pour récupérer les chaînes de valeur en rétablissant les infrastructures mineures liée à la production ; et la réhabilitation des espaces d'achat d'un groupe de coopérative; ainsi des plantations de café seront régénérées.</i></p>	<p>30 nouvelles entreprises individuelles avec 80% de femmes propriétaires bénéficieront des activités de relèvement économique.</p> <p>Renforcement de capacités de 15 nouvelles coopératives et associations sur la méthodologie Ann Ale, le financement de leurs Plans d'Affaires et un support en marketing avec des matériels visuels.</p> <p>Recapitalisation de 60 petites entreprises du projet touchées par le séisme seront recapitalisées;</p> <p>Réhabilitation 6 infrastructures ou espaces d'achat des coopératives caféières seront réhabilitées</p> <p>Régénération de 150 ha de plantation de café</p> <p>2,000 personnes ont des emplois verts avec 40% de femmes.</p>

VI. PLANIFICATION BUDGETAIRE

Budget Total du Projet

Produits escomptés	Activités planifiées	Partie responsable	Source des fonds	Budget prévisionnel par année			
				Description du budget	Dépenses a Date	Janvier-Dec 2024	Budget Total du Projet
Produit 1 : La durabilité des efforts de relèvement post-Mathieu s'est améliorée, en augmentant la résilience de la population aux catastrophes et en renforçant la redevabilité de l'État en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes.							
Résultat de l'activité 1.1.	1.1.1. Soutenir les activités nationales de réduction des risques, en améliorant la considération des dimensions genre et diversité.	PNUD MPCE	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
Les capacités nationales et locales sont renforcées pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation des efforts de relèvement post-Mathieu qui favorisent la participation des citoyens, l'égalité des sexes, la transparence, la redevabilité et la réduction continue des risques.	-Appui technique et financier à l'imprimerie des PCCM pour diffusion auprès des autorités, partenaires et communautés. - Appui technique et financier à la réalisation des SIMEX.			71600 - Voyages	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00
				72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
				72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
				74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
				71300 - Consultant national	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
				75700 - Formation	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
		1.1.2. La coordination de l'aide assurée par le gouvernement haïtien, notamment celle en lien avec les efforts de relèvement à la suite de catastrophes naturelles, est améliorée	PNUD MPCE	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 92.00	\$8,404.00
- Appui technique au fonctionnement de l'ATLD. - Appui technique et financier à l'imprimerie des PCD.	72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00	
	74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00	

	- Appui technique a la vulgarisation et l'utilisation des PCD dans les communes.			71300 - Consultant national	\$ -	\$5,000.00	\$ 5,000.00
	1.1.3. Appui au système carcéral de deux départements, le Sud et la Grande.	PNUD MPCE	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ -	\$44,500.00	\$ 44,500.00
	-Appui financier a la réhabilitation de deux prisons dans les départements des Nippes et de la Grande Anse			71600 - Voyages	\$ -	\$7,000.00	\$ 7,000.00
	- Réhabilitation des infrastructures publiques détruites par le séisme			72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 207,120.62	\$20,039.69	\$ 227,160.31
				72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ -	\$7,000.00	\$ 7,000.00
				74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ -	\$1,400.00	\$ 1,400.00
				71300 - Consultant national	\$ -	\$7,000.00	\$ 7,000.00
	Sous-total Résultat 1				\$ 379,712.62	\$ 100,443.69	\$ 480,156.31

Produit 2 : L'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.

Résultat de l'activité 2.1.	2.1.1. Quatre communes sont renforcées par le biais des chaînes de valeurs identifiées et de l'appui technique à 33 coopératives et 240 entreprises	PNUD	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 78,458.20	\$ 41,541.80	\$ 120,000.00
Le relèvement sociale et économique des communautés est accéléré en renforçant les activités génératrices de revenus ou entrepreneuriales grâce aux méthodologies Ann Ale et BBJ et pour	- Appui financier a un groupe d'entreprises individuelles dans les communes touchées par le séisme bénéficiant des premières actions du projet.			71600 - Voyages	\$ 9,397.65	\$ 10,602.35	\$ 20,000.00
	- Appui financier a un groupe de coopératives bénéficiant des premières actions du projet			72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
	-Appui technique et financier d'un			72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 140,947.93	\$ 315,052.07	\$ 456,000.00

récupérer les chaînes de valeur en rétablissant les infrastructures mineures liées à la production	nouveau groupe d'entreprises individuelles			71300 - Consultant national	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
				75700 - Formation	\$ 10,541.75	\$ 21,458.26	\$ 32,000.01
	2.1.2. La création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants - Production et transplantation des arbres fruitiers et forestiers - Création d'emplois verts dans les communes - Facilitation des travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre - Régénération des plantations caféières - Traitement et correction de ravins - Appui technique et financier à la réhabilitation de six coopératives	PNUD	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
				71600 - Voyages	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00
				72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 430,000.00
Sous-total Résultat 2					\$ 527,345.53	\$ 610,654.48	\$ 1,138,000.01


Produit 3 : Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.

Résultat de l'activité 3.1.	3.1.1. Reconstruction des maisons détruites dans les 3 communes	PNUD	MAEC	71400 - Contrats de service	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 75,000.00
Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations et des familles vulnérables en agissant sur la protection de	- Appui technique et financier à la reconstruction de certaines maisons détruites par le séisme du 14 Aout 2021			71600 - Voyages	\$ 5,226.60	\$ 9,773.40	\$ 15,000.00
				72100 - Contrats de travaux signés avec les entreprises	\$ 119,229.59	\$ 680,770.41	\$ 800,000.00
				74200 - Film, impression publicitaire et traduction	\$ 3,350.00	\$ 6,650.00	\$ 10,000.00
				71300 - Consultant national	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00

l'environnement, tout en impliquant les autorités locales dans la planification et la sensibilisation sur la protection de l'environnement ;	3.1.2. Formation des cadres des mairies, visibilité communication	PNUD	MAEC	71600 - Voyages	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
	- Soutien à l'organisation des ateliers de travail au profit des cadres des mairies sur l'occupation des espaces géographiques par les populations			72200 - Achat d'équipements et de fournitures	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
	- Support financier aux mairies dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la problématique de l'environnement			71300 - Consultant national	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
				75700 - Formation	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00
	Sous-total Résultat 3					\$ 178,806.19	\$ 761,193.81
	Assurance qualite	PNUD	MAEC		\$48,310.08	\$ 4,000.00	\$52,310.08
	Frais generaux de fonctionnement				\$8,619.22	\$ 2,000.00	\$ 10,619.22
	Suivi				\$14,897.96	\$ 4,000.00	\$ 18,897.96
	Communication				\$11,172.74	\$ 4,000.00	\$ 15,172.74
	Evaluation finale				\$0.00	\$25,000.00	\$ 25,000.00
	Audit				\$43,066.64	\$10,000.00	\$ 53,066.64
	Sous-total					\$126,066.64	\$ 49,000.00
	Sous-total 1+2+3			\$1,248,208.03	\$ 1,521,291.98	\$2,769,500.01	
	Coûts indirects (8%)			\$ 99,856.64	\$ 121,703.36	\$221,560.00	
	BUDGET TOTAL			\$ 1,348,064.67	\$ 1,642,995.34	\$2,991,060.01	

Formation des cadres des mairies, visibilité communication	Atelier de travail et sensibilisation des populations sur la problématique de l'environnement												
Axe 3. RELEVEMENT ECONOMIQUE DURABLE													
L'appui technique à 33 coopératives et 240 entreprises	Appui financier aux entreprises individuelles et coopératives qui ont bénéficiées les premières actions du projet												
	Appui technique et financier d'un nouveau groupe d'entreprises individuelles												
La création d'emplois verts et la protection de l'environnement par le biais des activités de reboisement et de gestion de bassins versants	Production et transplantation des arbres fruitiers et forestiers												
	Création d'emplois verts dans les communes												
	Facilitation des travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre												
	Régénération des plantations caféières												
	Traitement et correction de ravins												
Reconstruction des maisons détruites dans les 3 communes	Appui technique et financier à la reconstruction de 36 maisons détruites par le séisme du 14 Aout 2021												

VIII. MODELE LOGIQUE DU PROJET

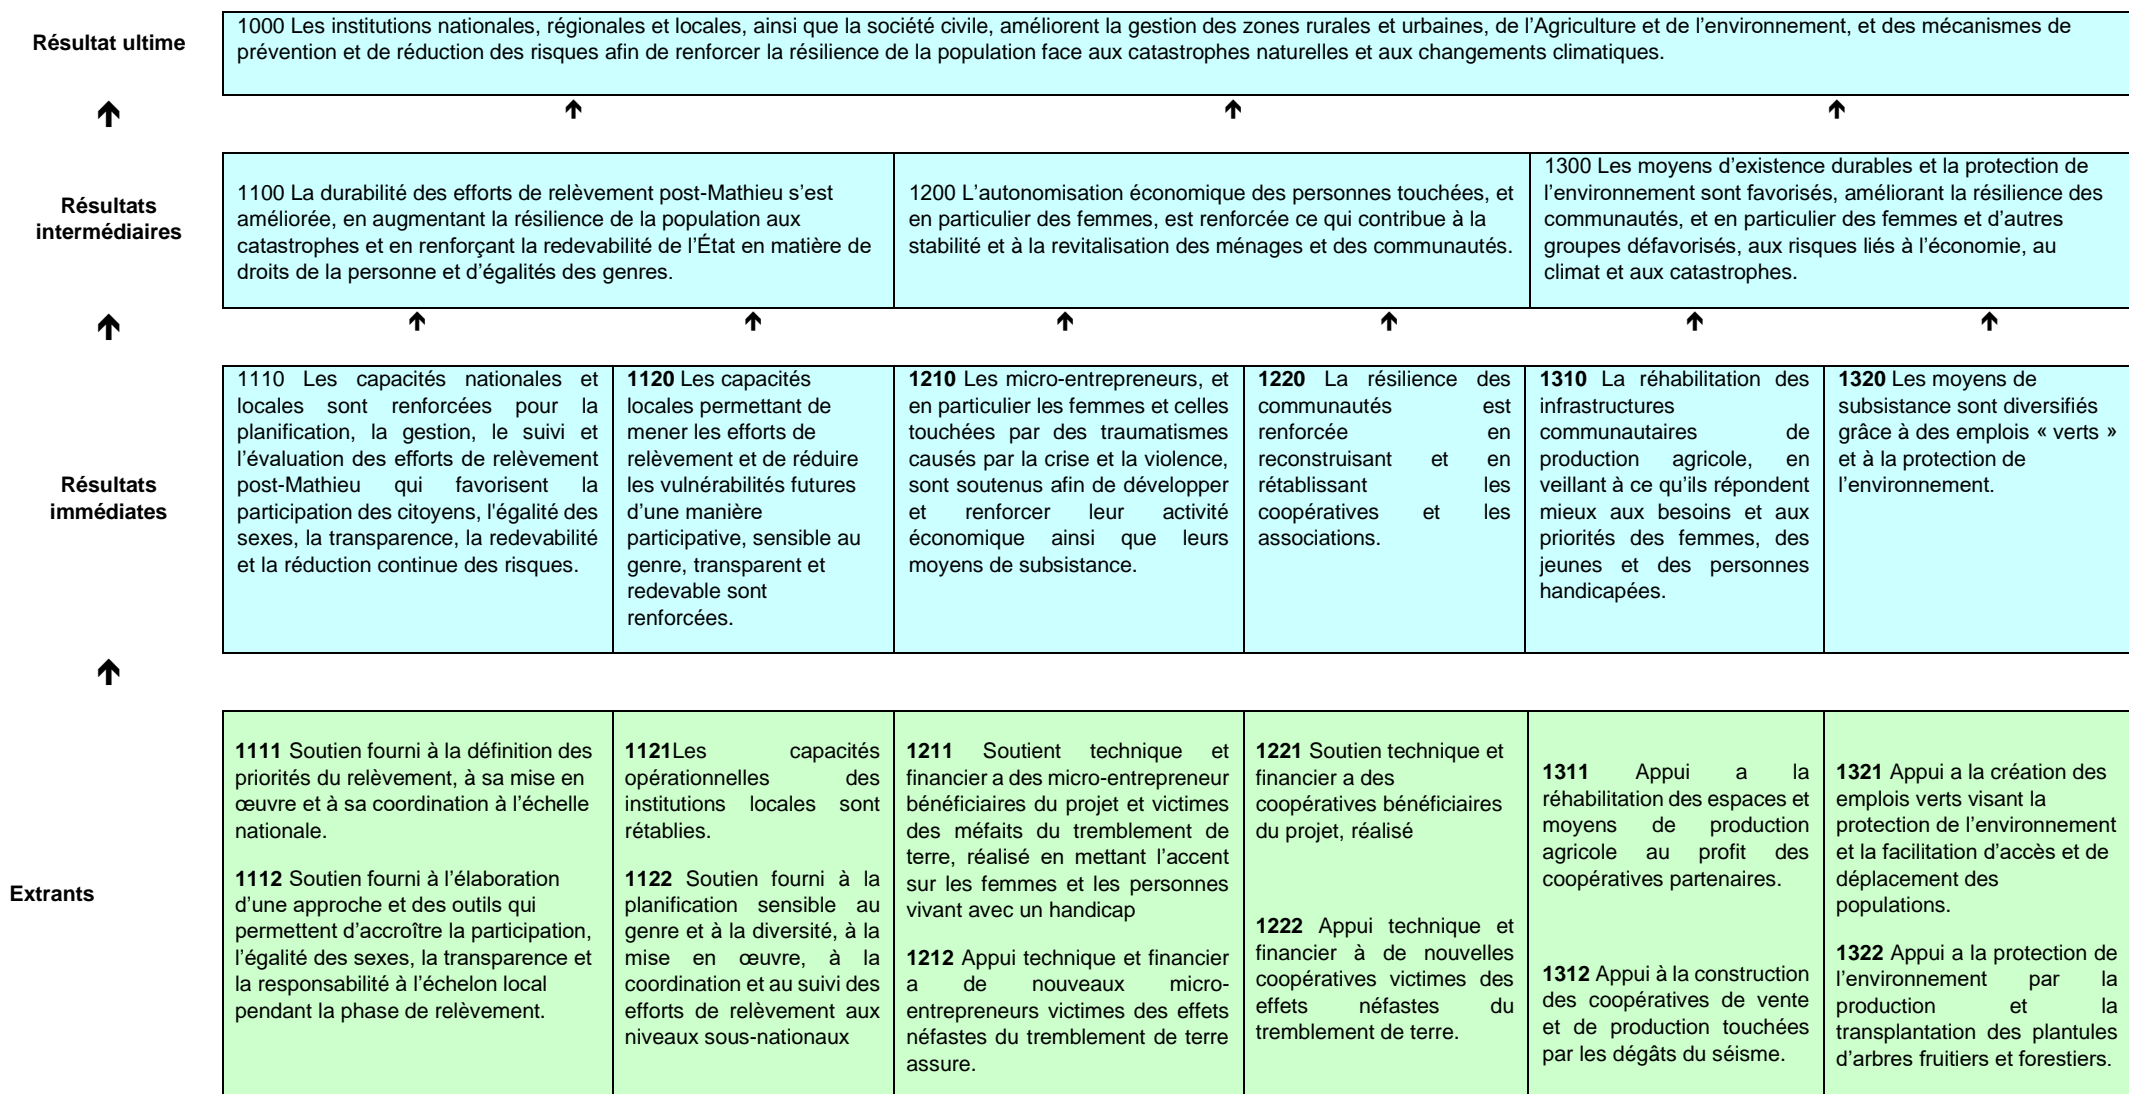

XIV. RISQUES ET MESURES DE MITIGATION

Le projet repose sur le postulat que les institutions nationales et internationales impliquées ont la capacité de travailler conjointement afin d'atteindre les résultats escomptés du projet. Cependant, certains risques pourraient impacter considérablement la mise en œuvre du projet incluant :

- La récurrence des troubles sociaux politiques qui implique souvent des manifestations et des blocages des routes ;
- La crise sanitaire de la Coronavirus.
- La crise liée aux raretés de carburant ;
- La situation de sécurité très précaire rendant la route nationale numéro 2 impraticable

Le tableau ci-dessous fait une récapitulation des différents risques que le projet fait face et les mesures de mitigation qui ont été prises ; l'impact de l'un est beaucoup plus considérable que d'autre.

#	Description	Catégorie du risque	Impact & Probabilité	Actions proposées/ Solution de gestion
1	Troubles sociaux politiques (manifestation et blocages des routes)	Politique Sécuritaire	Les résultats escomptés et notamment les travaux de terrain seront retardés. P = 3 I = 2	1. Suivre la situation dans le département et revoir régulièrement le déroulement des activités du projet par rapport au contexte. 2. Recentrer les résultats à atteindre si nécessaire. 3. Travailler à distance si le bureau est inaccessible. 4. Différer les travaux de terrain en priorisant les activités en salles le temps du retour à la normale.
2	Incapacités des firmes et de prestataires de se rendre disponibles pour venir en Haïti à cause de la Pandémie	Crise sanitaire Opérationnel	Blocage des activités pouvant engendrer un retard dans la mise en œuvre des activités qui pourrait être difficilement rattrapable P=3 I=4	1.Encourager des firmes compétentes ayant des vis-à-vis au niveau national dans les domaines recherchés pour consultation.
3	Manque d'implication des partenaires nationaux dans l'exécution des tâches sous leur responsabilité	Opérationnel Stratégique	Retard dans l'exécution des activités et produits dépendant de ces tâches ; manque d'appropriation du projet et des résultats escomptés P=2 I=2	1.Impliquer les institutions pertinentes dès la phase de conception du projet afin de garantir un engagement fort. 2.Continuer à impliquer ces institutions dans tous les axes du projet et la prise de décisions afin d'assurer l'appropriation nationale et la responsabilisation des acteurs. 3.Élaborer un plan de communication et de sensibilisation autour du projet, ainsi qu'un

				plaidoyer spécifique pour les institutions affichant une faible implication
4	Nouvelle catastrophe/crise humanitaire pouvant rendre difficile la mise en œuvre des activités.	Environnemental Opérationnel Stratégique	Mobilisation prolongée des acteurs et des ressources des partenaires gouvernementaux, en particulier le Système national de gestion des risques et désastres, pour répondre à l'urgence ; affaiblissement des capacités nationales et locales ; inaccessibilité temporaire de certaines zones d'intervention du projet. P = 3 I = 3	Conjointement avec la contrepartie nationale, ajuster la priorisation et la planification de manière à concilier la gestion de l'urgence et les résultats à réaliser dans le cadre du projet. Poursuivre la mobilisation de ressources avec les autorités gouvernementales au plus haut niveau pour faire face aux nouveaux besoins éventuels.
5	Augmentation exagérée du niveau général des prix.	Financier	Manque de fonds pour exécuter les actions programmées à la fin du projet I= 3 P=2	S'assurer de mettre en œuvre les activités suivant un calendrier très serré et adapter le plan d'action au regard de la situation socio-économique du pays. Identifier en continu les synergies et les opportunités de mutualisation des coûts avec d'autres projets/activités du PNUD et/ou d'autres partenaires.

XV. ANNEXE 1 : PLAN PROCUREMENT-PROJET RELEVEMENT POST CATASTROPHE

Data to be provided/completed by Program/Project													
#	Project name	Project ID	Type of supply	High level categorization	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of Activity	Responsibility authorities	Comments
1	Relèvement Post Catastrophe	00131469	Construction civile	Régulier	Construction de 36 maisons	Contrat	8 mois	19,794.3	800,000.00	800,000.00 USD	Décembre 2024	Chef de projet	Contrat avec firme de construction
2	Relèvement Post Catastrophe	00131469	Supervision des travaux	Régulier	Supervision des travaux de Construction de 36 maisons	Contrat	8 mois		46,755.70	46,755.70	Décembre 2024	Chef de projet	Contrat avec firme de supervision
3	Relèvement Post Catastrophe	00131469	Service	Régulier	Surveillance environnementale	Contrat	8 mois	5,581.2	44,649.23	44,649.23	Décembre 2024	Chef de projet	Contrat avec firme de supervision
4	Relèvement Post Catastrophe	00131469	Service	Régulier	Remédiation environnementale et relèvement économique	Contrat	10 mois	36,000.00	360,000.00	360,000.00	Décembre 2024	Chef de projet	Contrat avec ONG local et/ou Association

ANNEXE 3 - PLAN DE RECRUTEMENT :

UNITE : ISDE

NOM DU PROJET : Relèvement Post Catastrophe

PROJECT ID : 00131469

#	Titre du poste	Type de contrat (SC, FTA, TA)	TDR suivant format disponible (oui/non)	Durée du contrat (mois)	Titre du Superviseur	Date désirée d'entrée en fonction	Niveau du poste	Cout Proforma annuel	Code Quantum à débiter											
									GL Unit	Acct	Description	Oper. Unit	Fund	Donor	Dept	Impl. Agent	BU	Project	Activity	Activity Name
1	Assist Admin	NPSA	oui	12	Chef de projet	Février 2024	8	20000	UNDP	71600	Voir TDR Assist Adm	HTI	30000	00078	50803	1981	HTI10	00131469	3	Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations
2	Coordinateur livelihood	NPSA	oui	12	Chef de projet	Février 2024	9	32000	UNDP	71600	Voir TDR	HTI	30000	00078	50803	1981	HTI10	00131469	3	Renforcement des capacités locales pour la reconstruction de la résilience des populations

Durée min / max des contrats	
Durée minimale pour SC	6 mois
Durée minimale pour FTA	12 mois
Durée maximale pour TA	364 jours prolongation exceptionnelle
Durée maximale IC	XX?

Délais de recrutement	
SC	53 jours
FTA	66 jours
TA	66 jours
SSA	11 à 41 jours

ANNEXE 4 – PLAN DE COMMUNICATION

Nom du projet : Relèvement Post-Catastrophe											
Project ID : 00131469											
Unité : ISDE											
TENDANCE/PERCEPTION		STRATEGIE A ADOPTER		CIBLES	INDICATEURS	RESPONSABLES	CADRE CHRONOLOGIQUE				BUDGET PREVISIONNEL
ACTUELLE	SOUHAITEE	ACTIVITES PREVUES	CANAL				T1	T2	T3	T4	
Perception que le CFW est une solution financière ad hoc pour les bénéficiaires, mais pas une solution de création d'emplois durables.	Les projets de « moyens de subsistance » sont perçus non pas comme du CFW ponctuel mais comme une approche de création d'emplois durable pour les bénéficiaires	Cf. Unité communication	Cf. Unité Communication	Les autorités locales et les populations des 3 communes prioritaires	<i>Perception (sur la base d'une étude de perception) / sondage (n % de personnes interviewées ayant changé leur perception</i>	Equipe du projet + unité communication					Sondage : 10,000 US\$
Dans certaines communes notamment Pestel la perception est que le projet n'implique pas les acteurs locaux dans la planification des activités ce qui a permis aux firmes sélectionnées de remettre des travaux de mauvaise qualité.	Le projet agit dans la transparence avec l'implication de tous les acteurs depuis l'indentification des activités, passant par la mise en œuvre jusqu'à la réception des travaux.	Cf. Unité communication	Cf. Unité Communication	Population des communes de Pestel, Beaumont et Corail	<i>Perception (sur la base d'une étude de perception) / sondage (n % de personnes interviewées ayant changé leur perception</i>	Toute l'équipe du projet					Sondage : 10,000 US\$

ANNEXE 5 – MATRICE DE SUIVI DU PROJET

Résultats escomptés	Indicateurs	Suivi et évaluation avec méthodes de collecte de données	Calendrier et fréquence	Responsabilités	Moyens de vérification : source et type de données	Ressources	Risques
L'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des femmes, est renforcée, ce qui contribue à la stabilité et à la revitalisation des ménages et des communautés.	2.1 Proportion des femmes bénéficiaires des activités « cash-for-work » ayant augmenté leur pouvoir décisionnel de dépenses domestiques grâce à l'argent reçu	Visite sur le terrain, étude au niveau des ménages bénéficiaires du projet	Trimestriel	Responsable de suivi évaluation	Rapports, visite sur le terrain, enquêtes	Budget pour mission d'évaluation sur le terrain + sondage	Restrictions en raison de la situation sécuritaires, manque de budget pour la réalisation de cette activité.
	2.2 Proportion des bénéficiaires des activités « cash-for-work » ayant utilisé l'argent reçu pour relancer et/ou démarrer une activité génératrice de revenu	Visite sur le terrain, étude au niveau des ménages bénéficiaires du projet	Trimestriel	Responsable de suivi évaluation	Rapports, visite sur le terrain, enquêtes	Budget pour mission d'évaluation sur le terrain + sondage	Restrictions en raison de la situation sécuritaires, manque de budget pour la réalisation de cette activité.
Les moyens d'existence durables et la protection de l'environnement sont favorisés, améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres groupes défavorisés, aux risques liés à l'économie, au climat et aux catastrophes.	Proportion d'associations et de coopératives appuyées ayant augmenté leur revenu et/ou ayant renforcé leur intégration dans le marché après décapitalisation	Visite sur le terrain, évaluation au niveau des structures bénéficiaires des subventions du projet.	Mensuel	Responsable de suivi évaluation	Rapports, visite sur le terrain, enquêtes	Budget pour mission d'évaluation sur le terrain + sondage	Restrictions en raison de la situation sécuritaires, manque de budget pour la réalisation de cette activité.

ANNEXE 6A – LISTE DE CONTROLE REVISEE POUR L'APPLICATION DU MARQUEUR DU GENRE DU PNUD CONCEPTION DU PROJET / PRE-EVALUATION (Avant l'approbation en ATLAS)

Critères		P	Valeur du Point	Points Totaux	Preuves / Observations
1. Niveau des résultats	Un résultat d'égalité des sexes est explicitement reflété au niveau de l'extrant.		2	1	
	Au moins un résultat d'égalité des sexes reflété explicitement au niveau des résultats de l'activité.		1.5		
	Les considérations d'égalité des sexes sont intégrées au niveau des activités.	1	1		
	Les considérations d'égalité des sexes n'ont pas été intégrées à aucun niveau.		0		
2. Analyse	L'extrant est basé sur une analyse de genre qui répond aux normes minimales ³ du bureau-pays.		2	0	
	Les activités pour cet extrant sont liées à des stratégies concrètes visant à minimiser les contraintes basées sur le genre (CBGs) et de maximiser les opportunités basées sur le genre (OBGs⁴) , tel qu'indiqué dans l'analyse de genre de projet.		1		
	L'extrant est basé sur une analyse de genre qui ne répond pas aux normes minimales ⁵ du bureau-pays.		0.5		
3. Indicateurs	L'extrant ne tient pas compte d'une analyse de genre, ou une analyse de genre n'a pas été complétée.		0	5	
	L'extrant comprend un mélange d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs sensibles au genre ⁶ afin de mesurer les résultats liés à l'égalité des sexes.	3	3		
	Au moins un tiers des indicateurs pour cet extrant sont sensibles au genre ⁷ , et peuvent effectivement suivre les résultats liés à l'égalité des sexes.	2	2		
	Moins d'un tiers des indicateurs pour cet extrant sont sensibles au genre, et peuvent effectivement suivre les résultats liés à l'égalité des sexes.		1		
4. Expertise en ES	Les indicateurs pour cet extrant ne sont pas sensibles au genre et ne traitent pas des résultats liés à l'égalité des sexes.		0	2	
	Des organisations et/ou des réseaux qui se concentrent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ont participé à l'élaboration de cet extrant et ses activités.		1		
	Le/La spécialiste en égalité des sexes du bureau-pays a été consulté pour la conception de cet extrant, de ses activités et de ses indicateurs.	1	1		
	Au niveau du programme, un point focal pour l'égalité des sexes a été assigné pour assurer l'intégration de l'égalité des sexes à travers la mise en œuvre de l'extrant.	1	1		
5. Budget	Les experts en égalité des sexes n'ont pas été consultés dans la planification de cet extrant, de ses activités ou de ses indicateurs.		0	1	
	Plus de 40% des ressources pour cet extrant ont été allouées pour des activités qui répondent aux contraintes/opportunités basées sur le genre.		3		
	Entre 15% et 40% des ressources pour cet extrant ont été allouées pour des activités qui répondent aux contraintes/opportunités basées sur le genre.		2		
	Moins de 15% des ressources pour cet extrant ont été allouées pour des activités qui répondent aux contraintes/opportunités basées sur le genre.	1	1		
6. S&E	Aucune ressource pour cet extrant n'a été allouée pour des activités répondant aux contraintes/opportunités basées sur le genre.		0	2	
	Le plan de suivi et d'évaluation du projet comprend une évaluation de l'impact sur l'égalité des sexes, qui est liée avec cet extrant.	1	1		
	La méthodologie de monitoring et d'évaluation sensible au genre a été explicitement définie pour la mesure de cet extrant.		1		
	Toutes les données pour la mesure de cet extrant sont ventilées par sexe, sauf dans le cas où il y a une raison valable pour ne pas les désagréger.	1	1		
Les données pour la mesure de cet extrant ne sont pas ventilées par sexe et/ou les méthodes de suivi et d'évaluation ne sont pas sensibles au genre.					0
TOTAL VALEUR DE POINTS				12	
NOTE DE MARQUER DU GENRE					
18+ points total = GEN 3					
12 – 18 points total = GEN 2					
6 – 12 points total = GEN 1					
0 – 6 points total = GEN 0					

³ Pour des indications supplémentaires sur les **normes minimales du bureau-pays pour l'analyse de genre**, voir la Tipsheet # 3 : Réalisation d'une analyse de genre

⁴ Pour une explication élargie des **CBGs** et des **OBGs**, voir la Tipsheet # 3 : Réalisation d'une analyse de genre.

⁵ Voir la note 2 ci-haut.

⁶ Pour une description complète des indicateurs sensibles au genre et des exemples, voir la Tipsheet # 2 : Indicateurs sensibles au genre

⁷ Voir la note 4 ci-haut.

ANNEXE 6B – LISTE DE CONTROLE REVISEE POUR L'APPLICATION DU MARQUEUR DU GENRE DU PNUD : MISE EN ŒUVRE / CLOTURE DU PROJET

Critères		ü	Valeur du Point	Points Totaux	Preuves / Observations
1. Dépenses	Plus de 40% des ressources pour cet extrant ont été dépensées pour des activités qui répondent aux contraintes / opportunités basées sur le genre.		3	1	
	Entre 15% et 40% des ressources pour cet extrant ont été dépensées pour des activités qui répondent aux contraintes / opportunités basées sur le genre.		2		
	Moins de 15% des ressources pour cet extrant ont été dépensées pour des activités qui répondent aux contraintes / opportunités basées sur le genre.	1	1		
	Aucune ressource pour cet extrant n'a été dépensée pour des activités répondent aux contraintes / opportunités basées sur le genre.		0		
2. Expertise en ES	Des organisations et / ou des réseaux qui se concentrent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ont activement participé (en tant que parties prenantes et/ou en tant que partenaires) dans la mise en œuvre de cet extrant.		1	1	
	Un point focal pour l'égalité des sexes a été activement impliqué pour assurer l'intégration de l'égalité des sexes à travers la mise en œuvre de cet extrant.		1		
	Le/La spécialiste en égalité des sexes du bureau-pays a activement participé dans le suivi et l'évaluation des résultats pour cet extrant.	1	1		
	Les experts en égalité des sexes n'ont pas participé dans la mise en œuvre, le suivi ou l'évaluation de cet extrant.		0		
3. Résultats	Les résultats en matière d'égalité des sexes ont été obtenus pour cet extrant dans un ou plusieurs des domaines d'intervention ⁸ suivants : <ol style="list-style-type: none"> 1. Amélioration des droits des femmes et/ou des filles ; 2. Diminution des inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès aux et le contrôle des ressources et des avantages du développement ; 3. Une participation plus équitable des femmes et des hommes dans la prise de décision et de leadership ; 4. Réduction de la discrimination dans les croyances, les perceptions et les normes sociales sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons. 	1	1	3	
	Il existe des preuves solides pour démontrer les résultats de l'égalité des sexes obtenus dans le cadre de cet extrant (les indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs pour cet extrant démontrent le changement).	1	1		
	La portée des résultats en matière d'égalité des sexes pour cet extrant est significative. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Un grand nombre de femmes et/ou d'hommes bénéficient des résultats ; • Une proportion égale des femmes et des hommes bénéficient des résultats ; • Une amélioration significative de la politique ou de la capacité institutionnelle en matière d'égalité des sexes a été atteinte. 	1	1		
	Les résultats d'égalité des sexes n'ont pas été atteints pour cet extrant.		0		
TOTAL VALEUR DE POINTS				5	
NOTE DE MARQUER DU GENRE 9+ points = GEN 3 6 - 9 points = GEN 2 3 - 6 points = GEN 1 0 - 3 points = GEN 0					

⁸ Pour une description complète des quatre dimensions de résultats pour l'égalité des sexes et des exemples, voir la Tipsheet # 1 : Résultats pour l'égalité des sexes.
