



PV réunion comité de pilotage

Projet « Renforcement des capacités nationales pour le respect des obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités du développement durable », CCCD-Conventions de Rio

Objet de la réunion : Réunion du Comité de pilotage, au titre de l'exercice 2020

Date : 10 décembre 2020

Lieu : Relais de la haute ville

Participants : Cf. Fiche de présence


1. Déroulement de la réunion,

Après les mots de bienvenue et d'ouverture prononcés par le Directeur National du Projet, et les séances de présentation des participants, le coordonnateur du projet a procédé à la présentation de l'état d'avancement du projet, de la proposition de projection jusqu'en 2023, et de la perspective 2021, telle que proposé lors de l'atelier de planification du Groupe De Travail Technique (GDTT), tenu le 8 décembre 2020.

1.1. Présentation du projet

L'objectif du projet est de « Renforcer un ensemble ciblé de capacités nationales pour fournir et maintenir des résultats environnementaux mondiaux dans le cadre des priorités de développement durable ».

Il importe d'élargir l'espace « Dd » de la figure 1 pour que le développement soit durable et considère



de façon harmonisée les dimensions sociales, économiques et environnementales. Pour y parvenir, le projet contribuera à agrandir la place de l'environnement (cercle « Env »), jusqu'ici très peu considérée, à travers des actions de renforcement des capacités systémiques, institutionnelles et individuelles nationales à assurer son intégration à tous les niveaux. Considérant la place des

conventions de Rio dans les enjeux des obligations environnementales mondiales et du développement durable en général, le projet en fait sa cible principale.

Le projet s'articule autour de cinq composantes essentielles :

Composante 1 : Une stratégie/plan national de développement durable intègre pleinement les obligations des Conventions de Rio

Composante 2 : La mobilisation des ressources financières est plus durable.

Composante 3 : Un SIGE est en place

Composante 4 : Structures et mécanismes institutionnels renforcés

Composante 5 : Sensibilisations et Educations Environnementales

Le projet a commencé en juillet 2017, pour un délai de mise en œuvre de cinq ans. Il est donc prévu se terminer en juillet 2020, avec un budget total de 2 100 000 USD.

Le projet CCCD-Conventions de Rio, est exécuté par le Ministère de l'Environnement, du Développement Durable (MEDD), avec l'appui technique et financier du PNUD et du GEF.

1.2. Etat d'avancement du projet


Jusqu'au 15 novembre 2020, le projet a consommé

Le tableau suivant présente les principales réalisations par composante depuis le lancement du projet.

Composantes	Réalisations
Composante 1	<ul style="list-style-type: none">- Les études du cadre politique des trois conventions sont réalisées, mais il y a lieu de faire une analyse consolidée et ressortir des recommandations consolidées- Les études sur le cadre légal du secteur extractif sont réalisées, et on a besoin de ressortir une stratégie et un plan de mise en œuvre des plaidoyers pour la prise en compte des écarts à combler pour une meilleure prise en compte des obligations environnementales mondiales- Une base de données des textes législatifs et légales sur l'environnement existe.
Composante 2	<ul style="list-style-type: none">- Les études des systèmes financiers et canaux de financement sur l'environnement existe.- Une proposition de stratégie de mobilisation de ressources financières sur l'environnement existe, mais le processus de validation n'a pas encore abouti (Il reste la réunion de la commission technique élargie)
Composante 3	<ul style="list-style-type: none">- Une étude préliminaire sur les systèmes d'information existants est réalisée.- Des matériels pour la mise en œuvre pilote du SIGE sont disponibles
Composante 4	<ul style="list-style-type: none">- Une étude préliminaire des systèmes de coordination et d'intégration des conventions de Rio existe.- Une proposition de stratégie de renforcement du CIME et des CES existe, mais a besoin d'une concertation avec une commission technique plus large
Composante 5	<ul style="list-style-type: none">- Des activités de sensibilisation sont réalisées : Participation à des événements liés à la célébration des journées internationales- Des formations sont réalisées dans le processus de sensibilisation et de formation en cascade ;- Un cadre de partenariat avec la fédération des associations des femmes d'Itasy est défini- Un cadre de partenariat avec l'université de Toamasina est établi pour la mise en place d'une mention sur le développement durable

Composantes	Réalisations
	- Les outils et une proposition de stratégie de sensibilisation et d'information existent, mais a besoin d'une concertation plus large

Se référant au document du projet, il est préconisé que la durabilité globale du projet repose sur l'importance accordée à la gestion collaborative adaptative, qui accorde une grande valeur à l'engagement des parties prenantes. Dans ce cadre, l'approche de renforcement des capacités prônée par le projet au niveau de chaque composante, comprendra nécessairement les étapes suivantes, pour l'atteinte de l'objectif d'intégration durable des conventions de Rio: (i) Analyse de l'existant pour ressortir les recommandations d'amélioration, (ii) développement d'outils et de mécanismes tenant compte des recommandations, (ii) mise en œuvre précoce des outils et mécanismes (pilote), (iii) test de pertinence et efficacies des outils et mécanismes, (iv) révision/réadaptation progressive des outils et mécanisme.

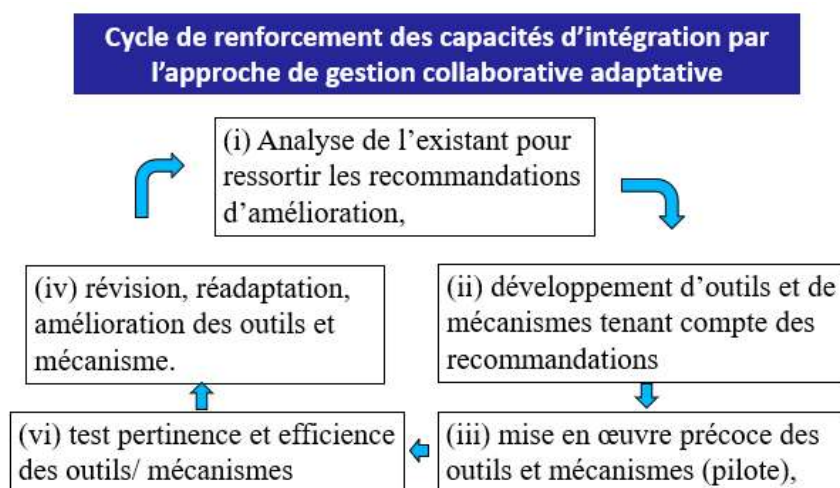

La phase d'analyse devrait être bouclée avant la fin de l'année 2020 pour pouvoir commencer le cycle de développement et de mise en œuvre précoce des outils et mécanismes en 2021, et de terminer le processus avec la phase de test et réadaptation, en 2022. Compte tenu du retard lié à la vacance du poste de coordonnateur et au COVID-19, une partie de la phase d'analyse, surtout les analyses au niveau des régions ainsi que la consolidation des recommandations n'a pas pu être réalisée en 2021 pour l'ensemble des composantes sauf pour la deuxième composante relative à l'analyse des systèmes de financement.

2. Proposition de prolongation sans coût

Pour permettre de boucler le cycle de renforcement des capacités préconisé, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre des activités, une prolongation sans coût supplémentaire pour emmener le projet jusqu'en fin 2023, au lieu de Juillet 2022, est proposée.

Dans la proposition, 2021 sera consacrée à la finalisation des études préalables et des recommandations consolidées, au développement et à la mise en œuvre « précoce » des outils et mécanismes d'intégration des conventions de Rio et à la mise en place d'une partie des mécanismes de test et de collecte de bonnes pratiques, avec le système de renforcement des capacités. En 2022,

verra la poursuite de la mise en place des mécanismes, surtout dans certaines régions pilotes, la poursuite des actions de renforcement des capacités et des actions de sensibilisation/communication, le suivi et le début de l'évaluation de l'opérationnalité et de la pertinence des mécanismes. L'année 2023 sera consacrée à l'évaluation des mécanismes, la mise en œuvre des actions de redressement et d'amélioration, et communication des bonnes pratiques pour la mise à l'échelle, et la consolidation de la stratégie de sortie, pour la pérennisation des résultats.

La répartition budgétaire suivante est proposée à cet effet :

COMPOSANTES	TYPE D'ACTIVITE	2021	2022	2023
COMPOSANTE 1	Cadre politique et légale d'intégration	52 250	19 650	44 950
COMPOSANTE 2	Mobilisation durable des ressources	45 690	58 940	23 370
COMPOSANTE 3	SIGE	130 650	65 500	107 890
COMPOSANTE 4	Structures et mécanismes institutionnels renforcés	130 650	32 750	53 980
COMPOSANTE 5	Sensibilisations et Educations Environnementales	84 930	157 190	90 590
COMPOSANTE 6	Fonctionnement	75 770	75 970	35 950
TOTAL GENERAL		519 940	410 000	356 730

TOTAL : **1 286 670 USD**

3. Proposition de zones d'intervention

Il a été retenu des expériences passées du projet, qu'il n'est pas envisageable d'intervenir dans toutes les régions de Madagascar. Il est donc proposé de circonscrire l'intervention du projet dans quelques régions pilotes pour y tirer le maximum de bonnes pratiques avec une perspective de partage pour leur mise à l'échelle. Les Régions suivantes, tenant compte de leurs spécificités par rapport à la biodiversité, le changement climatique, la désertification et la dégradation de sol, sont proposées dans ce cadre :

- Région d'Atsinanana,
- Région de Vakinankaratra,
- Région d'Itasy,
- Région de Boeny.

4. Perspective 2021

Par rapport à la proposition de perspective 2021, les recommandations suivantes ont été soulevées :

- Impliquer la nouvelle Direction de renforcement pédagogique (DCRP) au sein du MEN est en charge de développement de module de formation, pour l'intégration des dimensions environnementales dans les curricula et les programmes de formation.
- Mettre à profit les accords cadre signés avec le MEN et le MESUPRES.
- Prendre en compte dans le processus de finalisation de la stratégie de mobilisation de ressources le mécanisme de financement au niveau du changement climatique (BNCCC), et s'y inspirer pour la diversité biologique et la désertification.

- Elargir le cercle de concertation sur le SIGE et prévoir une analyse de faisabilité du système proposé.
- Pour le renforcement des CES, prendre contact avec l'ONE et l'USAID, qui intervient dans ce cadre ;
- Pour la célébration des journées mondiales, il faut développer un modèle d'organisation (Guide) de célébration pour un meilleur ciblage des interventions en fonction des thématiques retenues pour les journées ;
- Dans le développement des cadres de concertation, prendre en compte l'existence des commissions techniques existantes dans les secteurs forêt et mines.
- Pour les campagnes de plaidoyer au niveau des deux chambres, cibler les commissions environnement de l'ANP et les impliquer dans les réflexions.

RESOLUTIONS DU COMITE DE PILOTAGE

A l'issue des échanges, le comité de pilotage :

- Approuve le plan d'action proposé, sous réserve de prise en compte des recommandations émises ;
- Accorde la prolongation jusqu'en décembre 2023 ;
- Approuve la proposition de Régions d'intervention pilote.

La réunion a été levée à 12h30.

Pour la partie nationale	Pour le PNUD

ANNEXE

Proposition de PTA 2021

Activités	Sous-activités	Inputs
COMPOSANTE 1		
1.1 Analyse des politiques sectorielles par rapport aux Conventions de Rio		
1.1.1. Formulation des recommandations par rapport aux résultats des analyses politiques	-Consolider les recommandations issues des 3 conventions avec le plus de détails possibles et explicatifs	-Consultant -Réunion en ligne -Réunion ville
1.1.2. Accompagnement de la mise en œuvre des recommandations	-Mettre en place les cadres de partenariat pour faciliter les échanges, les concertations et les réunions en ligne avec la partie prenantes	-LOA/Small grants/Consultants -Déplacement -Ateliers
	-Développer un projet commun entre les conventions de Rio	
	-Elaborer et exécuter le plan de mise en oeuvre des recommandations	reunion de consultation
	Faire une analyse des criteres de choix de secteur prioritaire sur la base de la politique générale de l'Etat	Reunion de consultation
	Accompagner l'élaborer une stratégie nationale de développement durable tenant compte les trois conventions	
1.2 Mises à jour des textes législatifs clés		
1.2.1. Analyses transversales des textes environnementaux par rapport aux autres secteurs	- Faire l'analyse transversale des textes environnementaux par rapport aux secteurs prioritaires suivants : Secteur marin et côtier, secteur urbain, secteur agriculture, élevage et forêt. (A définir selon les criteres definis??) -Faire une analyse des textes existants concernant les grands projets infrastructurels	-Consultant -Réunion en ligne -Réunion Ville -Emission radio-télé -Déplacement
1.2.2. Formulations de recommandations par rapport aux besoins de mises à jour de textes	-Organiser une reunion de consultation des secteurs concernes -Compléter les recommandations sur les textes à mettre à jour -Faire des propositions d'amandement ou de projets de texte	
	-Elaborer les outils de communication et de plaidoyer	
1.2.3. Appui à la conduite des plaidoyers (Montage et mise en œuvre projet de plaidoyer)	-Elaborer et mettre en oeuvre un projet commun de plaidoyer	
1.2.4. Appui aux diffusions et applications des textes (outils de diffusions, renforcements de capacités, communications sensibilisations)	-Installer la base de données préliminaire; Communiquer sur la base de données; élaborer le guide d'utilisation de la base de données et renforcer les capacités des utilisateurs clés; -Mettre à jour la base de données en considération des commentaires des utilisateurs; -Elaborer et mettre en oeuvre un plan de renforcement de capacité sur l'utilisation de la base de données par la radio -Renforcer les capacités des acteurs clés pour l'utilisation de la base de données - Doter e moyens matériels pour la mise en oeuvre de la Base de données	-Emission radio-télé -LOA -Cabinet d'étude

Activités	Sous-activités	Inputs
1.3. Intégrer les obligations des Conventions de Rio dans les plans de développement régionaux et sectoriels		
1.3.1. Développement d'outils d'intégration des Conventions de Rio (manuel/guide, renforcement de capacité)	-Elaboration de guide/manuel préliminaire d'intégration des conventions de Rio dans les plans sectoriels; -Elaboration de guide/manuel d'intégration dans les plans locaux de développement	-Consultant économiste conception d'outils -Atelier Ville -Réunion en ligne -Voyage -Réunion District
1.3.1. Développement d'outils d'intégration des Conventions de Rio (manuel/guide, renforcement de capacité)		
1.3.2. Appui à l'intégration des Conventions de Rio dans les planifications (Appui à l'élaboration des planifications territoriales, intégration dans la politique et stratégie national)	-Formation sur l'utilisation de guide d'intégration des conventions de Rio dans le PRD (trois régions pilote) -suivi de la mise en oeuvre/utilisation de l'outil	-Réunion en ligne -Voyage -Réunion Tana
1.4. Feuille de route pour le mainstreaming et l'alignement des conventions de Rio avec les Plans de Développement Sectoriels		
Identification de guide, outils, approches et méthodologie pour éclairer l'élaboration de la feuille de route		pm 2022
Préparation de la feuille de route		pm 2022/2023
COMPOSANTE 2		
Activités	Sous-activités	Inputs
2.1. Elaborer une stratégie de mobilisation des ressources financières		
2.1.1. Finalisation des analyses d'état des lieux (Comptabilisation écosystémique du capital naturel, Eco villages ...)	Analyse des états de lieux, déjà validée	
2.1.2. Elaboration des stratégies pour la mobilisation des ressources (ateliers de concertations et validations nationales et régionales, documents de recommandation, ...)	Proposition de stratégie déjà élaborée	
2.1.3. Finalisation de la stratégie et appui à la mise en oeuvre	Finalisation de la stratégie, tenant compte des recommandations	-Consultants (C2, 3e et 4e tranches)
	Organiser la réunion des donateurs bilatéraux et multilatéraux	-Réunions - C2 élargie et staff Implication des Points focaux : PF FEM, ...

Activités	Sous-activités	Inputs
	Organiser la réunion des donateurs bilatéraux et multilatéraux	LOA (3) Un au niveau central et deux au niveau régional (lettre d'accord amn structure iray : ex loa avec dredd
	Elaborer le plan d'opérationnalisation des financements existants: - plan d'opérationnalisation des financements internes, central et régional - plan d'opérationnalisation des financements externes (PTF : OSC, secteur privé, ONG, agence d'exécution, bailleurs, ...)	Recrutement consultant, Concertation - spécificité des régions élaboration validation
	Institutionnaliser la stratégie nationale de mobilisation des ressources	Atelier national
2.1.4. Mettre en oeuvre le plan d'opérationnalisation de la stratégie	Elaborer et mettre en oeuvre un plan de renforcement des capacités des acteurs clés: équipe de la DMFD du MEDD, équipe des DiREDD, équipe des Régions, etc.	Consultants Ateliers Déplacements
	Elaborer la stratégie avec plan de mise en oeuvre pour l'instauration de la fiscalité verte (En partenariat avec le projet RINDRA): - Analyse des textes et législations sur la fiscalité vertes - Concertation au niveau central et régional (Région pilote) - Elaboration et validation de la stratégie	Consultant Ateliers Déplacements
	Vulgariser le mécanisme PSE auprès des secteurs privés : - Mapping des sites potentiels PSE - Mapping acteurs potentiels - Concertation, consultation, négociation pour chaque axe - Elaboration de stratégie et plan de campagne de sensibilisation pour inciter le secteur privé à mettre en oeuvre le mécanisme de PSE	Consultant Ateliers Déplacements
2.2. Suivi et traçage de la mobilisation des ressources		
2.2.1. Elaboration de politiques et procédures de suivi et traçage de l'utilisation de financement pour répondre aux obligations de l'environnement mondial (Prévention des doubles comptages et prise en compte des contributions en nature)	-Identification et développement de procédures pour relier l'utilisation du SIGE avec la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des conventions de Rio	-Réunion ville -Réunion en ligne -Déplacement
	-Consultation et négociation avec les parties prenantes du secteur privé pour gérer les informations et les procédures de collecte à caractère confidentiel	
	Consultation et négociation avec les principaux utilisateurs des informations financières les plus pertinents en vue du développement de partenariat et de collaboration (Ambatovy, QMM, etc.)	
2.2.2. Finalisation et validation	-Finaliser et valider la politique	Réunion
2.2.3. Application test de suivi des ressources (test pilotes, validations, mise à l'échelle)	-Etablissement et mise en oeuvre de cadre de partenariat dans la mise en oeuvre	-LOA -Déplacements
2.3. Test du flux de revenus du SIGE		

Activités	Sous-activités	Inputs
COMPOSANTE 3		
3.1 Evaluation de référence de la base de données actuelle et des systèmes d'information de gestion		
3.1.1. Finalisation des examens de bases de données	-Compiler les résultats des analyses des systèmes existants et proposer des recommandations pour la conception du système à mettre en place -Partager les résultats d'analyses et les recommandations	Consultant -Réunions
3.2. Capitalisation et analyse des indicateurs de références existants sur l'Environnement et développement durable		
3.2.1. Appui à la vulgarisation de la SDSI	-Mettre en oeuvre les partenariats dans les régions pilotes	-LOA -Déplacements -Réunions -Réunion en ligne
3.2.2. Renforcement de capacités des acteurs	élaborer et mettre en oeuvre un plan de renforcement des capacité	Déplacement Réunion
3.3. Définitions des indicateurs à suivre		
3.3.1. Compilations des indicateurs de références sur l'environnement et le développement durable	Compiler des indicateurs de référence sur l'environnement et le développement durable (Analyses indicateurs, ateliers de concertation ...) Mise à jour des indicateurs existants dans le Système de la Planification et du Suivi-Evaluation (SPSE) et insertion des nouveaux indicateurs relatifs aux nouvelles thématiques depuis 2019 (ex: économie verte et Bleue, Diplomatie verte,...)	-Consultants -Réunions
3.3.2. Choix et validations des indicateurs pertinentes pour le SIGE	-Atelier de validation	-Réunion ville -Déplacement
3.4. Mise en cohérence des systèmes d'information existents		
3.4.1. Standardisation des méthodes de collectes de données (Protocole de collectes d'informations)	-Atelier de concertation et de validation	-Réunion ville -Déplacement -Consultants
3.5. Développement et mise en place de l'outil SIGE		
3.5.1 conception du système à mettre en place	-Développement de l'outil avec langage de programmation client serveur défini au préalable	Consultant
3.5.2 Pré-test du SIGE	-test local au niveau du MEDD -Evaluer l'opérationalité du SIGE	-Réunion en interne -Consultant -Déplacement -Réunions -Réunion en ligne
3.5.3 Mise en place du SIGE	Atelier de validation	
3.6. Définitions des besoins en matériels et en renforcements de capacités		
3.6.1 Acquisition des serveurs et d'ordinateur suivant les caractéristiques données par le MEDD: application et base de données	NB. Matériels déjà acquis	

Activités	Sous-activités	Inputs
3.6.2 renforcement de capacité (parties prenantes, administrateurs du système)	élaborer et mettre en oeuvre un plan de renforcement des capacités en exploitation et valorisation de l'infrastructure informatique existant au niveau central, et des régions pilotes	Ateliers Déplacements
Composante 4		
4.1. procéder à l'Analyse institutionnelle de la gouvernance environnementale		
4.1.1. Analyse institutionnelle du MEDD (Analyse rôles et missions, concertations avec MEDD, ...), et des mécanismes de coordination et de concertation nationales (CES, CIME, GDTT, etc.)	-Consolider les résultats des travaux d'analyse des capacités qui touche le MEDD, les autres secteurs, les régions et les structures d'intégration sectorielle et régionale	-Consultants -Réunions -Déplacement
Activité 4.3 : Effectuer le Pilotage des meilleures pratiques d'intégration régionale		
4.3.1. Analyse des fonctionnements des DREDD, des CER et des acteurs impliqués ou susceptibles de l'être dans le processus d'intégration régionale (District, Région, etc.)	Proposer une restructuration des CER: Avant-projet de texte régissant la CER (Décret ou arrêté interministériel)	-Réunion en ligne -Réunions -Déplacement -Consultants -Matériels ATELIERS (CONCERTATION ET VALIDATION)
	Développer des outils de renforcement des capacités des CER et des structures infra-régionales (CLG, etc.).	
	Mettre en place des mécanismes d'intégration systémique des groupes d'acteurs non étatiques et des institutions infrarégionales par l'harmonisation institutionnelle (des CRD, CER, Comité Local de Développement de District, Comité Communal de Développement et Structures Locales de Concertation)	
4.1.2. Formulation des recommandations pour le renforcement de la structure du MEDD, les DREDD et les structures/cellules de concertation régionales et nationales	-Développer la stratégie de LEADERSHIP (renforcement des capacités) pour l'intégration des conventions de Rio et de DD avec les outils et le plan de mise en oeuvre (MEDD, DREDD, CIME, CES, CER)	-Consultants -Réunion en ligne -Réunions -Déplacement ATELIER NATIONAL
4.1.3. Appui à la mise en oeuvre des recommandations	Mettre en oeuvre le plan de renforcement des capacités	LOA avec DREDD
4.2. Procéder au Renforcement du CIME		
4.2.1. Restructuration du CIME	Mise en place et opérationnalisation de mécanisme de GESTION de la performance du CIME	-Réunion -Réunion en ligne
4.2.2. Renforcement de capacité du CIME	Appui à la mise en oeuvre du plan de réforme et de renforcement du CIME	Réunion Matériels
Activité 4.3 : Effectuer le Pilotage des meilleures pratiques d'intégration régionale		
4.3.1. Analyse des fonctionnements des DREDD, des CER et des acteurs impliqués ou susceptibles de l'être dans le processus d'intégration régionale	Proposer une restructuration des CER: Avant-projet de texte régissant la CER (Décret ou arrêté interministériel)	-Réunion en ligne -Réunions -Déplacement -Consultants -Matériels ATELIERS (CONCERTATION ET VALIDATION)
	Développer des outils de renforcement des capacités des CER et des structures infra-régionales (CLG, GUIDE DE VILLAGE ECOLOGIQUE, etc.).	
	Mettre en place des mécanismes d'intégration systémique des groupes d'acteurs non étatiques et des institutions infrarégionales par l'harmonisation institutionnelle (des CRD, CER, Comité Local de Développement de District, Comité Communal de Développement et Structures Locales de Concertation)	
4.5. Pilotage des meilleures pratiques de mainstreaming régional		

Activités	Sous-activités	Inputs
4.5.1. Identification, expérimentation et vulgarisation des meilleures pratiques d'intégration des conventions de Rio dans les PRD	Organiser des séances de formation sur le tas (par la pratique), d'application des guides d'intégration des conventions de Rio dans les PRD, au niveau des régions pilotes	-Déplacement -Réunion ville -Réunion en ligne -Réunion à Tana -Consultant
	Elaborer une stratégie de planification régionale intégrée et un guide d'intégration régionale	
	Identifier les bonnes pratiques et mettre à jour le guide	
	Vulgariser le guide	
4.5.2. Identification, mise en oeuvre, capitalisation et vulgarisation des bonnes pratiques sur des activités de démonstration pour compléter les actions de renforcement des capacités expérimentées sur le terrain.	Mettre en oeuvre le partenariat avec PAGE (GIZ), et/ou le Projet Kobaby (AFD) dans la région de Diana	LOA /Grants
	Développement de partenariat pour la duplication des bonnes pratiques de renforcement des capacités locales dans d'autres régions	LOA/Grants
Composante 5		
Activités	Sous-activités	Inputs
Activité 5.1: Sondages auprès des acteurs du secteur public		
5.1.1. réalisation d'un sondage visant à évaluer la compréhension de l'intégration de la Convention de Rio	Réaliser le sondage	Consultants Atelier Déplacements
Activité 5.2 : Elaborer des programmes de formation à l'intégration de la Convention de Rio, y compris les programmes d'éducation		
5.2.1. Elaboration de programmes de formation et d'éducation pour les fonctionnaires, les écoles publiques et secondaires	-Mettre en place un cadre de concertation entre les établissements de formation pour l'évaluation des besoins de formation -Evaluation des besoins en formation tenant compte des spécificités des régions et des STD les plus touchés par des problèmes environnementaux (Ambatovy, Anosy) -Création de programmes, de matériels et des modules de formation sur la base des meilleures pratiques recueillies	Accord de partenariat Ateliers Déplacement Consultants
5.2.2. Appui à la mise en oeuvre de programme de formation pilote	Identifier et mettre en oeuvre des opportunités de partenariat avec des structures de formation pilotes (l'université de Toamasina, ENMG, ENAM, EESA Forêts Ankatso, INDDL, etc.)	Accord de partenariat Ateliers Déplacement
5.2.3. Elaboration de guide pour la mise en oeuvre de la Politique nationale d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable (PErEDD) au niveau régional	-Elaborer un guide pour l'élaboration de plan de gestion régionale de l'ErEDD -Identification et partage des bonnes pratiques de techniques de l'IECDD -Elaborer un lexique des conventions de Rio et du développement durable afin d'uniformiser le langage en IECDD	-Consultants -Ateliers -Déplacement
5.3. Conduire les Campagnes de sensibilisation public		
5.3.1. Sensibilisations à travers les événements/célébrations nationales et internationales relatifs à l'environnement et au développement durable	Contribuer à quatre événements : JME, Journée Mondiale du Climat, Journée Internationale de la Biodiversité, Journée Mondiale de la Désertification	Contractualisation avec ONG à identifier Déplacements Ateliers (Célébrations)

Activités	Sous-activités	Inputs
5.3.2. Mise en oeuvre de partenariat avec les Associations de femmes, des jeunes, etc., formées	-Mise en oeuvre de partenariat avec la fédération des femmes de l'Itasy -Identification et mise en oeuvre de partenariat avec les associations formées dans le cadre du projet et qui présentent des atouts importants en matière de sensibilisation de masse.	Grants Réunions Déplacements
5.4. Conduite de dialogues, formations et ateliers de sensibilisation		
Mener des dialogues et plaider sur la mise en œuvre des Conventions de Rio au niveau des autorités compétentes (Gouvernement, Sénat, Assemblée nationale, ...)	-Organiser deux ateliers de sensibilisation plaider au niveau des deux chambres -Elaboration de support de plaider auprès des autorités compétentes	-Consultant animateur -Réunions
5.5. Formation des formateurs sur les meilleures pratiques pour rendre opérationnelles les Conventions de Rio		
5.5.1. Renforcements de capacités	-Constituer et renforcer les capacités d'un pool de formateurs -Appuyer à la mise en œuvre du plan de formation -Mettre en œuvre un plan de suivi sur terrain	-Consultants -Ateliers -Déplacements
5.6. Partager les bonnes pratiques		
5.6.1. Identifier les bonnes pratiques	Utiliser la NTIC pour collecte des bonnes pratiques en ligne (Conception et mise en oeuvre de mécanisme de collecte)	Consultants Atelier Déplacements
5.5.2. Partager les bonnes pratiques	Choisir les bonnes pratiques à partager Exploiter les médias sociaux pour acheminer et partager les bonnes pratiques	-Médiatisation -Ateliers Déplacements
