

CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	2
2.	RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES DEL PERIODO	7
3.	VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	8
4.	REGISTRO DE PROBLEMAS.....	21
5.	REGISTRO DE RIESGOS	22
6.	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO	23
8.	ANEXOS	24

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Número y título del Proyecto:	Transición a una economía verde urbana (TEVU)
Fecha de firma del Proyecto:	Mar 11, 2022
Fecha de inicio y término del Proyecto:	Mar 11, 2022 a Mar 11, 2027
Período cubierto por este informe:	I cuatrimestre 2026
Fecha de entrega de este informe al PNUD:	11 de may. de 26
Autor:	Miriam Miranda (miriam.miranda@tropicalstudies.org)
Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):	(MANUD/CPD): Prioridad Estratégica 1 - Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la sociedad civil para facilitar y forjar pactos y acuerdos nacionales, innovadores, transformadores y basados en el diálogo, con el fin de acelerar el cumplimiento de los ODS para un desarrollo sostenible con igualdad
Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:	Outcome: C-1: Los gobiernos locales y nacionales han fortalecido las instituciones, los procesos y las capacidades para llevar a cabo una reforma política basada en la evidencia y para una planificación integrada sostenible en la GAM C-2. Los gobiernos locales y nacionales han emprendido inversiones sostenibles e integradas con bajas emisiones de carbono, resiliencia, conservación y restauración de tierras. C-3. Los gobiernos locales y nacionales inician modelos innovadores de financiación y negocio para ampliar las soluciones urbanas sostenibles. C-4. Soluciones y mejores prácticas compartidas con el GP SCIP y otros eventos globales y comunidades de práctica e iniciativas de América Latina C-5. El M&E evalúa el impacto del proyecto y orienta la gestión adaptativa. Output: Producto 1.1.1 Plataformas de diálogo técnico y político, incluyendo la Mesa Técnica Multinivel de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte público (MTM-DUOT) y la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de Tárcos (CMCRGT), ampliadas y fortalecidas con planes y mecanismos de toma de decisiones para la transición hacia una economía

	verde inclusiva, la planificación urbana sostenible e integrada, la descarbonización, y para coordinar acciones con otras plataformas relacionadas y apoyadas por una plataforma digital para coordinar mejor y apoyar la planificación basada en la evidencia. Producto 1.1.2 Se define una hoja de ruta coordinada y participativa para la transición hacia una economía verde inclusiva y una planificación urbana integrada y sostenible, incluyendo la descarbonización y la ecologización, sobre la base de un análisis de los obstáculos jurídicos, políticos, institucionales, técnicos y fiscales, y se aprueba por el gobierno a través de políticas públicas. Producto 1.1.3 Plan regional de renovación urbana sostenible e integrada para la GAM, incluye: a) Desarrollo de un Plan Regional de Renovación Urbana Sostenible, diseñado para consolidar los espacios públicos verdes, las áreas urbanas verdes, los IUBCs y la movilidad sostenible (por las diferentes modalidades) y que se integre a los Planes Reguladores Municipales, y b) Desarrollo de una estrategia verde urbana para restaurar y conservar los espacios verdes públicos y privados para la provisión de servicios ecosistémicos en la GAM, que considere la seguridad e inclusión ciudadana, y los Parques Naturales Urbanos (PANU) como una nueva categoría de gestión propuesta por el MINAE. Producto 1.1.4 La estrategia nacional de concienciación y comunicación sensibiliza a la población y a los responsables de la toma de decisiones sobre los objetivos y los efectos deseados de una reforma de la legislación fiscal que permita avanzar hacia una legislación verde, cumplir con el Plan Nacional de Descarbonización y generar beneficios ambientales globales. Producto 1.1.5 Propuesta legal de fiscalidad verde elaborada mediante consulta, presentada y promovida para su aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Producto 1.1.6 Propuesta de reformas/ajustes institucionales de los sectores de medio ambiente, uso del suelo y transporte alineados con la transición hacia una economía verde y el Plan Nacional de Descarbonización, analizados y discutidos con el Poder Ejecutivo y promovidos para su implementación. Producto 1.1.7 El programa de formación municipal e institucional implementado con perspectiva de género beneficia a 1.200 personas (gestores, técnicos y decisores locales, asesores legislativos, funcionarios de instituciones públicas) vinculadas al desarrollo urbano, la gestión ambiental y la planificación del uso del suelo. Producto 1.1.8 Adopción de propuestas de indicadores urbanos al Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), junto con el diseño de protocolos para la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales y los IUBC Producto 2.1.1 Áreas urbanas críticas restauradas que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones urbanas vulnerables y contribuyan a la mitigación del cambio climático, incluyendo lo siguiente: a) identificación de zonas de intervención y priorización de áreas a restaurar con especies nativas; b) alianzas estratégicas con actores que permitan la incorporación
--	--

de áreas públicas y privadas en el proceso de restauración y conservación; y c) consolidación de espacios públicos verdes, áreas urbanas verdes y IUBCs.

Producto 2.1.2. Los planes participativos de gestión de espacios verdes urbanos por municipalidad, con enfoque de género contribuyen a la conservación de los espacios verdes urbanos existentes, a la reducción de las emisiones de GEI, y a la implementación de los planes de gestión de los IUBC, para mejorar el impacto de la restauración realizada, y facilitar el desarrollo de una estrategia verde urbana integrada para la GAM bajo el Componente 1 (Producto 1.1.3).

Producto 2.1.3. Las inversiones en movilidad sostenible, como puentes aptos para bicicletas, carriles para bicicletas, vías de uso compartido, vías peatonales con zonas verdes y mejoras en las aceras verdes implementadas, reducen las emisiones de GEI y se integran en una visión regional de la GAM que facilita la interconexión de los barrios, las municipalidades, los paisajes urbano-naturales y una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Producto 2.1.4. Experiencia piloto para mejorar la calidad del agua en la parte alta de dos cuencas urbanas contaminadas dentro de la GAM (ríos Torres y Ma. Aguilar) implementada, con base en la "Estrategia Nacional de Ríos Limpios: Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030", incluye la restauración de las áreas de protección de los ríos y el control de las descargas irregulares de aguas residuales y residuos sólidos y promueve la conectividad al sistema de alcantarillado sanitario.

Producto 3.1.1 Los análisis económicos realizados facilitan el desarrollo de modelos de negocio bajo diferentes esquemas innovadores de negocio y financiación para lograr la descarbonización y el logro de beneficios ambientales globales en la GAM, incluyendo un análisis del Escenario Business-as-Usual frente al escenario reformado del proyecto para la gestión de residuos sólidos (por ejemplo, plásticos y residuos orgánicos), aguas residuales, lodos fecales y movilidad activa.

Producto 3.1.2 La mejora de la eficiencia de los instrumentos económicos actuales y de la nueva financiación municipal (evaluación del valor de la propiedad, mejora de los mecanismos de cobro por estacionamiento, ajustes para obras públicas en el impuesto sobre bienes inmuebles, opciones de financiación para la gestión de los residuos sólidos y las aguas residuales, cobro por la congestión de vehículos, contribuciones especiales para invertir en la renovación urbana y emisión de bonos verdes) aplicada con conciencia de género, promueve lo siguiente: a) Mantenimiento y restauración de los servicios de los ecosistemas urbanos (p. ej, recarga de aguas subterráneas, restauración de la conectividad en los IUBC, reducción del efecto isla de calor, provisión de alimentos, polinización y reducción de la escorrentía de agua); b) Modelos de negocio de economía circular y/o simbiosis industrial con enfoque de género para una buena gestión de los residuos sólidos, la gestión de los lodos fecales y las aguas residuales, gestión y reutilización, incluye la financiación a través del sistema bancario en condiciones favorables (plazos de pago favorables, periodos de gracia, tipos de interés más bajos); y c) Nuevos emprendimientos que favorezcan a las micro y pequeñas empresas, así como a los arreglos asociativos comunitarios, para el aprovechamiento y transformación de residuos sólidos (plásticos y orgánicos) y líquidos, así como la movilidad sostenible.

	<i>Producto 3.1.3 Al menos tres modelos de bionegocios a partir de asociaciones público-privadas (APP), micro y pequeñas empresas, y asociaciones a nivel comunitario con enfoque de género establecidas dentro de la GAM apoyan las inversiones inclusivas: el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas urbanos y la restauración de los IUBCs, la mejor gestión de los residuos sólidos (identificados como parte de la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropriada [NAMA] de Residuos) y las aguas residuales, los lodos fecales, y la movilidad activa vinculada al Tren Eléctrico.</i> <i>Producto 3.1.4 El programa de asistencia técnica implementado para las empresas que trabajan en bionegocios facilita el acceso a los mercados y la replicabilidad a escala.</i> <i>Producto 4.1.1 La plataforma de intercambio de información y conocimientos establecida a nivel nacional aumenta la concienciación sobre la planificación urbana integrada sostenible, la transición a una economía verde urbana y los aspectos de género, entre otros temas.</i> <i>Producto 4.1.2 Una estrategia de aprendizaje y comunicación entre ciudades implementada a través la plataforma global del SCIP y otras redes globales existentes, para difundir los métodos internacionales y las lecciones aprendidas en materia de ciudades sostenibles.</i> <i>Producto 4.1.3 Plan de acción de género del proyecto, plan de participación de las partes interesadas y otros planes de gestión relacionados con las salvaguardias sociales y medioambientales aplicadas.</i> <i>Producto 5.1 Plan de M&E implementado</i>
Asociado en la Implementación:	<i>Organización para Estudios Tropicales –OET-</i>
Partes Responsables:	<i>Organización para Estudios Tropicales –OET-</i> <i>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD/Costa Rica</i>
Presupuesto del período cubierto por el informe en USD\$:	\$ 1 832 433, 80 <i>*** En la Sesión N°7 de Junta Directiva (20-agosto-2025), se autoriza la modificación presupuestaria, reduciendo el presupuesto por un monto de \$193 702, 42.</i>
Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD\$:	\$ 1 774 155, 22 (¢ 889 845 220,52) Corte al 31 de diciembre, 2025
Breve descripción del proyecto	
Se implementará una estrategia de proyecto con impacto a nivel nacional para permitir que Costa Rica transicione de una economía tradicional orientada al mercado hacia una economía “verde”. Esto se logrará mediante el desarrollo de reformas estructurales en materia de políticas, economía e instituciones, que permitan la integración de la biodiversidad en todos los sectores, incluyendo mejoras	

en la disponibilidad de datos sobre el capital natural para informar la toma de decisiones y guiar la implementación de mecanismos financieros que respalden la transición hacia una economía verde.

Las reformas estructurales en políticas ambientales y financieras se pondrán a prueba en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde la transformación hacia la sostenibilidad de los sectores de transporte, industria, manufactura y servicios, así como las mejoras en la gestión de residuos sólidos y aguas residuales, contribuirán a la generación de beneficios ambientales globales.

El hábitat de la biodiversidad de importancia mundial —incluidas especies migratorias y en peligro de extinción— se verá fortalecido mediante la consolidación de corredores biológicos interurbanos (CBIU), que funcionarán como zonas de conectividad entre Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) y como zonas de amortiguamiento para los ríos y quebradas que atraviesan la GAM y desembocan en estas áreas de alto valor biológico.

El establecimiento de alianzas público-privadas (APP) duraderas en la GAM proporcionará los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. Finalmente, una estrategia de gestión del conocimiento permitirá sistematizar y difundir las mejores prácticas y lecciones aprendidas, facilitando su replicación y ampliación tanto en Costa Rica como a nivel internacional.

Un eje central de la estrategia propuesta será la participación activa de actores públicos y privados relevantes, así como de organizaciones de la sociedad civil (OSC), promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de las actividades del proyecto.

2. RESUMEN DEL REPORTE

El proyecto ha mostrado avances significativos en el fortalecimiento de capacidades institucionales, la implementación de soluciones sostenibles y la generación de modelos innovadores en la GAM.

Componente 1. Fortalecimiento institucional y planificación integrada: Se consolidaron acciones clave en gobernanza y capacidades para la planificación sostenible. Destaca la creación de dos Parques Naturales Urbanos (PANUs) y el avance en sus planes de manejo, así como el desarrollo de estudios para servicios no esenciales. Los corredores biológicos interurbanos promovieron participación ciudadana significativa, resaltando el conteo de aves con amplia cobertura territorial.

En materia de sensibilización y educación ambiental, se alcanzó un impacto amplio a través de iniciativas como la Sala Ciudad Sostenible (más de 487 mil personas), festivales, ferias y procesos comunitarios. Se fortaleció además el rol de las mujeres en la gestión del agua, integrando un enfoque de género en la gobernanza ambiental. Paralelamente, se impulsaron normativas relevantes como la ley de arbolado urbano, instrumentos de financiamiento ambiental y legislación para movilidad sostenible.

Componente 2. Inversiones sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza: Se avanzó en la aprobación y socialización de planes de manejo de áreas protegidas, destacando Cerros de Escazú. En intervenciones territoriales, se registran avances en proyectos urbanos como bulevares, viveros, parques lineales y soluciones de pacificación vial, aunque algunos proyectos fueron suspendidos por decisiones municipales.

Se destacan innovaciones en gestión de residuos y economía circular, incluyendo:

- Sistemas de bioconversión con mosca soldado negro, con reducción de hasta 92% de emisiones.
- Alianza intermunicipal para valorización de residuos.
- Implementación de ríobardas e islas regenerativas, mejorando calidad de agua y resiliencia urbana.

- Nuevos proyectos de aprovechamiento de metano y fortalecimiento de centros de reciclaje.

Estas acciones integran restauración ecológica, reducción de emisiones y participación comunitaria.

Componente 3. Modelos de financiamiento y bionegocios: Se apoyó el desarrollo de un nuevo bionegocio mediante insumos y análisis técnico para valorización de residuos. Asimismo, se avanzó en la estructuración de fideicomisos municipales (Belén, Heredia, San José y Santa Bárbara), aunque algunos procesos enfrentan retrasos por limitaciones internas. También se contribuyó al desarrollo de proyectos de ley, movilidad sostenible y electrificación del transporte, así como a iniciativas como Ruta del Agua y el Bosque y propuestas de financiamiento climático internacional.

Componente 4. Gestión del conocimiento: Se generaron nuevos productos técnicos y comunicacionales, alcanzando un total de 97 productos, incluyendo guías, materiales educativos y herramientas de comunicación territorial.

Componente 5. Seguimiento y evaluación: El sistema de monitoreo presenta un 84,8% de avance, con seguimiento continuo de indicadores, riesgos y cumplimiento de metas, alineado a estándares del PNUD.

Enfoques transversales: Se destaca la integración del enfoque de género, promoviendo liderazgo de mujeres, participación equitativa y diseño inclusivo en proyectos. Asimismo, se fortaleció la participación comunitaria y la educación ambiental como base para la sostenibilidad.

3. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMPONENTE 1: Los gobiernos locales y nacionales han reforzado las instituciones, los procesos y las capacidades para emprender una reforma política basada en pruebas y para una planificación integrada sostenible en la GAM

1.1. PANUS: A partir de la creación vía decreto de dos PANUS (Simón Bolívar y Lone Ross), donde además se crean y entregan 3 planes de manejo para los 3 PANUS-GAM. Se mantiene el proceso la contratación de la empresa consultora a cargo de desarrollar un estudio para la implementación y ejecución de los SANE (servicios no esenciales) en el PANUN Simón Bolívar.

1.2. Corredores Biológicos Interurbanos: implementan de manera exitosa el Conteo de Aves, de la Época Seca 2026. Con la participación de 670 personas y la observación de 329 spp de aves en 59 rutas de la GAM.



1.3. Actividades para sensibilización, capacitación y educación ambiental:

- **Visitación de "Sala Ciudad Sostenible" Museo de los Niños** A partir de los reportes desde la gerencias del Museo de los Niños se reporta una visitación anual de 292.621 mujeres y 195.080 hombres en la sala, alcanzando 487701 personas impactadas con esta intervención.
- **Asistencia Feria de Aniversario Reserva de Biosfera:** Se apoyó la creación de material divulgativo y la participación en la feria Reserva de la Biosfera, a través de la coordinación con el CBI Garcimuñoz.
- **II Festival de Aves del Humedal del Valle de Coris:** TEVU brindó su apoyo al II Festival de las Aves de Coris, contribuyendo al fortalecimiento de este espacio de educación ambiental, sensibilización y participación comunitaria. A través de este respaldo, se promovió la conservación de la biodiversidad local y el reconocimiento del valor ecológico de las aves, así como el involucramiento de actores locales en iniciativas que fomentan la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible del territorio.
- **Aprobación de moción para el Fortalecimiento Integral del Corredor Biológico Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado Agua Caliente (COBRI SURAC) en el Concejo Municipal de Cartago:** Esta acción aporta a la adaptación ante el CC, al promover la restauración y conservación de ecosistemas ribereños especialmente, al trabajar de forma directa con las comunidades y actores sociales en una mejora de la educación y formación ambiental para la disminución de la contaminación en los ríos del CBI.
- **Talleres de empoderamiento de mujeres de la Red de Gestoras Comunitarias del Agua:** Esta es una estrategia clave para fortalecer la resiliencia comunitaria frente al cambio climático y promover acciones locales de sostenibilidad. Al potenciar las capacidades técnicas, organizativas y de liderazgo de las mujeres, se facilita la implementación de prácticas de adaptación como la gestión eficiente del recurso hídrico, la protección de nacientes y la preparación ante eventos extremos, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades. Asimismo, el fortalecimiento del rol de las mujeres como agentes de cambio contribuye a la mitigación mediante la promoción de prácticas sostenibles, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental replicada en hogares y territorios. En este sentido, integrar el enfoque de género en la gestión del agua no solo responde a principios de equidad, sino que constituye una acción estratégica para la gobernanza ambiental y la acción climática efectiva a nivel local.

- **Inauguración Ríobarda e Islas regenerativas UNA.** La implementación de ríobardas e islas regenerativas mejora la calidad del agua, fortalece la resiliencia de las cuencas urbanas y contribuye a la restauración ecológica de los ríos, permitiendo una mejor respuesta ante eventos extremos como lluvias intensas o arrastre de residuos. Esta acción también aporta a la mitigación del cambio climático y a la descarbonización, al promover soluciones basadas en la naturaleza que favorecen la captura de carbono a través de la vegetación incorporada en las islas regenerativas. Asimismo, reduce indirectamente emisiones al disminuir la necesidad de procesos intensivos de tratamiento de aguas contaminadas y fomenta prácticas sostenibles y de participación comunitaria orientadas a la protección de los recursos naturales.

1.4. Normativas y reglamentos id-6:

- Aprobación de Ley Expediente No. 24489 Ley de arbolado urbano (texto sustitutivo): Fomenta la plantación, conservación y gestión del arbolado en áreas públicas y promover su resguardo en áreas privadas, como parte de la infraestructura verde urbana. La ley define responsabilidades del gobierno central, municipalidades y sector privado, establece criterios técnicos para la selección de especies y prioriza la evaluación de riesgos antes de la remoción de árboles, incluyendo sanciones para su cumplimiento.
Enlace de referencia: <https://www.facebook.com/ProyectoTEVU/posts/las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-legislativa-aprobaron-este-martes-14-de/921434077344675/>
- Aprobación de ley: 23896 Ley de titularización de ingresos propios de SINAC: Pretende que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación pueda titularizar sus ingresos futuros y captar recursos hoy mediante el mercado de valores, fortaleciendo la gestión ambiental.
Enlace de referencia: <https://www.facebook.com/asambleacrc/posts/aprobado-en-primerdebate-en-la-plenatercera-el-expediente-expediente-23896-ley-d/1453167239760397/>
- Aprobación de Expediente 24171: Ley Fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible: Impulsa la ampliación y regulación de la infraestructura nacional de recarga para vehículos eléctricos como condición habilitante de la transición hacia una movilidad sostenible y baja en emisiones en Costa Rica.
Enlace de referencia: <https://www.facebook.com/Telenoticias7/videos/diputados-aprueban-ley-que-garantiza-red-nacional-de-cargadores-el%C3%A9ctricos-m%C3%A1s-in/4185899604996266/>

COMPONENTE 2: Los gobiernos locales y nacionales han emprendido inversiones sostenibles e integradas con bajas emisiones de carbono, resiliencia, conservación y restauración de tierras.

2.1. Planes de manejo Zonas Protectoras: Planes de manejo Zonas Protectoras: El Plan de Manejo de los Cerros de Escazú fue aprobado por el Comité Científico Técnico del SINAC. Además, el departamento legal del SINAC le dio el visto bueno al igual que el Comité Local de esta ASP. Estos hitos constituyen avances clave para el proceso de implementación del Plan de Manejo y permiten dar inicio a la fase de articulación y socialización con los actores institucionales previamente identificados, entre ellos los gobiernos locales, comunidades indígenas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Próximos pasos: Se realizaron los talleres de socialización y articulación con los principales actores vinculados al ASP, incluyendo municipalidades, instituciones públicas y propietarios. Actualmente, se encuentra en proceso la sistematización final de las observaciones recibidas, así como la incorporación de aquellas que se consideren pertinentes, con el fin de presentar nuevamente el documento ante las instancias correspondientes del SINAC para continuar con el proceso de aprobación.

2.2. Conteos participativos de aves en Corredores Biológicos Interurbanos (CBIs): En el Cuento de Aves, de la Época Seca 2026 participación de 670 personas y la observación de 329 spp de aves en 59 rutas de la GAM.

2.3. INTERVENCIONES EN CAMPO (ARQUI-CIVIL)

- o **Intervención: Bulevar de Barva:** Durante el primer trimestre de 2026, se determinó que la Municipalidad de Barva asumirá la mayor parte del proceso constructivo del bulevar, integrándolo en su contrato por demanda de obras territoriales. Las partidas restantes para completar la intervención serán ejecutadas por el Proyecto TEVU durante el segundo trimestre del presente año.
- o **Intervención: Goicochea:** Tras una revisión de las prioridades cantonales, la Municipalidad de Goicochea decidió reasignar los recursos originalmente destinados al proyecto SBN (en colaboración con TEVU). En consecuencia, se ha dado por finalizada dicha iniciativa para fortalecer otros proyectos estratégicos de mayor impacto en el cantón.
- o **Intervención: Vivero Heredia:** Durante el primer trimestre de 2026, se gestionó la construcción de accesos peatonales y la renovación de la cubierta del suelo del invernadero. Se completaron 100 metros de aceras verdes que garantizan un tránsito accesible e ininterrumpido por todo el vivero, optimizando la movilidad de colaboradores y visitantes. Estas intervenciones fortalecen la capacidad institucional para la selección y siembra de especies nativas, las cuales son fundamentales para potenciar los servicios ecosistémicos que preservan la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Costa Rica.



- o **Intervención Tibás:** En seguimiento a los acuerdos alcanzados con el gobierno local de Tibás en 2025, se establecieron el pliego de condiciones y la metodología de evaluación para el proceso licitatorio. Tras la publicación del cartel y el análisis de las dos ofertas recibidas, se adjudicó el proyecto a la empresa AMCO. El inicio de las obras está programado para el mes de abril, con un plazo de ejecución estimado de dos meses. Con el propósito de optimizar los insumos de la intervención en Tibás, se estableció una alianza con la Municipalidad de San Rafael de Heredia para la reutilización de materiales en sus propios proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). El gobierno local de San Rafael asumirá el traslado del material granular en estrecha coordinación con la empresa adjudicada, fortaleciendo así la cooperación interinstitucional y el aprovechamiento de recursos.



- o **San José: Bulevar Museo de los Niños:** Durante el presente trimestre, el gobierno local solicitó el apoyo técnico del Proyecto TEVU para realizar ajustes menores en el diseño del bulevar. Para atender este requerimiento, se incorporó un pasante de arquitectura encargado de analizar y ejecutar las modificaciones. La propuesta final se entregó a la Municipalidad durante la primera semana de marzo, obteniendo una aprobación inmediata. Sin embargo, debido a una redefinición de prioridades internas, la Municipalidad de San José finalizó su colaboración con el Proyecto TEVU en la iniciativa de la Construcción del Bulevar Museo de los Niños.
- o **San Rafael: Pacificación vial:** El proyecto de Pacificación Vial y SBN en San Rafael ha mostrado un avance significativo este trimestre gracias a la colaboración con el gobierno local. Como parte de una estrategia de transferencia de conocimientos, se realizó una capacitación técnica con el equipo municipal de construcción y la empresa Suelos Óptimos sobre el proceso constructivo de la capa drenante. Asimismo, se acordaron ajustes en el diseño que optimizan el rendimiento de los materiales y elevan la capacidad de infiltración de los parqueos permeables. Actualmente, se gestiona con otros gobiernos locales la disposición final del material excedente de las excavaciones, el cual no ha podido ser reubicado por la Municipalidad de San Rafael. Una vez establecida la logística de disposición, se procederá con la orden de inicio de las obras.
- o **Reverdeamiento Parque Lineal de la Aurora:** El proyecto del Parque Lineal La Aurora presenta un avance significativo gracias a la articulación entre la Municipalidad de Heredia, la ESPH y el Proyecto TEVU. En cumplimiento de los acuerdos de 2025, el equipo de TEVU finalizó los diseños estructurales basados en la propuesta arquitectónica aprobada. Complementariamente, la ESPH entregó los planos eléctricos la primera semana de marzo, permitiendo definir la proveeduría de los materiales para dicha especialidad. El inicio de la fase constructiva está programado para la segunda semana de abril, con un plazo de ejecución de tres meses. Posteriormente, se procederá con la creación del mural interactivo y la siembra de especies nativas, aprovechando el inicio de la temporada lluviosa.

- o **Piloto paradas verdes (ADIS):** El techo verde en la parada de autobús en El Roble de Heredia está reverdecido, florecido y con un amplio disfrute comunitario.



2.4. Nuevos proyectos innovadores en gestión de residuos Id 9

- o **Construcción de biojardinera en ASADA Rosales, Desamparados de Alajuela:** La implementación de ríobardas e islas regenerativas mejora la calidad del agua, fortalece la resiliencia de las cuencas urbanas y contribuye a la restauración ecológica de los ríos, permitiendo una mejor respuesta ante eventos extremos como lluvias intensas o arrastre de residuos. Esta acción también aporta a la mitigación del cambio climático y a la descarbonización, al promover soluciones basadas en la naturaleza que favorecen la captura de carbono a través de la vegetación incorporada en las islas regenerativas. Asimismo, reduce indirectamente emisiones al disminuir la necesidad de procesos intensivos de tratamiento de aguas contaminadas y fomenta prácticas sostenibles y de participación comunitaria orientadas a la protección de los recursos naturales.



- o **Piloto para el manejo de residuos orgánicos en pequeña escala mediante un comedero para la mosca soldado negro (*hermetia illucens*), Santa Bárbara, Heredia, Costa Rica.** El proyecto piloto que actualmente se desarrolla en el cantón de Santa Bárbara, provincia de Heredia, constituye una iniciativa estratégica orientada a validar en condiciones reales la factibilidad técnica, operativa y ambiental de un sistema innovador de tratamiento de residuos orgánicos. Su propósito central es demostrar que la bioconversión

mediante insectos benéficos no solo permite reducir de manera significativa el volumen de desechos ingresados al sistema municipal, sino que además genera productos de alto valor agregado con aplicaciones directas en sectores productivos locales.

Entre los insumos derivados del proceso destacan dos componentes principales:


- Proteína larval, destinada a la formulación de alimentos balanceados para animales, con un alto contenido nutricional y potencial para sustituir fuentes tradicionales de proteína.
- Frass, un subproducto con propiedades fertilizantes que puede ser incorporado en sistemas agrícolas como alternativa orgánica y sostenible.
- Mulch: es un material orgánico de mayor tamaño que se obtiene del proceso de separación de subproductos. El mulch simula el suelo forestal con una textura acolchada que al aplicarse permite mantener la humedad, disminuir la escorrentía superficial, regular la temperatura, aportar nutrientes de forma progresiva, evitar el crecimiento de maleza y, recuperar la estructura del suelo. Este subproducto podría ser aplicado en plantas ornamentales, cultivos agrícolas y en reforestaciones o revegetación o bien, se puede esparcir en terrenos abiertos como estrategia de conservación de suelos.

La instalación de este piloto responde a la necesidad de descongestionar el sistema municipal de recolección y disposición final de residuos, al tiempo que busca generar evidencia técnica sobre la viabilidad de los sistemas de bioconversión en contextos tropicales. Asimismo, se plantea como un modelo replicable de economía circular que integra actores locales, institucionales y comunitarios, contribuyendo directamente a los compromisos nacionales en materia de sostenibilidad, gestión de residuos, acción climática y descarbonización.





Para este cuatrimestre (alrededor de dos meses de pilotaje) se contabiliza que el proyecto ha gestionado un total 850 kg de residuos orgánicos provenientes de centros educativos, de los cuales, 370 kg han sido pruebas completadas, 100 kg intentos fallidos y 380 kg son pruebas en proceso. De las pruebas completadas se han obtenido 12 kg de frass, 9,3 kg de larvas y 8 kg de mulch. Además, se estima la reducción del 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero por medio del tratamiento con moscas soldado negra en comparación con la disposición convencional en rellenos sanitarios, la cual es hasta 13 veces más contaminante.

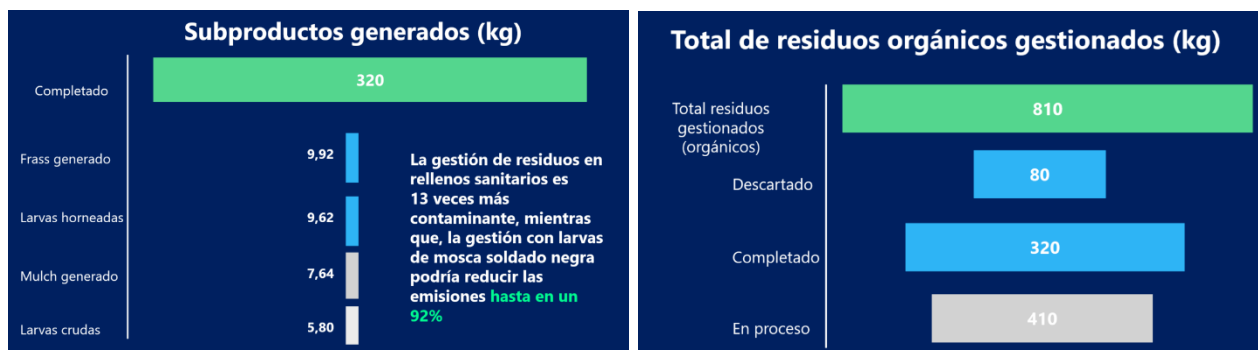

- **Alianza Intermunicipal para la Valorización Integral de Residuos:** Durante el período comprendido entre enero y abril 2026, el proyecto avanzó de forma importante en los componentes técnicos necesarios para la replicación del modelo de recolección selectiva y para la semiautomatización del Centro de Recuperación y Valorización de Residuos (CRMV) de Desamparados. En el eje de economía del comportamiento, se desarrollaron y revisaron insumos clave: se afinó el plan de trabajo de la consultoría, se completó el análisis integral del modelo de separación de residuos de Desamparados, se avanzó en el estudio conductual y en la valoración de los procesos de recolección y cultura de separación en Curridabat y La Unión, y se diseñaron propuestas metodológicas para el monitoreo, la sistematización de aprendizajes y los procedimientos de atención de consultas de la ciudadanía sobre rutas y separación de residuos. Actualmente se está ejecutando el pilotaje de separación en comunidades de La Unión y Curridabat así como la estrategia de comunicación para comenzar con el cambio conductual en la separación de los residuos.

En paralelo, se consolidó el componente de mejora de infraestructura y procesos del CRMV. Se firmó el contrato con la empresa proveedora de la maquinaria para la semiautomatización y se recibió la propuesta de diseño del equipo, hitos que permiten pasar de la fase de diseño a la preparación de la instalación para la cual ya se está preparando el CRMV y se espera comenzar en junio. Asimismo, la persona experta en residuos sólidos continuó con la asesoría técnica, emitiendo y validando dos informes que apoyan la revisión de diseños, la verificación de su coherencia con la operación del centro y la planificación de la puesta en marcha.

En materia de permisos y procesos administrativos, se mantuvo el seguimiento a la tramitación de los permisos ante el CFIA y a la preparación de los insumos para la licitación de obras de remodelación del

CRMV, en coordinación con la Municipalidad de Desamparados y PNUD. Estos avances, junto con el seguimiento periódico del equipo del proyecto y las reuniones de coordinación interinstitucional, fortalecen la ruta de trabajo para la implementación de la semiautomatización y para la puesta en práctica del modelo intermunicipal de gestión de residuos valorizables.

El proyecto Alianza intermunicipal presenta un avance aproximado de un 41%, cuenta con un presupuesto mayor a \$1 330 000 y se espera que finalice en julio de 2027.

- **Proyecto Reto Metano, CRUSA:** Durante este periodo se avanzó de manera significativa en la estructuración y aprobación del proyecto “Hacia una economía circular en Entebbe: sistema de aprovechamiento de metano y reducción de residuos orgánicos”. En conjunto con la Municipalidad de La Unión y la Fundación CRUSA, se trabajó en el diseño técnico y administrativo de la propuesta, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Fundación. Como resultado, la Junta Directiva de CRUSA aprobó el financiamiento solicitado, cuyo objetivo es “desarrollar un sistema de aprovechamiento de las emisiones de metano... con el fin de transformarlas en recursos energéticos útiles”. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de revisión y firma del Acuerdo de Cooperación No Reembolsable entre CRUSA, OET y la Municipalidad de La Unión, paso previo al inicio formal de la ejecución y a la activación del esquema de desembolsos definido en el convenio, el proyecto aprobado tendrá una inversión de \$180 078 y comenzará a ejecutarse en cuanto sea firmado el acuerdo de financiamiento por las partes.
- **Otros avances**
 - El proyecto ríobardas e islas regenerativas llevado a cabo en las universidades públicas TEC y UNA presenta avances importantes en la implementación y sostenibilidad de infraestructura azul y verde para la recuperación de cuerpos de agua urbanos. Como parte de este proceso, se fortaleció la instalación y puesta en funcionamiento de las tecnologías en la Quebrada Residencias, ubicada en el Campus Central del Tecnológico de Costa Rica, y en la Quebrada Pirro, en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, promoviendo soluciones innovadoras para la retención de residuos sólidos flotantes y el tratamiento biológico del agua mediante islas regenerativas con vegetación y microalgas. Paralelamente, se desarrollaron procesos de monitoreo y evaluación que permitieron establecer una línea base sobre el estado de ambos cuerpos de agua, con el fin de medir en el tiempo el impacto de estas intervenciones.
En el marco de estas acciones, se elaboró un análisis integral de calidad de agua superficial para ambas quebradas, incorporando 13 indicadores fisicoquímicos y microbiológicos bajo la metodología ICA Calvo-Tec, índice que brinda una respuesta robusta ante la grave y urgente Los resultados evidenciaron condiciones de contaminación moderada en la Quebrada Residencias y contaminación severa en la Quebrada Pirro, principalmente asociadas a altas concentraciones de materia orgánica, fosfatos, amonio y contaminación fecal, confirmando la necesidad urgente de implementar estrategias de saneamiento y restauración ecológica. Este proceso permitió consolidar información científica clave para futuras evaluaciones del desempeño de las tecnologías instaladas y abrió oportunidades para fortalecer alianzas con laboratorios, departamentos universitarios y proyectos de investigación enfocados en el monitoreo continuo de la calidad del agua y la biodiversidad acuática.
 - Durante el mes de febrero se realizaron las capacitaciones para 23 voluntarios GuardaRíos encargados de apoyar las labores de limpieza y mantenimiento de la infraestructura azul instalada. La capacitación desarrollada en la UNA se llevó a cabo de manera presencial, mientras que en el TEC se implementó en modalidad virtual, fortaleciendo así las capacidades de participación ciudadana y apropiación comunitaria necesarias para garantizar la sostenibilidad y continuidad de las intervenciones en ambos cuerpos de agua. Asimismo, el proyecto fortaleció su componente de participación, sensibilización comunitaria y difusión mediática. El 24 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua y mediante un Seminario de Agua y Género organizado por la Universidad Nacional, se inauguraron oficialmente las tecnologías ante la comunidad estudiantil, celebrando el hito histórico que representa la implementación de estas soluciones para la recuperación de los ríos urbanos dentro de espacios universitarios. También, en el Campus Central del Tecnológico de Costa Rica, en el marco de la

conferencia de saneamiento TICOSAN 2026 organizada por Global Water Stewardship en alianza con varias organizaciones e instituciones, se presentaron estas tecnologías en sitio ante los más de 80 participantes del evento, generando en ambos casos, espacios para profundizar en el componente técnico detrás de las ríobardas e islas regenerativas, permitiendo visibilizar la complejidad, utilidad e importancia de estas tecnologías como herramientas de restauración ecológica y educación ambiental en las comunidades.

- Adicionalmente, se avanza con el proceso para la instalación y construcción de la ríobarda e islas regenerativas para Quebrada Barro, Alajuela en alianza con la Universidad Técnica Nacional y la Municipalidad de Alajuela, proyecto que se espera concretar en el presente trimestre

COMPONENTE 3. Los gobiernos locales y nacionales inician modelos innovadores de financiación y negocio para ampliar las soluciones urbanas sostenibles

- 2.** Se brindó apoyo al desarrollo de un nuevo bionegocio mediante la provisión de insumos clave para la gestión adecuada del residuo, así como la realización de estudios de laboratorio orientados a analizar su contenido y potencial de aprovechamiento. Este acompañamiento permitió fortalecer las capacidades técnicas del emprendimiento, promover la valorización de residuos orgánicos y avanzar hacia un modelo productivo alineado con la economía circular y la sostenibilidad.



- 3.** Se continuó el proceso de acompañamiento a las municipalidades interesadas para el desarrollo de la figura del fideicomiso para la construcción de obras públicas de interés municipal. Si bien en el caso del fideicomiso del cantón de Belén ya se había concluido con el trabajo del Perfil de Proyecto, se mantuvieron reuniones a fin de continuar el proceso de selección del fiduciario. No obstante, problemas internos en la gestión del municipio han impedido retomar ese proceso, incluso solicitándose de parte de las autoridades municipales pausar el apoyo de TEVU para retomarlo en cuanto se resuelvan esos problemas.
- 4.** En el caso del fideicomiso con la municipalidad de Heredia, también se alcanzó el punto de presentación del Perfil de Proyecto, se consultó el mismo con la contraparte técnica designada por la alcaldesa de Heredia, se tuvo una reunión con la alcaldesa para ver aspectos relacionados con el mecanismo de selección del fiduciario y se tuvo una sesión de trabajo con los regidores del Concejo Municipal para presentar los números del documento de Perfil. En este momento se está a la espera de la decisión de la alcaldesa y los equipos técnicos sobre el proceso de selección del fiduciario y de la presentación formal del Perfil del Proyecto al Concejo para su aprobación.
- 5.** En cuanto al fideicomiso del cantón de San José, se tuvo una sesión de trabajo con la contraparte técnica designada por el alcalde, para que indicara al Proyecto TEVU los alcances previstos del fideicomiso y las obras proyectadas, a fin de preparar el Perfil de Proyecto respectivo. Se recibió de parte de la municipalidad información sobre las iniciativas que se quieren llevar adelante y se solicitó una nueva reunión presencial para afinar los detalles de la propuesta. Se espera contar con el Perfil del Proyecto en abril de este año y presentarlo a las autoridades en abril o mayo.
- 6.** En el caso del fideicomiso del cantón de Santa Bárbara, se resolvieron algunos temas relacionados con la contratación del consultor y se logró la firma del contrato para realizar este trabajo en el mes de marzo. Se espera tener los resultados de este trabajo al finalizar el segundo trimestre del 2026.

- 7.** En cuanto al tema de los proyectos de ley, se le dio seguimiento a algunas observaciones pendientes del proyecto de Ley de Economía Circular. También se tuvieron sesiones de trabajo para analizar observaciones del proyecto de ley No. 25.058, para el impulso a un transporte público limpio y eficiente, analizando las respuestas de ciertas instituciones a las propuestas hechas. Como parte de ese trabajo también se consultó a la municipalidad de Curridabat, sobre la propuesta que tiene ese gobierno local para introducir un transporte intracantonal, poniendo en contacto a la persona encargada de ese tema en ese municipio con la asesora de la diputada proponente del proyecto de ley.
- 8.** En cuanto al tema de la electrificación del transporte público, se le dio seguimiento a una propuesta para la creación de una comisión mixta de representantes del sector público con el sector privado, que se indicó estaba en consulta en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este mismo tema, se culminó el apoyo al proceso de presentación de una propuesta al Mitigation Action Facility (MAF), para el financiamiento de un proyecto que facilite la introducción de buses eléctricos en el país. En este caso se apoyó el trabajo del PNUD en revisar la propuesta y sostener reuniones con UNCDF, la agencia partner de PNUD en esta propuesta.
- 9.** En este punto también se han sostenido contactos con la empresa BIUSA, a fin de determinar el avance del plan de electrificación de la flota de buses de esta empresa y el impacto que el proceso ha tenido.
- 10.** Se siguió el apoyo al tema de la Ruta del Agua y el Bosque, iniciativa impulsada por los municipios de Heredia, San Rafael y Belén, propiamente en la discusión sobre la forma legal de incorporar recursos municipales al fideicomiso de AguaTica, para que la iniciativa inicie con ese apoyo.
- 11.** Se apoyó el trabajo del PNUD en otros temas, propiamente en asesoría técnica en temas relacionados con descarbonización y en la planificación de una actividad sobre proyectos relacionados con agua para los gobiernos locales, en alianza con el CLACDS del INCAE.

COMPONENTE 4. Promoción, intercambio de conocimientos, creación de capacidades y asociaciones

Se reportan 4 nuevos productos en el I Cuatrimestre 2026, alcanzando un total de 97 productos de gestión del conocimiento. A continuación, el listado de nuevos productos:

- 12.** Guía para la Transición hacia Centros Educativos Ecológicos - Metodología Matzù
- 13.** Logo Ruta turística del Agua y Bosque (proyecto mancomunado en Heredia)
- 14.** Actualización de contenidos en sitio web y sharepoint TEVU
- 15.** Diseño de logo, tríptico, calcomanías y banner – CBI Garcimuñoz.

COMPONENTE 5. Plan de M&E implementado

El sistema de seguimiento y evaluación de TEVU muestra un avance del **84,80 %**. Esto incluye el análisis, los ajustes y la revisión de cada indicador, así como el control del cumplimiento de los hitos del proyecto. Se actualizaron los riesgos del proyecto, así como las salvaguardas y el SESP. Cabe mencionar que dicho sistema de M&E se alinea a las disposiciones y solicitudes de PNUD Costa Rica. A la fecha el proyecto ha generado un total de **39** informes que evidencian los distintos reportes que gestiona el proyecto. Sumado a ello, se lleva un GANTT para llevar el control del reporte de avance de dicho indicador.

Aportes específicos a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

- Integración de la perspectiva de género en todos sus niveles: planificación, ejecución, seguimiento, relacionamiento institucional y trabajo territorial. Asesoría política y estratégica continua al proyecto, a la OET, a municipalidades aliadas y a otras instituciones, con el fin de consolidar decisiones y acciones

coherentes con los principios de igualdad de género. Acompañamiento en procesos de articulación territorial, participación comunitaria e incidencia institucional con enfoque de igualdad.

- Fortalecimiento de la participación y el liderazgo de las mujeres en la gestión comunitaria del agua: Las actividades de capacitación y las mesas de trabajo desarrolladas para la definición de la estructura organizativa de la RGCA promovieron la participación equitativa de las mujeres en los procesos de formación y toma de decisiones. Este proceso permitió reconocer, visibilizar y fortalecer el liderazgo de las mujeres gestoras comunitarias del agua, asignándoles roles y funciones estratégicas dentro de la Red, especialmente en contextos rurales.
- Enfoque inclusivo en actividades ambientales y de voluntariado: Las jornadas de limpieza y las actividades de sensibilización ambiental se desarrollaron bajo un enfoque inclusivo, fomentando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones y promoviendo la corresponsabilidad en la protección de los cuerpos de agua y el ambiente.
- En el caso específico del equipo Arquí/Civil, en todos los proyectos que se implementan, desde el diseño hasta la ejecución, se incluye la mayor cantidad de medidas con perspectiva de género que se estén dentro del alcance de los proyectos. Esto incluye luminarias para evitar zonas oscuras e inseguras, botones de pánico, selección de especies nativas que no obstruyan la visibilidad y claridad de los espacios públicos, presencia de grupos de mujeres en talleres de diseño, entre otras medidas adoptadas.
- La comunicación visual en TEVU, promueve la visibilización y la participación de mujeres, niñas y adolescentes en todas las actividades y entornos que logramos impactar. Se recomienda siempre el uso de fotografías que evidencien la participación femenina en todo lo que hacemos. La evidencia es clara, nos siguen y participan más mujeres que hombres en los eventos que realizamos. Especialmente se retomó el diseño de rótulos con perspectiva de género para el Área de Conservación Central.

Gestión del conocimiento

- Actualización de sitio web: <https://www.tevucr.org/>
- Infraestructura azul fortalece el saneamiento de ríos en el TEC y la UNA: <https://www.tevucr.org/node/326>
- Video de biojardineras: xxxxxxxx

4. REGISTRO DE DESAFÍOS Y TEMAS PENDIENTES

A continuación, indique si hay temas en los que no se ha logrado avanzar o bien, enumere los desafíos o problemas que el proyecto está enfrentando y que requieran de algún apoyo de la Gerencia del PNUD para solucionarlos:

Tema pendiente/ desafíos y/o problema	Fecha de identificación	Medidas de manejo / posibles soluciones	Solicitud de apoyo a la Gerencia
El principal problema que existe para avanzar en las propuestas del componente 3 es la capacidad de reacción institucional, propiamente en el caso de los municipios, pues no han demostrado una capacidad suficiente para poder avanzar en la realización de los análisis de preinversión, propiamente para el caso de los fideicomisos.	Noviembre 2025	Acompañamiento 1 a 1 con cada municipio	Sería importante buscar una organización social que permita multiplicar los apoyos en el ámbito municipal y que pueda ayudar en el trabajo de preinversión. Esta posibilidad se le ha planteado al PNUD.
Lograr que el gobierno local y las personas usuarias comprendan y acompañen con apertura el proceso de validación de una	Octubre 2025	Mantener el monitoreo técnico científico	Acuerpar el rigor científico y técnico que

tecnología innovadora basada en la naturaleza —única en Centroamérica— (Vereda San Juan), que requiere tiempo, monitoreo y ensayos de laboratorio para comprobar su efectividad. Este proceso implica manejar adecuadamente las expectativas institucionales y comunitarias, así como atender las quejas o inquietudes que puedan surgir ante eventuales imprevistos, asegurando que la fase experimental se asuma como una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades, y no como un fracaso o retroceso.		(laboratorio de datos) en la intervención hasta diciembre 2025. Diseño de investigación social sobre la percepción de las partes de interés.	ha imperado durante la ejecución del proyecto.
A pesar de las discusiones con el sector eléctrico, la propuesta de creación de un fideicomiso con ellos no termina de avanzar, a la espera de más claridad política para entender mejor el proceso de electrificación del transporte público. Se espera que la creación de la comisión mixta por parte del MINAE, pueda solventar esta situación	Desde 2022	Diferentes sesiones de trabajo con el sector eléctrico. Continúa a la espera de la creación de la comisión mixta por parte del MINAE, a fin de impulsar un marco más claro para impulsar la electrificación del transporte eléctrico, particularmente facilitando el diálogo entre los actores del proceso.	Mantener apoyo.
Se mantiene pendiente el apoyo a la iniciativa de tren eléctrico interurbano del actual gobierno, que estaba prevista en el AWP para todo el año. No obstante, se está a la espera del avance del Incofer sobre el tema.	Desde 2022	N/A	N/A
La falta de alineación institucional a nivel de gobierno local impidió la continuidad de los proyectos del Bulevar del Museo de los Niños y de SBN para la mitigación de inundaciones en Goicoechea.	Enero 2026	N/A Arreglos institucionales fuera del alcance del proyecto.	Mantener apoyo.

5. REGISTRO Y GESTIÓN DE RIESGOS

Utilice esta sección para identificar, describir y analizar los riesgos del proyecto que:

- 1) tuvieron un impacto en los entregables o productos del proyecto (calidad, cronograma, etc.) durante el período del informe, o
- 2) fueron identificados recientemente durante el período del informe y están siendo abordados por el proyecto (en el caso de riesgos, “abordados” significa mitigar sus efectos, disminuir la probabilidad de impacto y/o transformarlo en una oportunidad) .

Para obtener detalles sobre la gestión de riesgos del proyecto, consulte la [Gestión de riesgos de POPP](#) y el [Manual del PNUD sobre planificación, seguimiento y evaluación de resultados de desarrollo](#) (página 48).
(Extensión sugerida: media página a 1 página)

A nivel de riesgos, y por solicitud y seguimiento del modelo de M&E del PNUD, se procedió a:

1. Actualizar la Evaluación de Riesgos TEVU, según catalogo del PNUD.
2. Actualizar la Evaluación de Riesgos SESP, según ProDoc del Proyecto y nuevas disposiciones de PNUD Regional.
3. Actualizar el SESP, según última versión Word, y nuevas disposiciones de PNUD Regional.

Utilice esta sección para registrar los nuevos riesgos identificados (en caso de que aplique)

Ver anexo 1. Riesgos TEVU [Anexo1. Riesgos TEVU.pdf](#)

Ver anexo 2. SESP-offline PIMS [Anexo 2. SESP offline PIMS 6270 Español -TEVU-.pdf](#)

Evento	Causa	Impacto (s)	*Categoría del riesgo	**Impacto, probabilidad y nivel de riesgo
Identificados en Prodoc o nuevos riesgos				
Identificados en Prodoc o nuevos riesgos				
Identificados en Prodoc o nuevos riesgos				
Identificados en Prodoc o nuevos riesgos				

*Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.

**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)

6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Actividad/componente		Monto Total Aprobado en el AWP 2025	Gasto en el Período del informe								Gasto Total ejecutado hasta la fecha \$	Gasto Total ejecutado hasta la fecha Colones	% de ejecución
			I		II		III		IV				
			COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES			
C1	REFORMA POLÍTICA BASADA EN EVIDENCIA PARA UNA ECONOMÍA VERDE Y PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA SOSTENIBLE	\$406 820.24	€65 681 420,12	\$130 658,98	€57 513 791,54	\$114 008,39	€46 494 529,14	\$92 569,39	€29 538 333,69	\$59 528,07	\$396 764,84	€199 228 074,49	98%
C2	INVERSIONES SOSTENIBLES INTEGRADAS BAJAS EN CARBÓN, RESILIENTES, DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TIERRAS	\$777 897.75	€76 383 218,22	\$151 769,50	€64 256 055,86	\$127 382,51	€90 389 717,35	\$179 837,95	€138 258 456,01	\$278 080,65	\$737 070,61	€369 287 447,44	95%
C3	FINANCIACIÓN INNOVADORA Y AMPLIACIÓN A ESCALA	\$373 841.96	€44 542 302,69	\$88 569,11	€44 920 525,03	\$89 178,57	€48 626 127,69	\$96 775,12	€47 401 155,80	\$95 135,90	\$369 658,71	€185 490 111,21	99%
C4	PROMOCIÓN, INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ALIANZAS	\$183 826.67	€34 360 294,03	\$68 389,26	€21 856 431,54	\$43 334,69	€17 309 469,53	\$34 465,13	€16 367 989,41	\$32 861,04	\$179 050,11	€89 894 184,51	97%
C5	MONITOREO Y EVALUACIÓN	\$8 500.00	€0,00	\$0,00	€0,00	\$0,00	€0,00	\$0,00	€4 726 109,84	\$9 409,38	\$9 409,38	€4 726 109,84	111%
GP	GESTIÓN DEL PROYECTO	\$81 547.18	€9 735 456,84	\$19 353,96	€10 021 563,09	\$19 902,63	€10 199 067,11	\$20 297,44	€11 263 205,99	\$22 647,54	\$82 201,57	€41 219 293,03	101%
Total		\$1 832 433,80	€230 702 691,90	\$458 740,83	€198 568 367,06	\$393 806,79	€213 018 910,82	\$213 018 910,82	€247 555 250,74	\$247 555 250,74	\$1 774 155,22	€889 845 220,52	97%
			COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES	COLONES	DOLARES	DOLARES	COLONES	

¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?	Si (x)
	No ()
	Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto:
	\$1 832 433,80
*** En la Sesión N°7 de Junta Directiva (20-agosto-2025), se autoriza la modificación presupuestaria, reduciendo el presupuesto por un monto de \$193 702, 42	

7. ANEXOS

Incluya los anexos o evidencias que considere (publicaciones, productos de comunicación, notas de prensa, etc)
