

Informe anual

ESTADO DE DERECHO PARA AVANZAR HACIA EL ODS16+
CODIGO PROYECTO: 00129204

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS - PNUD



Tabla de contenido

Introducción.....	2
Líneas de proyectos	3
Marco de Resultados “Estado de Derecho para Avanzar hacia el ODS16+”	0
Avances al informe anual 2021 de acuerdo con el marco de resultados	0
Modelos de Justicia Local y Rural Primera Fase	0
Modelos de Justicia Local y Rural Segunda Fase	1
Prevención y Atención de las VBG Fortaleciendo el Acceso a la Justicia de las Mujeres Urbanas y Rurales del municipio de Cúcuta	6
Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y el proceso de reincorporación.	8
Promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.	11
Gestión del Conocimiento	14
Lecciones aprendidas.....	14
Demoras en la implementación	16
Historias de vida	17
Buenas prácticas	18
Informe financiero	19



Introducción

En el presente informe se exponen los principales avances del proyecto sombrilla “Estado de Derecho para Avanzar hacia el ODS16+” anualmente, en sus diferentes proyectos, Modelos de Justicia Local y Rural primera y segunda fase, Prevención y Atención de las VBG Fortaleciendo el Acceso a la Justicia de las Mujeres Urbanas y Rurales del municipio de Cúcuta, Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y el proceso de reincorporación, y Promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Aquí encontrarán una descripción de las acciones ejecutadas durante el año 2021, al igual que, las lecciones aprendidas, buenas prácticas, historias de vida y demoras en la implementación.

A través de este proyecto se trabaja en los siguientes productos esperados:

- ✓ **OUTPUT No. 1:** Capacidades institucionales y sociales fortalecidas para la prevención y atención de las violencias basadas en género
- ✓ **OUTPUT No. 2.** Capacidades institucionales y sociales generadas o fortalecidas, enfocadas hacia la conciliación y la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra
- ✓ **OUTPUT No. 3.** Cultura de justicia para la paz y la legalidad apropiada socialmente.
- ✓ **OUTPUT No. 4.** Fortalecimiento de las capacidades de las Comisarías de Familia para la administración de justicia a nivel territorial.
- ✓ **OUTPUT No. 5.** Generación de herramientas pedagógicas en derechos que faciliten la transformación ciudadana frente a los factores generadores de violencias basadas en género y en el contexto a la familia, así como el acceso a la justicia.
- ✓ **Output No. 6.** Identificación de las barreras y necesidades que tienen las organizaciones y personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos.
- ✓ **OUTPUT No.7.** Asistencia técnica y apoyo en implementación de estrategias para enfrentar la violencia sexual en el marco del conflicto.

Líneas de proyectos

A continuación, podrá observar el detalle de las entidades financiadoras a cada uno de los outputs del proyecto “Estado de Derecho para Avanzar hacia el ODS16+”.

N°	Output	Descripción	Donantes	Fecha de Inicio	Fecha estimada de Finalización
1	00122956	Violencias Basadas en Genero	MPTF	10/14/2020	17/07/2022
2	00122963	Resolución de Conflictos	MPTF	10/14/2020	17/07/2022
3	00122976	Justicia para la Paz	MPTF	10/14/2020	17/07/2022
4	00122980	Comisarías de Familia	Funding Window	22/09/2020	22/03/2022
			MJD 0481	20/05/2021	31/07/2022
5	00122981	Generación de Herramientas	MJD 0421	05/10/2020	28/02/2021
			Secretaria de Equidad de Genero	29/12/2020	30/06/2022
			MJD 0481	20/05/2021	31/07/2022
6	00123620	Derechos Humanos	MPTF	01/01/2021	31/12/2022
7	00129153	Estrategia Violencia Sexual	MJD 0641	21/10/2021	25/03/2022

Marco de Resultados “Estado de Derecho para Avanzar hacia el ODS16+”

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					
			Valor	Año	2020	2021	2022	2023	FINAL	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Producto 1. Capacidades institucionales y sociales fortalecidas para la prevención y atención de las violencias basadas en género	1.1. Número de municipios con instituciones que tienen injerencia en la prevención y atención de las violencias basadas en género en capacidad de hacer uso de la Guía de Atención a Mujeres y Población LGBTI en los Servicios de Acceso a la Justicia y Protocolo de atención a la mujer rural para el acceso a la justicia y a la tierra.	Informes de los proyectos sustentados con documentos administrativos de atención municipal	N/D	N/D	0	16	6	N/A	22 municipios PDET usando las guías y el protocolo de atención a la mujer rural frente a VBG y justicia agraria.	Por medio de, la creación e institucionalización de espacios de articulación y atención, se espera recolectar datos sobre cambios en el nivel de conocimiento técnico y el impacto y utilidad de los espacios de intercambio.
	1.2 Número de Municipios con presencia de comisarías de familia fortalecidas para prestar una atención integral y de calidad a las víctimas de violencias de género, conocer y difundir las rutas y protocolos de atención.	Informes de los proyectos sustentados con documentos administrativos de atención municipal	N/D	N/D	0	18	4	N/A	22 municipios PDET con Comisarías de Familia fortalecidas.	Por medio de tests de conocimiento técnico y seguimiento a Comisarías de Familia, se espera recolectar datos sobre cambios en el nivel de conocimiento y el impacto de los servicios de atención de las Comisarías.
	1.3. Número de Municipios que han implementado una estrategia para la transformación de los imaginarios y de las prácticas victimizantes y tolerantes hacia la violencia de género.	Evidencia audiovisual e informes administrativos de Alcaldías Municipales y otros actores locales	N/D	N/D	0	18	0	N/A	Al menos 18 de los 20 municipios PDET implementan estrategia para cambio cultural	Por medio de la recolección en terreno de las evidencias de implementación de campañas de comunicación, cátedras escolares, y otros instrumentos de cambio cultural.

	1.4. Número de municipios que reciben apoyo en el proceso de implementación y seguimiento de los Modelos de Justicia Local y Rural (MJLR) en el territorio a través de 22 enlaces municipales.	Informes de capacitaciones, listados de asistencia y documento de seguimiento de la implementación	N/D	N/D	0	22	0	N/A	22 municipios implementan la estrategia (MJLR)	A través de documentos de seguimiento técnicos, análisis e informes de desarrollo de actividad
Producto 2. Capacidades institucionales y sociales generadas o fortalecidas, enfocadas hacia la conciliación y la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra	2.1 Número de municipios Participantes (funcionarios, servidores públicos y/o hombres y mujeres) en capacitaciones o formaciones que apropian el conocimiento para una adecuada gestión de conflictos de uso y tenencia de la tierra	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	11 (apoyados por USAID/JSP)	2019	0	11	0	N/A	En al menos 22 municipios participantes municipios servidores públicos y personas de la comunidad apropian conocimiento sobre MRC para conflictos agrarios. (Incluidos los 11 apoyados por USAID/JSP).	Por medio de, tests de conocimiento técnico y seguimiento a la creación e institucionalización de espacios de articulación y atención, se espera recolectar datos sobre cambios en el nivel de conocimiento técnico y el impacto y utilidad de los espacios de intercambio.
	2.2. Número de municipios con herramientas eficientes y eficaces para la resolución de los conflictos de uso y tenencia de la tierra	Informes de equipo territorial con evidencias sobre conflictos de uso y tenencia de la tierra solucionados	11 (apoyados por USAID/JSP)	2019	0	0	11	N/A	En al menos 22 municipios se instalan mecanismos sostenibles para resolución de conflictos de uso y tenencia de tierra (Incluidos los 11 apoyados por USAID/JSP)	Por medio de informes técnicos con evidencia. Los informes deben dar cuenta de la resolución efectiva de conflictos de uso y tenencia de la tierra por parte de participantes en los procesos.
Producto 3. Cultura de justicia para la paz y la legalidad apropiada socialmente	3.1. Número de Municipios donde se implementan estrategias de promoción de una cultura de solución pacífica de conflictos	Informes de proyecto sustentados con documentos administrativos de atención municipal	0	0	0	0	11	N/A	11 municipios PDET implementan estrategia para cambio cultural	Por medio de informes técnicos con evidencia de campañas de comunicación, cátedras escolares y otros mecanismos implementados por OSC para la promoción de cultura de paz y legalidad.
	3.2. Número de municipios que Implementan iniciativas PDET relacionadas con cultura de paz y legalidad, en alianza con OSC y organizaciones comunitarias	Informes de proyecto sustentados con documentos administrativos de atención municipal	11 (apoyados por USAID/JSP)	2019	0	0	11	N/A	22 municipios PDET implementan estrategia para cambio cultural (Incluyendo los 11 apoyados por USAID/JSP)	Por medio de informes técnicos con evidencia de campañas de comunicación, cátedras escolares y otros mecanismos implementados por OSC

										para la promoción de cultura de paz y legalidad.
Producto No 4. Fortalecimiento de las capacidades de las Comisarías de Familia para la administración de justicia a nivel territorial	4.1 Número de municipios donde las Comisarías de Familia fueron dotadas con equipos de protección personal (EPP)- kits básicos de caretas y tapabocas, acompañados de campañas de comunicación.	Evidencia audiovisual e informes administrativos de las Comisarías de Familia	N/D	N/D	170	180	N/A	N/A	170 municipios PDET y 180 adicionales en estado de alta necesidad adoptan medidas de bioseguridad y cuentan con equipos tecnológicos para la implementación del sistema de información.	Por medio de la recolección de las evidencias de adopción y uso de medidas de bioseguridad, así como de la implementación del sistema de información y el uso de equipos tecnológicos
	4.2 Número de municipios que fueron dotados con equipos tecnológicos y con las capacitaciones técnicas necesarias para la implementación y adecuada gestión del sistema integrado de información.	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	0	11	11	N/A	22 municipios PDET con Comisarías de Familia capacitadas y usando el sistema integrado de información.	Por medio de tests de conocimiento técnico y seguimiento a Comisarías de Familia, se espera recolectar datos sobre cambios en el nivel de conocimiento de los Comisarios de Familia y el impacto que esto tiene en los servicios de atención al ciudadano.
	4.3 Número de participantes (funcionarios, servidores públicos y/o hombres y mujeres) del Ministerio Público que fueron capacitados para hacer el monitoreo y a la efectiva implementación de los sistemas integrados de información en las Comisarías de Familia.	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	0	0	4	N/A	4 funcionarios que de la PGN fueron capacitados para hacer seguimiento a la efectiva implementación del sistema integrado de información en los 22 municipios.	Por medio de informes de seguimiento de la PGN a la implementación del sistema de información.
	4.4 Número de Comisarías de Familia asistidas técnicamente en la transversalización del enfoque de género en sus planes, programas, proyectos y políticas para mejorar sus capacidades en la atención y administración de justicia frente a casos de violencia basada en género.	Informes con recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los modelos de atención de las Comisarías de Familia.	N/D	N/D		10	10	N/A	20 municipios PDET con Comisarías de Familia asistidas técnicamente en la transversalización del enfoque de género.	Por medio de informes técnicos con evidencia. Los informes deben dar cuenta de las recomendaciones hechas a las Comisarías en materia de transversalización del enfoque de género en sus modelos de atención a

										violencias basadas en género.
	4.5. Nivel de avance en la estrategia de Actualización y acompañamiento para la Implementación de Lineamientos Técnicos en Comisarías de Familia	Informes con recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los modelos de atención de las Comisarías de Familia.	N/D	N/D	N/A	45% %	55%	N/A	Creado un Instrumento de diagnóstico del contexto, de la operación y de la prestación del servicio de las Comisarías de Familia y los resultados de su aplicación en cada Comisaría.	Plan de mejoramiento para cada comisaría de familia.
	4.6. Nivel de avance en la consolidación de Sistema de Información de Comisarías de Familia	Informes con recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los modelos de atención de las Comisarías de Familia.	N/D	N/D	N/A	25%	75 %	N/A	Elaborado un sistema de información a través de un Plan de Gestión	Documento de análisis Documento de arquitectura Software Packages, código fuente
	4.7. Nivel de avance en la consolidación de un Diagnóstico de Tolerancia a la Violencia Basada en Género	Informes con recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los modelos de atención de las Comisarías de Familia.	N/D	N/D	N/A	20%	80%	N/A	Elaborado un documento que contengan la consolidación de un diagnóstico de tolerancia a la violencia basada en género.	Formato de encuesta adaptado. Resultados de aplicación de la encuesta. Análisis de resultados. Recomendaciones de acción.
	4.8 Nivel de avance en la consolidación de la estrategia de Fortalecimiento Institucional	Informes con recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los modelos de atención de las Comisarías de Familia.	N/D	N/D	N/A	45%	55%	N/A	Desarrollada una estrategia Pedagogía en Derechos. Tolerancia a la Violencia Basada en Género en las Facultades de Derecho.	Directorio de liderazgos territoriales
Producto 5. Generación de herramientas pedagógicas en derechos que faciliten la transformación	5.1 Nivel de avance en la construcción de la Línea Técnica para la Prevención de la VBG y la VIF dentro del Componente de Bienestar Comunitario del Programa	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	20%	80%	N/A	N/A	Elaborado un documento que contenga la Línea Técnica para la prevención de la VBG y VIF	Los productos aquí planteados serán realizados de manera conjunta con la Dirección Justicia Formal de Ministerio de Justicia y del Derecho y el PNUD de

ciudadana frente a los factores generadores de violencias basadas en género y en el contexto a la familia, así como el acceso a la justicia.	Familias en Acción y Jóvenes en Acción.									manera conjunta. La información insumo de estos, la tiene el Ministerio.
	5.2 Nivel de avance en la Implementación de la estrategia en los Programas de Familias y Jóvenes en Acción, para el trabajo comunitario permanente en temas relacionados con violencias basadas en género, violencias en el contexto de la familia, y acceso a la justicia.	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	20%	80%	N/A	N/A	Diseñado e impreso el material pedagógico para la estrategia sobre violencias basadas en género, violencias en el contexto de la familia, y acceso a la justicia.	
	5.3 Nivel de avance de la construcción de una (1) Estrategia de prevención de violencias basadas en género	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	0	100%	N/A	N/A	Municipio de Cúcuta que cuenta con una estrategia de prevención Basada en género	Los productos aquí planteados serán realizados de manera conjunta con el Municipio de Cúcuta - secretaria de Equidad. La información insumo de estos, la tiene el Municipio.
	5.4 Nivel de avance en la construcción de una estrategia pedagógica bajo documentos Guías y/o protocolos de atención a la mujer urbana y rural frente a violencia contra la mujer (VCM) y acceso a la justicia	Informes de capacitaciones, listados de asistencia virtual y tests de conocimientos	N/D	N/D	0	90%	10%	N/A	Diseñado e impreso material pedagógico que contribuye a la estrategia de atención a la mujer urbana y rural frente a violencia contra la mujer (VCM) y acceso a la justicia.	
	5.5. Número de municipios que implementan el componente de apropiación de la justicia para la paz y la legalidad en el marco de los modelos de justicia local y rural.	Informes de los proyectos sustentados con documentos administrativos de atención municipal	N/D	N/D	N/A	0	20	N/A	20 municipios promueven una cultura de solución pacífica de conflictos bajo el componente de apropiación de la justicia para la paz y la legalidad en el marco de MJLR	Diagnóstico de conflictividad
	5.6. Número de municipios que desarrollan jornadas móviles de conciliación	Informes de los proyectos sustentados con documentos administrativos de atención municipal	N/D	N/D	N/A	0	25	N/A	25 municipios donde se desarrollaron Jornadas móviles de conciliación en derecho.	Aprestamiento Institucional

	5.7. Número de municipios que implementan la estrategia de sistemas locales de justicia	Informes de los proyectos sustentados con documentos administrativos de atención municipal	N/D	N/D	N/A	0	6	N/A	6 municipios donde se implementan los Sistemas Locales de Justicia	Identificar las propiedades y las características de los elementos que integran el SLJ.
Producto No 6. Identificación de las barreras y necesidades que tienen las organizaciones y personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos.	6.1 Nivel de avance en el Mapeo de los cementerios con énfasis en la ubicación de personas no identificadas e identificadas no reclamadas.	Documentos de caracterización, informes de capacitaciones, Herramientas jurídicas	N/D	N/D	100%	1	N/A	N/A	Mapeo realizado	Los productos aquí planteados serán realizados de manera con la Dirección de DDHH de Min Interior y el PNUD de manera conjunta. La información insumo de estos, la tiene el Ministerio.
	6.2 Nivel de avance en la elaboración de Material pedagógico para la implementación de la gestión preventiva del riesgo realizado	Documentos de experiencias pedagógicas realizadas por el Ministerio del Interior	3	2019	100%	1	N/A	N/A	Material pedagógico diseñado e impreso	
	6.3 Nivel de avance en la construcción de un Documento de Política pública de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización diseñado e implementado	Ayudas de memoria del proceso de construcción de la política	N/D	2020	100%	1	N/A	N/A	Documento de política pública realizado	
	6.4 Nivel de avance en la construcción de un Documento sobre las dinámicas económicas criminales territoriales elaborado.	Información del Sistema de Alertas Tempranas de la DP. Informes de la Fiscalía General de la Nación	2	2019	100%	N/A	N/A	N/A	Documento realizado	
	6.5 Nivel de avance en la implementación de un documento de piloto de caracterización de organizaciones de liderazgo social en territorios priorizados elaborado.	Ayudas de Memoria del Proceso Nacional de Garantías	10	2019/ 2020	100%	N/A	N/A	N/A	Piloto implementado	Esta caracterización depende en buena medida de la voluntad de las Organizaciones y de las plataformas de DDHH de participar en el proceso de caracterización
	6.6 Nivel de avance en la construcción de una Estrategia de difusión de las acciones del plan de acción de la política	Documento de Plan de acción de la política LGBTI	1	2020	100%	N/A	N/A	N/A	Documento de estrategia realizado	La información base ya la tiene la Dirección de DDHH, con lo cual no existen riesgos para

	pública para los sectores LGBTI elaborada.									avanzar en la construcción de la estrategia.
	6.7. Número de comités y mesas técnicas desarrollados / Total de comités y mesas técnicas planificados	Ayudas de memoria comités y mesas técnicas	N/D	N/D	0	44%	94%	100%	Jornadas de acompañamiento técnico desde el PNUD en la ejecución y seguimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo	A través de las reuniones convocados en los comités y mesas se realiza un acompañamiento técnico en el seguimiento y elaboración de los productos desde el PNUD
	6.8. Número de líderes sociales formados para fomentar la participación de sus comunidades en espacios de decisión.	Listado de beneficiarios de acciones de proyecto	N/D	N/D	0	300	600	1000	1000	Los listados de beneficiarios dan cuenta del número total de líderes sociales formados
	6.9 Número de personas (líderes y lideresas de ddhh y otros grupos priorizados) que participan de manera activa en el diseño y validación de estrategias de prevención y protección colectivas comunitarias con enfoque de género y diferencial.	Informes de capacitaciones, listados de asistencia y documento de propuesta	N/D	N/D	0	30	42	60	60	EL documento de propuesta junto con los listados de asistencia debe dar cuenta de la participación en el diseño de estrategias de prevención y protección colectiva comunitaria
	6.9 Grado de satisfacción de los participantes con respecto al proceso de diseño y validación de estrategias de prevención y protección colectivas comunitarias con enfoque de género y diferencial.	Encuesta aplicada a los participantes	ND	N/D	0	100%	100%	100%	100%	La encuesta aplicada a los participantes da cuenta del grado de satisfacción de los mismos frente a las estrategias diseñadas

<p>6.10 Numero de servidores públicos del nivel regional que mejoran sus conocimientos en relación con la seguridad y protección para la promoción del liderazgo social y la defensa de los DDHH con enfoque de género.</p>	<p>Listados de asistencia, prueba de conocimiento de entrada y salida, Material pedagógico</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>70</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Las pruebas de conocimiento de entrada y salida evidencian el número de servidores públicos que mejoran los conocimientos en relación con seguridad y protección para la promoción del liderazgo social.</p>
<p>6.11. (a) Número de personas desagregadas por sexo que fortalecen sus conocimientos y capacidades en materia de autoprotección individual y colectiva con enfoque de género</p>	<p>Listado de asistencia y Contenidos de cursos de capacitación</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>0</p>	<p>300</p>	<p>700</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>A través de los listados de personas, así como los contenidos del curso se verifica el número de beneficiarios que fortalecen sus conocimientos y capacidades en materia de autoprotección individual y colectiva.</p>
<p>6.11. Grado de apropiación de conocimiento por parte de líderes y lideresas en materia de autoprotección individual y colectiva con enfoque de género.</p>	<p>Prueba técnica aplicada a los participantes y análisis de resultados</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>ND</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>La prueba técnica aplicada, así como los análisis de resultados permite dar cuenta del proceso de apropiación de conocimiento en materia de autoprotección</p>
<p>6.12 Número de personas (desagregadas por grupo y sexo) capacitadas que participan en la ejecución de estrategias de prevención.</p>	<p>Listados de asistencia, instrumentos de caracterización y actas de espacios de participación</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>0</p>	<p>371</p>	<p>865</p>	<p>1236</p>	<p>1236</p>	<p>Los instrumentos de caracterización evidencian el número de personas capacitadas que participan en la ejecución de estrategias de prevención.</p>
<p>6.12. Número de personas en los municipios priorizados que son sensibilizadas frente a la labor del liderazgo social y la defensa de los DDHH</p>	<p>Informes de cobertura alcanzada y piezas de comunicación</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>0</p>	<p>5400</p>	<p>12600</p>	<p>18000</p>	<p>18000</p>	<p>Mediante las herramientas de informes de cobertura alcanzada y piezas comunicativas se logra sensibilizar a las personas en materia de la labor de liderazgo social.</p>

6.13. Numero de iniciativas territoriales impulsadas para la prevención temprana y superación de la estigmatización	Documentos de identificación de iniciativas, actas e informes de ejecución	N/D	N/D	0	2	5	7	7	A través del desarrollo conjunto se logra construir el documento de identificación de iniciativas para la prevención temprana y superación de la estigmatización
6.14. Numero de espacios locales fortalecidos para la definición de planes de prevención temprana	Listados de asistencia, Planes de acción formulados y actas de espacios de participación	N/D	N/D	0	2	5	7	7	A partir de un ejercicio de construcción colectiva se logra la formulación de planes de acción para la prevención temprana de riesgos
6.14 Nivel de satisfacción de los participantes con respecto al proceso de definición de planes de prevención temprana	Encuesta aplicada a los participantes	N/D	N/D	0	100%	100%	100%	100%	La encuesta aplicada a los participantes permite dar cuenta del proceso de apropiación de conocimiento con relación al proceso de definición de planes de prevención temprana.
6.15. Número de mujeres reincorporadas vinculadas a las acciones de prevención y gestión de los riesgos de victimización.	SIR Registro de actividades ARN, actas de reunión y material pedagógico	N/D	N/D	0	625	1457	2082	2082	Mediante el registro de actividades de la ARN junto con el material pedagógico utilizado para tal fin, se logra vincular a mujeres reincorporadas en las acciones de prevención y gestión de los riesgos de victimización.
6.16 Numero de productos o servicios mejorados y/o desarrollados	Planes de negocio	N/D	N/D	0	9	21	30	30	A través de los documentos de planes de negocio se logra consolidar el impulso mejora de los mismos en los territorios priorizados

Producto 7. Asistencia técnica y apoyo en implementación de estrategias para enfrentar la violencia sexual en el marco del conflicto	7.1 Número de casos documentados de víctimas de violencia sexual		N/D	2021	0	146	0	0	146 casos documentados de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado	Por medio de informes técnicos y actas de las actividades adelantadas por el Min Justicia y el PNUD
	7.2 Nivel de avance del diseño de la una nueva estrategia para que las mujeres y población con identidad sexual diversa víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado cuenten con las condiciones que faciliten su acceso a la justicia.		N/D	2021	0%	100%	0%	0%	100%	Por medio de informes técnicos y actas de las actividades adelantadas por el Min Justicia y el PNUD

Avances al informe anual 2021 de acuerdo con el marco de resultados

Modelos de Justicia Local y Rural Primera Fase

Resultado

Mejorado el acceso de la población que vive en territorios rurales a mecanismos de justicia formal y alternativa, con el fin de garantizar mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios.

Avance: Se cuenta con una línea base de la evaluación sumativa y formativa de MJLR; sin embargo, a través de las acciones que se están implementando, la población que vive en territorios rurales junto con las instituciones públicas adquieren los conocimientos y habilidades que permiten eliminar brechas de acceso a la justicia, promover y respetar la equidad de género, así como promover la justicia juvenil restaurativa y a usar mecanismos de resolución de conflictos como servicios claves de acceso a la justicia en los municipios PDET. Una vez se tome la línea de información final, se podrá conocer la incidencia de las actividades en MJLR.

Resultado

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales para la prevención y atención de las violencias basadas en género.

Avance: Las Comisarías de Familia (CF) e institucionalidad de (Alcaldías, Inspección de policía, fiscalía, etc), (11) de (22) municipios, cuentan con los protocolos y rutas de atención sobre VBG, mujer rural y población LGTBIQ+; adicionalmente, (18) de (22) CF están en un proceso de fortalecimiento de capacidades para la atención de un servicio de calidad e integral a víctimas de VBG. Se han realizado en (12) municipios de (22) actividades para contrarrestar imaginarios. Al finalizar, se llegará a los 22 municipios en donde se esperan cambios de percepciones en la transformación de los imaginarios y de las prácticas victimizantes en torno a la VBG, dato que se conocerá en el informe de la evaluación sumativa del proyecto.

Resultado

Generación o fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales enfocadas hacia la conciliación y la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra.

Avance: Se dio el fortalecimiento en capacidades sobre resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra en (22) municipios a líderes comunitarios, comunidad en general e institucionalidad, entre



ellos participaron (90) funcionarios. Adicionalmente, se avanzó en la primera de (22) jornadas de conciliación en el municipio de Buenos Aires Cauca, promoviendo la conciliación como herramienta para la resolución de conflictos del uso y la tenencia de la tierra, durante febrero y marzo se continúa la acción en los demás territorios. Se avanza en el levantamiento de información final sobre las percepciones de la promoción y apropiación del conocimiento en conciliación.

Resultado

Apropiación social de la justicia para la paz y la legalidad.

Avance: Se avanza en el fortalecimiento en planeación, presupuesto, y temas administrativos en proyectos con actividades enfocadas en el pilar 8 (acciones enfocadas en la construcción de paz y legalidad) con (44) organizaciones sociales de (22) municipios; (15) propuestas fueron enviadas al área de SVB del PNUD para formalizar las propuestas e iniciar la implementación de actividades. Adicionalmente, se avanza en la implementación del eje transversal de actores locales el cual está promoviendo la articulación de sociedad civil, operadores de justicia y autoridades administrativas que permitan mejorar el acceso a los diferentes servicios de justicia; se ha realizado el módulo I y II en (14) de (22) municipios, se continúa con la implementación de los módulos III y IV. Una vez finalice el proyecto, se conocerá el nivel de % de cambio de percepciones en relación con la confianza en las instituciones y la percepción de la prosocialidad y el nivel de % de cambio de percepciones en la promoción de una cultura de solución pacífica de conflictos.

Resultado

Fortalecimiento de las comunidades y funcionarios públicos para la apropiación y uso de prácticas de justicia restaurativa juvenil.

Avance: Se avanzó en el fortalecimiento de conocimientos a docentes, comunidad en general, jóvenes y funcionarios públicos, sobre justicia restaurativa juvenil; además, se creó unas triadas y/o diadas en los (22) municipios, quienes están a través de la identificación de casos, brindar apoyo a los jóvenes a guiar y resolver sus casos, con el fin de evitar la ley impunitiva y orientar los jóvenes a la prevención. Se conocerá al final, los resultados de la apropiación y el uso de prácticas de justicia juvenil restaurativa.

Modelos de Justicia Local y Rural Segunda Fase

Resultado

Adelantar procesos de fortalecimiento institucional y de robustecimiento comunitario, con el objetivo de contribuir a reforzar y consolidar el acceso a la justicia inclusiva, incidir positivamente en la reducción de la violencia contra mujeres y población LGBTI, y fortalecer el conocimiento comunitario frente a los derechos de las personas en riesgo o víctimas de estas violencias y la ruta para acceder a la justicia.

Avance:



I. Componente de atención a Comisarías de Familia

1. Elaboración Metodológica Justicia Formal. Se finalizó el documento que contiene la guía metodológica de implementación de las etapas del fortalecimiento a las Comisarías de Familia que es usado internamente por el equipo de trabajo para la correcta ejecución del componente.

2. Instrumento diagnóstico del contexto comisarial. Se lanzó la Encuesta de Valoración Técnica de las Comisarías de Familia – EVACOF. La encuesta fue remitida institucionalmente a los Comisarios y Comisarías a través del correo electrónico de la jefatura. Se comparte el enlace donde está ubicada la encuesta y la cual estará habilitada hasta el lunes 17 de enero de 2022 a las 00:00 horas horario nacional:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkv_nmnqm3RDJhxzUCSnufvBYWR3s7LeworoWG6EOPoZ9BQ/viewform

3. Metodología para construcción de Planes de Mejoramiento. Este documento en su versión final permitirá filtrar y llevar la información que levantaremos de las Comisarías de Familia a partir del diagnóstico EVACOF y las visitas en el territorio. Es una base datos soporte, parte del grueso documento de Planes de Mejoramiento individualizados. Con relación al trabajo que están realizando la orientación es esta: presentar en una propuesta los componentes, áreas, ítems, indicadores, entre otros, que deben y pueden llevar los planes de mejoramiento (según especialidad) de cara a lo que se pretende evaluar y hacer mejorar en un tiempo razonable. Para este ejercicio es importante tener en cuenta las preguntas de EVACOF porque ellas fijan el norte y por ellas obtendremos la información diagnóstica. Por lo tanto, pensarse que debería incluirse desde las preguntas EVACOF en los planes de mejoramiento, en clave para obtener un excelente resultado de esta acción.

4. Finalmente, se entregaron las versiones de los siguientes productos:

- a) Plan de Trabajo Metodológico del Componente;
- b) Instrumento de diagnóstico del contexto, de la operación y de la prestación del servicio de las Comisarías de Familia y los resultados de su aplicación en cada Comisaría;
- c) Metodología de Plan de mejoramiento para cada comisaría de familia;
- d) Talleres diseñados
- e) Listados de asistencia a los talleres y certificados a los participantes.
- f) Consolidación de observaciones efectuadas por las Comisarías de familia a la propuesta de reforma de los lineamientos.
- g) Versión inicial y versión final de la propuesta de reforma de los lineamientos.

II. Consultoría para la actualización de los lineamientos técnicos para las comisarías de familia (Métodos de Operación)

En cuanto a la construcción de los lineamientos técnicos para las Comisarías de Familia, se recibieron los comentarios y las dudas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho en el mes de diciembre, los cuales fueron revisados en conjunto con Viviana Herrera, para determinar su inclusión en el documento. De igual manera, se hizo con los comentarios generados por el comisario de familia.



Se remitió para revisión a Natalia Muñoz y Manuel Calderón, la propuesta del documento con los aportes incluidos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se realizó reunión para resolver dudas sobre la estructura del documento y el propósito e importancia de sus aportes al documento.

Durante la última semana de diciembre se están ajustando los documentos con los aportes de Natalia Muñoz y Manuel Calderón, relacionados con la atención diferencial como parte de la atención en las comisarías de familia.

De manera paralela, con la información ya recopilada y estructurada con diagramas de flujo, se elaboró listado de los registros y/o evidencias (anexo listado en Excel) de las actividades para remitir al equipo interdisciplinar y que determinen que formatos o plantillas deben diseñarse, y cuales ya existen o se pueden adaptar. Esto con el fin de entregar los lineamientos con sus correspondientes formatos y plantillas.

Finalmente, se preparó presentación para la secretaria de integración social, donde se expuso la metodología definida para la construcción de lineamientos, los principales avances y las actividades pendientes por desarrollar. Previo a esta reunión, se realizó reunión con el equipo interdisciplinar donde se presentaron los temas a proyectar por parte de esta consultoría. Anexo presentación.

III. Sistemas de Información de Comisarías de Familia

1. Se presenta el estado de avance de los módulos del sistema de información de Comisarías de Familia (S.I.C.F).

Módulos de niveles de atención

Nivel 1. Recepción - Solicitud Medidas De Protección

- Determinar si el caso es competencia de la comisaría de familia.
- Si es competencia crear el usuario en el sistema de información.
- Diligenciar el instrumento del riesgo e identificar el nivel del riesgo.
- Proyectar auto y adoptar medidas de protección provisionales
- Realizar los oficios (Noticia criminal)

Nivel 2: Intervención Jurídica

- Audiencia y adopción de medidas de protección definitivas.

Nivel 3: Intervención De Seguimiento.

- Acciones de seguimiento que verifiquen el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas.

Acciones de seguimiento social que permitan la no repetición de la violencia al interior de la familia.

Resultado

Apropiación social de la justicia para la paz y la legalidad.

Avance: Actualmente nos encontramos en el proceso de convocatoria con el fin que las Organizaciones Sociales participen enviando una propuesta la cual plantee un proyecto enfocado en



el desarrollo de acciones en clave de las iniciativas del pilar octavo (8) y que a su vez durante la implementación recibirán fortalecimiento de capacidades.

Desde el pasado 26 de noviembre hasta el 06 de diciembre de 2021, se estableció un periodo de preguntas e inquietudes, las cuales serían presentadas a través del correo institucional dispuesto para ello; sin embargo, durante este lapso no se allegaron preguntas o inquietudes.

El periodo de postulación de proyecto dio inicio el pasado 06 de diciembre y cierra el 07 de enero de 2022. Durante este periodo se han recibido 4 preguntas frente a los requisitos y trámite de postulación. Aunque esta etapa ya se surtió se entrega respuesta sobre requisitos a 4 organizaciones.

Teniendo en cuenta que aún no se han recibido postulaciones se refuerza la etapa de divulgación, para que las Organizaciones interesada se postulen para el fortalecimiento.

Resultado

Generación o fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales enfocadas hacia la conciliación y la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra.

Avance:

En el marco del componente, las actividades desarrolladas en diciembre estuvieron orientas con el fin de obtener como resultado final la realización de jornadas gratuitas de conciliación masiva en 25 municipios priorizados por el MJD, para tal se realizaron las siguientes actividades:

- Socialización del ABC de las jornadas en tres municipios de Antioquia: Valdivia, Tarazá, Briceño y Remedios.
- Socialización del ABC de las jornadas en tres municipios de Caquetá: Solano, Solita y El Doncello.
- Socialización del ABC de las jornadas en tres municipios del Cauca: Mercaderes, Piendamó, Suarez y López de Micay.
- Socialización del ABC de las jornadas en un municipio de Nariño: Olaya Herrera, Ricaurte y Cumbitara.
- Socialización del ABC de las jornadas en un municipio de Chocó: Medio San Juan y Carmen del Darién.
- Socialización del ABC de las jornadas en un municipio de Córdoba: Valencia, San Carlos, Cotorra.

En algunos municipios del proyecto se han presentado dificultades para la realización de las socializaciones por cuestiones de agendas locales y temas relacionados a seguridad, especialmente en los municipios de Medio Atrato y Sipí (Chocó), y Policarpa (Nariño).

Durante el mes de enero deben realizarse las siguientes socializaciones de las jornadas que se encuentran pendientes, con el fin de lograr el desarrollo de las dos etapas restantes dentro del tiempo estimado:

- Medio Atrato, Sipí (Chocó)



- Policarpa (Nariño)

Estas socializaciones son claves en el desarrollo del componente por cuanto permiten el logro de varios objetivos intermedios del proyecto:

- ✓ Informar a los actores locales sobre la realización de las jornadas y sus características.
- ✓ Definir los canales de comunicación más adecuados para la difusión amplia y la convocatoria a la ciudadanía a participar en las sesiones.
- ✓ Definir aspectos operativos y compromisos necesarios para la realización de las jornadas.

En segundo lugar, se trabajó en la elaboración de los mensajes comunicativos orientados a la realización de la etapa 2 de la metodología que serán utilizados en cada municipio de acuerdo con lo identificado en cada socialización. Esta actividad es esencial para lograr una adecuada convocatoria de la población participante y para lograr una efectiva identificación y atención de casos.

De igual manera se continuó la articulación con los Centros de Conciliación construyendo conjuntamente las propuestas de trabajo con el fin de viabilizar la intervención de las jornadas de conciliación. Se adjunta como anexo el informe correspondiente a la primera etapa del componente.

Resultado

Conformación de sistemas locales de justicia

Avance::

En el mes de diciembre se procedió a hacer la construcción del documento de aprestamiento institucional. El aprestamiento institucional consiste en la construcción consensuada de espacios para el despliegue del trabajo colaborativo entre los actores de justicia presentes en el territorio. Mediante este proceso se busca crear ambientes participativos y deliberativos en torno a la naturaleza de los conflictos, el arreglo institucional requerido para mejorar el acceso a la justicia en el territorio y las rutas de acceso que se adecuen al contexto e institucionalidad presente en el territorio.

El aprestamiento institucional es decisivo porque desde allí se da sentido al diálogo, se esbozan las buenas prácticas de apropiación local y se genera capacidad instalada en el territorio. En este paso lo que se busca es proveer elementos de juicio a quienes toman las decisiones en torno a la planeación que inciden en el funcionamiento de la justicia.

Diagnóstico territorial en los seis municipios intervenidos. Para el período de diciembre se construyó la versión final de la encuesta a oferentes de justicia, la cual fue implementada en el aplicativo para captura de información KOBO. Esta versión fue aprobada la segunda semana de diciembre por parte del equipo técnico del Ministerio de Justicia y el Derecho y en esa misma semana empezó la recolección de la información en los seis municipios de estudio. La recolección de esta encuesta se inició a mediados del mes y se suspendió desde el 24 de diciembre pues las entidades territoriales empezaron sus vacaciones de fin de año y no se pudo finalizar la recolección de esta información para todos los actores correspondientes.



Por otro lado, se adelantó la construcción de las fichas de caracterización de tres municipios de Córdoba, uno de Cauca y cinco de Caquetá. Esta herramienta hace parte de una entregable adicional que se pactó con el Ministerio y que servirá como material de apoyo a las visitas a los municipios. Adicionalmente, se entregó la primera versión de la Guía metodológica para el diagnóstico de conflictividades al equipo técnico del Ministerio para su respectiva revisión.

En cuanto a relacionamiento, para la recolección de información para el diagnóstico de conflictividades se avanzó en la realización de encuestas por medio de entrevistas directas con los oferentes de justicia presentes en cada municipio. Adicionalmente, a través de una comunicación escrita y firmada por el Ministerio y el PNUD, se adelantó la solicitud de entrevista para la respuesta a estas encuestas.

Prevención y Atención de las VBG Fortaleciendo el Acceso a la Justicia de las Mujeres Urbanas y Rurales del municipio de Cúcuta

Resultado


Generación de herramientas pedagógicas en derechos que faciliten la transformación ciudadana frente a los factores generadores de violencias basadas en género y en el contexto a la familia, así como el acceso a la justicia.

Avance:: Fortalecimiento Institucional de las Comisarías de Familia del municipio de San José de Cúcuta:

- El equipo del proyecto ha realizado acciones de prevención, orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico a las consultantes y/o denunciantes de violencias basadas en género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y otras formas de violencias que asisten a las comisarías de familia y casas de justicia, brindando asesoría oportuna.
- Se han atendido **708 mujeres víctimas de VBG y Violencia Intrafamiliar** de forma integral en las comisarías y casas de justicia apoyadas.



Ruta general de atención integral en Comisarías de Familia

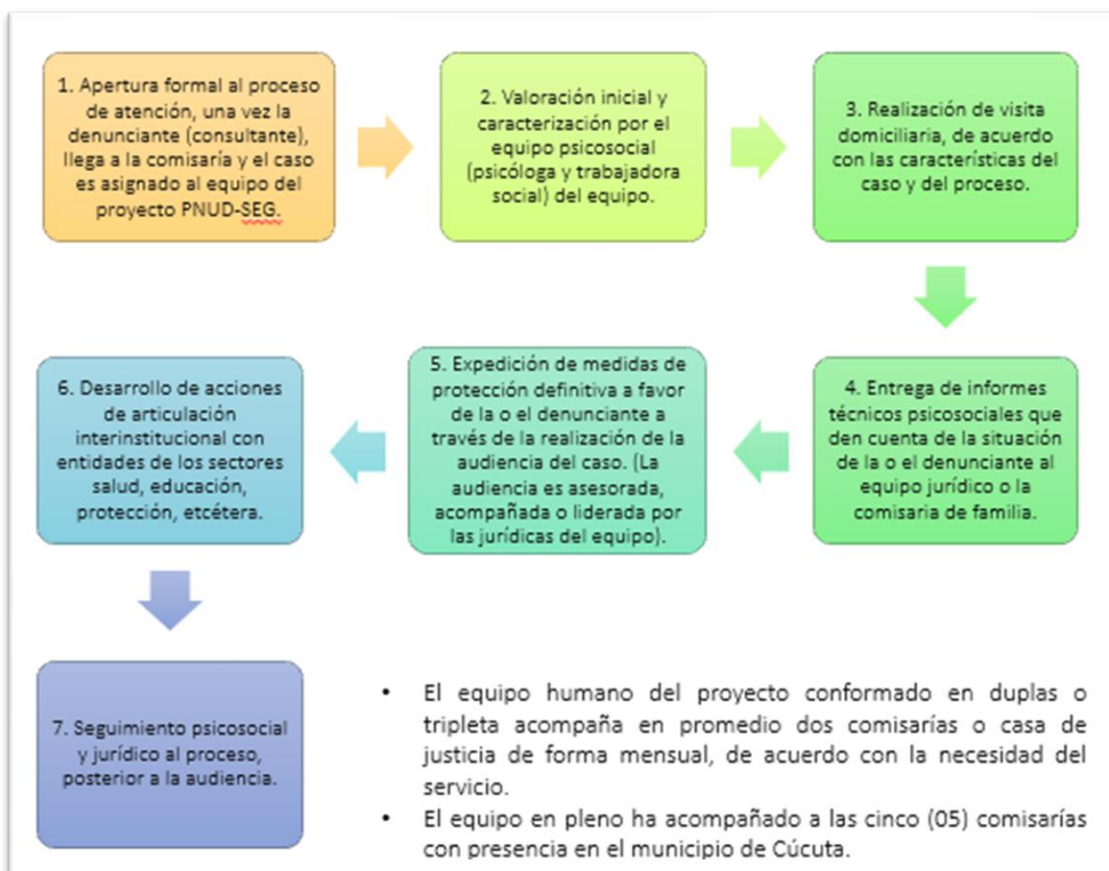



Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y el proceso de reincorporación.

Resultado

Contribuir al fortalecimiento de escenarios institucionales de diálogo y la gestión de las necesidades territoriales en materia de prevención y protección, como elementos fundamentales para la transformación del territorio y la garantía de derechos con enfoque de género y diferencial.

Avance:

Las acciones desarrolladas durante el año 2021 se enmarcaron en 8 (ocho) líneas estratégicas que componen el eje 1 del proyecto. Cada línea comprende una serie de acciones que promueven la garantía de derechos, así como de estrategias enfocadas a la capacitación y acompañamiento institucional, la identificación de riesgos, y la implementación de medidas de prevención, protección y mitigación para líderes, líderes colectivas y organizaciones sociales. Asimismo, dentro de las acciones de las líneas se transversalizaron los enfoques de derechos humanos, étnico y de género. Los avances se describen a continuación:

(i) Capacidades Institucionales para promover el diálogo: trabajo articulado con la CPEC en el desarrollo de espacios de capacitación como el taller de estrategias, y metodologías para incluir el enfoque de género en las diferentes etapas de los proyectos sociales y en la elaboración de documentos y políticas públicas, en beneficio de funcionarios/as públicos de las Secretarías de Gobierno, las Secretarías de Paz y Posconflicto, la Alcaldía de Tibú y la DSIC; (ii) Estrategias de Prevención y Protección Colectiva: talleres y capacitaciones en temas de DDHH, derechos de las mujeres y de las comunidades étnicas, cuyo resultado fue la construcción de guías sobre la gestión del conocimiento dirigida a las instituciones como la Consejería para la estabilización y la DSCI Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, rutas de seguridad y rutas de VBG para el trabajo con las comunidades. Adicionalmente, se realizaron actividades para fortalecer el gobierno propio, la autonomía y la resignificación de las tradiciones y costumbres de territorios étnicos y campesinos en el Pacífico Nariñense, y El Catatumbo.

(iii) Instituciones Locales Fortalecidas: la CPEC y la DCSI hicieron una apuesta para el fortalecimiento de Alcaldías municipales a través del acompañamiento y la activación de rutas de atención para líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos, por lo que las acciones estuvieron dirigidas a la articulación de las entidades nacionales (ART, URT) y las secretarías de Gobierno de las tres Gobernaciones sobre la ruta. También se realizó la contratación de un profesional UNV para la dinamización del decreto 660, y el fortalecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en los territorios priorizados.

(iv) Instancias de participación de líderes y lideresas: dentro de las acciones fueron fortalecidos y propiciados escenarios para la construcción participativa de metodologías bajo el marco del fortalecimiento de liderazgos femeninos y la apertura de espacios de dialogo comunitario con mujeres beneficiarias, líderes y lideresas parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, colectivos y organizaciones sociales; se han alcanzado avances en la concertación de espacios de participación, ejercicios donde se recogen inquietudes y necesidades en torno a la garantía de derechos; como



también se fortalecen los canales de comunicación entre la institucionalidad y el territorio, lo que ha impactado positivamente a 146 líderes y lideresas, como representantes de sus comunidades.

(v) Medidas de Prevención y mitigación del riesgo: i) implementación de 2 iniciativas territoriales de prevención en Cauca y Nariño; ii) formación en DDHH para líderes PNIS; donde se han venido construyendo los lineamientos y contenidos para la formación de líderes y lideresas PNIS en temas de prevención, protección y garantía de derechos.

La construcción de los módulos que componen este ejercicio pedagógico se presenta a continuación:

- **HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL**, orientado al fortalecimiento de las capacidades del liderazgo positivo a partir del reconocimiento de las emociones, como elemento fundamental para el bienestar de los líderes y lideresas como de sus comunidades, en el que la comunicación dialógica, la empatía y el trabajo colaborativo, en conjunto con los liderazgos incluyentes generan potencialidades para transformar las conflictividades sociales como elementos fundantes de la construcción de paz.
- **CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y DERECHOS HUMANOS PARA LÍDERES SOCIALES**, donde se abordará el surgimiento de los derechos humanos en la historia de la humanidad, su reconocimiento, el desarrollo de derechos especiales para quienes ejerciendo la labor de liderazgo social y personas defensoras de derechos humanos.
- **PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LOS LIDERAZGOS SOCIALES**, con el objetivo de trabajar temas como la identificación de riesgos, implementar medidas de prevención, autoprotección y protección, mecanismo de exigibilidad de derechos ante la afectación y vulneración de Derechos Humanos. Para la construcción de estos contenidos, se llevaron a cabo mesas técnicas de trabajo con las instituciones participantes, la organización consultora y el PNUD, con el fin de establecer conceptos base, como la definición de lo que significa ser un líder PNIS en el territorio, también acuerdos metodológicos en cuanto a la transversalización de los enfoques de género y diferencial, como del lenguaje que debe usarse en la transferencia pedagógica para que la formación en los temas nombrados sea apropiada y de réplica en sus comunidades.

iii) la construcción de Planes de Mitigación del riesgo para municipios focalizados del departamento del Chocó, donde se ha venido trabajando de manera articulada con el Ministerio del Interior. Se desarrollaron los diagnósticos de riesgo de los municipios de Novita, Carmen del Darién y Riosucio, bajo la contratación de un profesional UNV especialista en temas de mitigación de riesgos en el territorio. El ejercicio contó con representantes institucionales de cada territorio focalizado, concertando acuerdos para la construcción de los planes, como también, el desarrollo de acciones conjuntas para la identificación de liderazgos en el territorio y organizaciones sociales del sector rural y urbano que hagan parte de las estrategias pedagógicas y aporten desde la perspectiva territorial cuales consideran son las medidas efectivas para la garantía de derechos. Debido al alza en los índices de violencia en el territorio las actividades pedagógicas han sufrido retrasos en su ejecución, los profesionales en territorio han generado alertas sobre la alta presencia de grupos armados al margen de la ley, las dificultades para trasladarse a terreno y la imposibilidad que tienen los líderes para movilizarse de manera segura de un municipio a otro

(vi) Iniciativas territoriales para la prevención y superación de la estigmatización: durante el 2021 fueron firmados 5 Pactos Ciudadanos para la No Estigmatización de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos en los municipios de Convención, Ocaña, San Calixto, La Playa y Tibú del departamento de Norte de Santander. La construcción de los pactos contó con la participación de 117 personas en la concreción de acciones en el territorio para mitigar la estigmatización de esta población, llegando a compromisos firmados por las instituciones y las comunidades para fomentar los escenarios de diálogo, visibilizarían de las iniciativas territoriales, y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos, juveniles y ambientales.



(vii) Capacidades Institucionales para promover el diálogo: fue contratado un profesional UNV especialista para fortalecer el ejercicio de intervención institucional de los Consejos de Seguridad Territoriales. Además, fortaleció al equipo técnico de la Dirección de DDHH de Min. Interior.

(viii) Mujeres ex integrantes FARC-EP: la concertación para la construcción de la caja de herramientas para la mitigación de riesgos de las mujeres excombatientes de las FARC-EP ha culminado en la contratación de la organización consultora 'Canales de Comunicación', quienes desarrollaron un ejercicio de plan de trabajo que comprende un diagnóstico tanto institucional como comunitario, además de la construcción de herramientas pedagógicas para funcionarios(as) de la ARN, y la identificación de liderazgos femeninos en la población focalizada.

Resultado

Incremento de sus capacidades de emprendimiento, adaptación para cultivos resilientes y encadenamientos productivos


Avance: Autonomía Económica – Fue creada una línea de base con 250 emprendimientos pertenecientes a líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos en las tres zonas priorizadas por el proyecto (Pacífico Nariñense, El Catumbo y Chocó) la información fue recolectada a partir de insumos entregados desde las instituciones contrapartes (Min Interior, CEPC y ARN) quienes propusieron unidades productivas, con las cuales tuviesen un relacionamiento o trabajo previo.

Asimismo, a partir de este consolidado, se realizó la selección y priorización de 50 emprendimientos. Dicho proceso, basado en la implementación de una herramienta compuesta por variables cualitativas y cuantitativas, que permitió evaluar las características territoriales, sociales, económicas, comerciales y de sostenibilidad que cada emprendimiento ha construido durante su funcionamiento, la herramienta se diseñó para priorizar en las fortalezas y debilidades del emprendimiento, el contexto territorial y regional, como también, tener en cuenta aspectos como la accesibilidad en la región (terrestre, marítima) el orden público (garantías de seguridad), los años de vigencia, la conectividad y acceso a cobertura digital, el número de personal y el tipo y potencial de comercialización de los productos.

Adicionalmente, también permitió identificar el tipo de liderazgo que ejerce la persona a la cabeza de la unidad productiva, determinando si el mismo, este articulado a acciones de género, acciones socio ambientales, acciones comunitarias o políticas, o si el impacto de su liderazgo es transversal y abarca más de una de las acciones anteriormente descritas. Este ejercicio realizado con el fin de establecer un diagnóstico argumentando en bases sólidas, además de establecer parámetros de seguimiento que permita acercarse a la medición del impacto generado en los territorios.

Se determino apoyar técnicamente los 50 emprendimientos priorizados, y brindar apoyo económico a 30 de los mismos, partiendo de sus características, el impacto que podría generarse en los territorios, y el rubro destinado para su desarrollo.

La ubicación que características de los emprendimientos priorizados se explica a continuación: el departamento del Choco cuenta con 11 emprendimientos, el departamento de Nariño cuenta con 14 emprendimientos, y el departamento de Norte de Santander cuenta con 25 emprendimientos.



Promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Resultado:

Promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Socio institucional: Ministerio de Justicia - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

En el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional 0641-2021 suscrito entre Ministerio de Justicia y del Derecho y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD se presentan los promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado productos entregados a la fecha del Acuerdo cuyo objeto es aunar esfuerzos para promover la articulación interinstitucional para el acceso a la justicia de mujeres y personas con orientaciones e identidades de género diversas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado a través de la evaluación y cierre de las estrategias pasadas y el acompañamiento en el desarrollo de una nueva estrategia, programas y procesos que fortalezcan la capacidad institucional y de las víctimas con enfoque diferencial se entregaron a satisfacción.

Se presentan a continuación la relación de productos esperados, su descripción y las Actividades Realizadas y el Estado de las mismas:

Producto 1. Documento de sistematización con el análisis integral de los resultados, buenas prácticas y recomendaciones de la estrategia Red Construyendo.

Avance: El documento de sistematización con el análisis integral de los resultados, buenas prácticas y recomendaciones de la estrategia Red Construyendo se entregó en una primera versión el pasado



11 de noviembre de 2021 y la segunda para revisión el 31 de enero de 2022. La última versión del documento fue enviado a la Dirección de Justicia Transicional en el mes de noviembre de 2021.

Resultado final: Construido un documento que contenga un análisis de la estrategia Red Construyendo con el fin de determinar el estado actual de la misma, con los aciertos y desaciertos de la estrategia para ser usados como base de la nueva.

Producto 2. Informe de mesa técnica en la que participen los actores de la anterior estrategia, incluida la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para la equidad y el Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo, Unidad para las víctimas.

Avance: Se enviaron las memorias de la mesa técnica en la que participaron los actores de la anterior estrategia, incluida la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo, la JEP, la Unidad para las víctimas y la presentación con el contenido priorizado el día 27 de febrero de 2022. En la reunión se presentaron los resultados de la Estrategia de Acceso a la Justicia RedConstruyendo y se presentó la Estrategia Red Justas. La reunión se realizó el pasado 24 de febrero de 2022 Hotel Rosales Plaza.

Resultado Final: Realizada una mesa técnica en la que participen los diferentes actores de la estrategia RedConstruyendo para dar cierre a la misma.

Producto 3. Socialización y presentación del estado de las denuncias de los casos identificados a partir de la estrategia Redconstruyendo.

Avance: Se realizó el pasado 16 noviembre 2021 una Mesa Técnica virtual con la FGN cuyo objetivo central fue conocer el estado actual de las denuncias presentadas en RedConstruyendo. En la reunión se estableció como compromiso de enviar al Ministerio, la ubicación del proceso, el número de radicado, la dirección del despacho y el número del mismo a fin de que las víctimas tengan acceso a sus casos puedan darle seguimiento a sus casos.

Resultado Final: Realizada una mesa técnica en la que participen las/os denunciante(s) vinculados con la estrategia RedConstruyendo

Producto 4. Documento que contenga el estado actual de todas las denuncias presentadas en la Red Construyendo e informe del acercamiento con las denunciante(s). Se remitieron el documento Revisar el estado actual de los casos denunciados durante la estrategia de RedConstruyendo e informar del mismo a las denunciante(s).

Avance: Se adjunta la última versión del documento enviado a la Dirección de Justicia Transicional en el mes de diciembre de 2021 Recopilación de información de la FGN y remisión sistematizada a la Dirección de Justicia Transicional

Producto 5. Un documento de diagnóstico de la población víctima a la que está dirigida la estrategia. Adelantar un ejercicio de caracterización y diagnóstico de la población víctima haciendo énfasis en los tipos penales asociados a todas las formas de violencia contra las mujeres y orientaciones sexuales



diversas. Se envió el documento de caracterización y diagnóstico de la población víctima haciendo énfasis en los tipos penales asociados a todas las formas de violencia contra las mujeres y orientaciones sexuales diversas.

Avance: Se envió la última versión del documento enviado a la Dirección de Justicia Transicional en el mes de noviembre de 2021

Resultado Final: Adelantado un ejercicio de caracterización y diagnóstico de la población víctima haciendo énfasis en los tipos penales asociados a todas las formas de violencia contra las mujeres y orientaciones sexuales diversas.

Producto 6. Imagen corporativa de la estrategia diseñada. Elaborar una propuesta de slogan, logotipo, nombre y definición de la estrategia para el desarrollo de piezas comunicativas. Se envió la imagen definitiva de la Estrategia Red Justas.

Avance: Se realizaron 5 reuniones con la participación de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y el PNUD para la definición de la imagen con la participación de profesionales de las oficinas de comunicaciones de ambas entidades hasta lograr la imagen definitiva Socializado el primer borrador de la imagen corporativa de la estrategia diseñada. Del mismo modo se realizó una propuesta de slogan, nombre y definición de la estrategia para el desarrollo de piezas comunicativas.

Producto 7. Documento preliminar de la estrategia.

Avance: Se envió el documento definitivo con corte a marzo 15 de 20212.

Resultado Final: Realizadas 7 entregas del documento preliminar de la estrategia desde el inicio del convenio

Producto 8. Guía metodológica para funcionarios. Elaborar una guía metodológica dirigida a los funcionarios para determinar sus funciones.

Avance: Se envió un documento que tiene como objetivo brindar una adecuada atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte de funcionarios y funcionarios como elemento fundamental para el acceso a la justicia.

Resultado Final: Realizado un taller de socialización de esta metodología.

Producto 9. Definición de acuerdos institucionales para la implementación de la nueva estrategia.

Avance: Se desarrollaron 3 jornadas de trabajo con organizaciones de mujeres, colectivos, plataformas y líderes y líderes que brindan acompañamiento a procesos de víctimas de violencia sexual y formas de violencias asociadas a estos tipos penales para recopilación de insumos y recomendaciones para la formulación de la estrategia en las ciudades de Cartagena con la Liga de Mujeres por la Paz, Quibdó y Bogotá. De mismo modo se realizó una jornada virtual con 200 mujeres.



Así mismo, se enviaron las memorias de las 3 jornadas con la clasificación y análisis actividades a realizar, tiempo de duración etc.

Se enviaron las memorias de la mesa técnica en la que participaron los actores de la anterior estrategia, incluida la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo, la JEP, la Unidad para las víctimas y la presentación con el contenido priorizado.

Resultado Final: Adelantadas jornadas de socialización a organizaciones de sociedad civil sobre los acuerdos institucionales en el marco de la nueva estrategia y un espacio interinstitucional con representantes de las instituciones del Estado colombiano responsables de la garantía del acceso a las víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado.

Producto 10. Presentación de la estrategia.

Avance: Esta actividad se realizó el pasado 28 de marzo y el documento se entregó previa su realización

Resultado Final: Realizado un evento de presentación de la estrategia Red Justas.

Gestión del Conocimiento

Lecciones aprendidas

¿Cuál es la lección?	¿En el desarrollo de qué actividad o producto se generó?	Considere qué grupos o individuos dentro o fuera de la organización se beneficiarían de esta lección
Es importante que los espacios desarrollados in situ con la institucionalidad, la comunidad y/o miembros de grupos étnicos cuenten con el acompañamiento de una persona miembro de alguno de estos grupos que les conozca y que este en la capacidad de ejercer un rol de mediación y facilitación en la comunicación. Esto con el ánimo de garantizar la fluidez de los encuentros.	Socialización de herramientas comunitarias y desarrollo de replicas comunitarias en Jambaló.	Organizaciones sociales, comunidades, Instituciones y Comisarías de Familia de los 22 municipios.
El desarrollo de espacios en conjunto con la institucionalidad y los actores comunitarios puede		Organizaciones sociales, comunidades,

<p>traer resultados positivos. Lo anterior visto desde la perspectiva presupuestal y de tiempo, además de la articulación necesaria para lograr un mayor impacto de las iniciativas.</p>	<p>Actividad comunicativa para contrarrestar imaginarios en Putumayo.</p>	<p>Instituciones y Comisarías de Familia de los 22 municipios.</p>
<p>Desarrollar una estrategia más amplia de comunicaciones que aliente a la comunidad y a las instituciones a participar en los espacios programados. Esto también implica llegar a los lugares más apartados con herramientas de comunicación adecuadas.</p>	<p>Durante el desarrollo de la gran mayoría de acciones sobre todo en aquellos espacios con asistencia limitada como Carepa.</p>	<p>Organizaciones sociales, comunidades, Instituciones y Comisarías de Familia de los 22 municipios.</p>
<p>Enviar invitaciones formales a los espacios por desarrollar con el fin de comprometer y garantizar la presencia de las instituciones.</p>	<p>Entrega y socialización de caja de herramientas en Carepa.</p>	<p>Instituciones de los 22 municipios.</p>
<p>El desarrollo de las actividades debe articularse además de intervenciones institucionales con las formas comunitarias de gestión de conflictos.</p>	<p>En la caracterización municipal y en los diálogos que surgieron en las formaciones locales.</p>	<p>La institucionalidad encargada de la política pública de MRC</p>
<p>Inclusión de los grupos étnicos con amplia participación juvenil de Afrocolombianos, indígenas y campesinos.</p>	<p>Componente de Justicia Juvenil Restaurativa</p>	<p>Cabildos indígenas, Asociaciones afrocolombianas, Juntas de Acción Comunal - JAC, Comisarías de Familia, Alcaldías, juzgados, Inspecciones de Policía, Fiscalía, Instituciones Educativas, personerías y operadores de ICBF del SRPA de los municipios priorizados incluido el municipio de circuito.</p>
<p>Transversalización del enfoque de género y territorial en las diferentes variables de análisis relacionados</p>	<p>Esto permitió entender el rol que desempeñan hombres y mujeres, las</p>	<p>Ministerio del Interior</p>

con el accionar de las organizaciones de crimen organizado.	diferencias en fenómenos como las agresiones a líderes hombres y mujeres.	
Generación de lazos de confianza con actores locales	En el ejercicio de triangulación de la información fue importante para recoger las diferentes voces de los territorios, particularmente la de grupos sociales históricamente afectados por el conflicto armado como las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos, en casos como Catatumbo de población migrante venezolana, comunidades étnicas y población LGBTI, en el Chocó con las organizaciones que representan a parte de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, y en el Andén Pacífico Nariñense, con las instituciones y organizaciones que intervienen la zona desde una perspectiva humanitaria, así como con las comunidades indígenas y afro.	Ministerio del Interior, ARN, CPEC

Demoras en la implementación

- El paro nacional llevo a la implementación en demoras dado el cese de actividades de algunas instituciones, temas de seguridad y demás en los territorios.
- Los asuntos de orden público en el departamento de Chocó y algunas zonas de Cauca, al igual que, la captura Otoniel han afectado el desarrollo normal de las acciones.



- La conexión de internet y de comunicación en algunos municipios no es efectiva, cabe mencionar que algunos refuerzos virtuales debieron repetirse de manera presencial por problemas de conectividad lo que llevó nuevamente a ajustar cronogramas.
- Las mayores demoras en la implementación se dieron por ajustes de cronograma y concertación de espacios para el desarrollo de las actividades con el territorio por todo lo mencionado anteriormente.
- La difícil situación de orden público y la permanencia de los escenarios de riesgo para los líderes sociales, las personas que se dedican a la defensa de los DDHH y PPR representan un desafío permanente no sólo para la implementación del proyecto, sino para el Estado colombiano en su conjunto, en clave del cumplimiento de sus obligaciones institucionales en materia de protección de los DDHH. La situación de contexto ha obligado al proyecto a incorporar medidas de análisis de coyuntura, seguridad y territorio y a evaluar de manera permanente, con las instituciones contrapartes la ejecución de las actividades en las tres regiones priorizadas. Hasta el momento se han suspendido algunas actividades en territorios como Cauca, Chocó y Norte de Santander.
- Lograr mayores grados de articulación entre el nivel nacional y territorial, para garantizar el acceso a la oferta institucional en materia de prevención, diálogo social, construcción de cultura de la legalidad y activación de rutas de protección. Este reto, está en la esencia misma de los objetivos del proyecto y responde a deficiencia estructural de Estado colombiano, la cual se busca mitigar a través de la implementación de acciones del presente proyecto.
- Apoyar la reactivación de los espacios de diálogo social y adopción de medidas en materia de garantías de seguridad para el liderazgo social y la defensa de los DDHH. En este sentido, el gobierno nacional ha expedido una serie de instrumentos normativos y de política pública (Decreto 1139 / 2021, actualización del PAO, Documento Conpes en materia de garantías) sin un proceso adecuado de socialización y construcción participativa. Lo cual se aleja de la incorporación del EBDH, pero sobre todo tensiona y dificulta el diálogo con las Organizaciones de la sociedad civil que participan en las instancias competentes en esta materia.

Historias de vida

Se comparten cuatro historias de vidas. La primera, está relacionada a la Comisaría de Familia del municipio de Roberto Payan en Nariño [Evidencia: https://1drv.ms/v/s!AvT1LQWRGpNUhGi2wVhTEp_qnSoj?e=2Zf4yM].

La segunda, hace referencia a el personero del municipio de Orito en Putumayo. [Evidencia: <https://1drv.ms/v/s!AvT1LQWRGpNUhGluRxqvGnQRcufI?e=TiP7dr>.]

La tercera, es una persona que hace parte de una organización social en Nechí – Antioquia. [Evidencia <https://1drv.ms/v/s!AvT1LQWRGpNUhGc0CTaqwhfTihsn?e=9Lbir8>]



La cuarta, es sobre una integrante de una institución educativa que habla sobre la importancia de la justicia juvenil restaurativa en Carepa – Antioquia. [Evidencia: <https://1drv.ms/v/s!AvT1LQWRGpNUhGqwViHvIFPSNEst?e=aoGPRc>];

y adicionalmente, se relacionada una carpeta con fotos [Evidencia: <https://1drv.ms/u/s!AvT1LQWRGpNUhGttIXB6wpxc2OBK?e=gsbZxH>].

Buenas prácticas

La aplicación de metodologías participativas que involucren a la comunidad genera un vínculo más activo por parte de los beneficiarios en la medida en que se sienten vinculados a la construcción y al desarrollo de las propuestas y de las acciones que se derivan de los distintos espacios. Además de ello, la comunidad posee información única y de contexto que enriquece las actividades y que es insumo fundamental para la retroalimentación y el mejoramiento de los espacios.

La preparación de las misiones en conjunto con los equipos territoriales es fundamental en el alcance de los objetivos propuestos para cada uno de los espacios programados.

La implementación de una metodología híbrida para el desarrollo de actividades y acciones con los territorios es bastante útil; esto es, aplicar la virtualidad en las tareas operativas y fomentar la presencialidad en las formaciones y las metodologías participativas.

En los municipios impactados se ha dado valor al programa, gracias al compromiso y receptividad de los profesionales que participaron en el proceso. Se ha creado la necesidad de dar continuidad al mismo para el manejo de los conflictos juveniles para posteriores vigencias, así, como también, se ha creado la necesidad de involucrar a todas las entidades gubernamentales, étnicas y de la sociedad civil para el logro de una capacidad instalada que garantice un acercamiento de la justicia a las comunidades.

Dentro de los espacios de concertación y dialogo, se evidenciaron acciones positivas en torno al ejercicio de articulación que el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD ejerce en el territorio. La situación de inconformidad por parte de líderes, lideresas y comunidades, frente a las acciones del gobierno nacional se ha visto exacerbada en la medida en que los compromisos de entrega de insumos y acompañamiento en este punto de su desarrollo no ha sido completada a cabalidad, creando un escenario de falta de credibilidad en las instituciones, y es ahí, donde las acciones de diálogo y concertación toman forma y se ven reflejadas en el nivel de participación de las comunidades dentro de las actividades, la apertura al diálogo, la concertación entre las partes y la superación de contingencias. Como principales logros, se destaca la generación de compromisos orientados a la incentivación de liderazgos femeninos y juveniles en el municipio. El fortalecimiento de los canales de comunicación e interacción entre la institucionalidad y las plataformas de liderazgos del municipio. Y, la generación de espacios de participación para todas y todos los líderes independientemente de su vocación política.



Asimismo, en los espacios de capacitación y fortalecimiento a liderazgos en el departamento de Norte de Santander, se evidenció la consolidación de los colectivos y organizaciones liderados por mujeres, la legitimidad de las instituciones para convocar a espacios de diálogo y concertación. Estas capacidades instaladas en el territorio se ven reflejadas en el nivel de participación de las comunidades dentro de las actividades, la apertura al diálogo y concertación entre las partes, como también en la superación de contingencias.

Adicional, en el ejercicio de las actividades en el marco del proyecto se identificaron las siguientes buenas prácticas:

Aplicación estrategias de acción sin daño. La información contenida particularmente en la base de datos de crimen organizado y los análisis de contexto, es sensible y puede poner en riesgo a los actores locales entrevistados. Frente a esto, se garantizó el no uso de nombres de personas ni de instituciones u organizaciones, acompañado de una lectura territorial asertiva.

Conocer historias de vida para la sensibilización de experiencias y la resiliencia. El abordaje que se le dio a la primera fase de aproximar a las PPR a la cultura de legalidad y la convivencia pacífica desde procesos individuales permitió que los próximos insumos y espacios a desarrollar sean integrales y propendan al objetivo de que las PPR se mantengan en la legalidad y el proceso de reincorporación.

Informe financiero

Se presenta a continuación la información financiera anual a 2021 del proyecto “Estado de Derecho para Avanzar hacia el ODS16+”. Se relaciona la información por donante:

Proyecto 129204 - Estado de Derecho					
Fuente - Donante (Anual 2021)					
Fuente	Donante	Valor Total	Gasto 2020-2021	Balance	
28610	12711 GPCR/DG	300.000,00	94.557,69	205.442,31	
30000	12641 MPTF	2.357.190,99	690.824,56	1.666.366,43	
30071	00606 Alc. Cúcuta	67.839,20	54.096,56	13.742,64	
30071	11951 Min Justicia	847.721,95	197.863,09	649.858,86	
Total		3.572.752,13	1.037.341,90	2.535.410,23	



También, se presenta la información financiera anual 2021 por output.

**Proyecto 129204 - Estado de Derecho
Output (Anual 2021)**

Output	Nombre Output	Valor Total	Gasto 2020-2021	Balance
122956	Violencias Basadas en Genero	784.113,54	460.483,79	323.629,75
122963	Resolución de Conflictos	205.518,65	73.167,12	132.351,53
122976	Justicia para la Paz	242.558,80	57.376,00	185.182,80
122980	Comisarías de Familia	831.536,81	236.369,28	595.167,53
122981	Generación de Herramientas	294.985,62	110.148,06	184.837,56
123620	Derechos Humanos	1.125.000,00	99.797,65	1.025.202,35
129153	Estrategia Violencia Sexual	89.038,72		89.038,72
Total		3.572.752,13	1.037.341,90	2.535.410,23
