

**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**  
**COUNTRY:** Guatemala  
**TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:**  
 semi-annual  
**YEAR OF REPORT:** 2020



<b>Project Title:</b> Transformando relaciones para la construcción de la paz <b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b> IRF - 169-00105571											
<b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b> <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund  <b>Name of Recipient Fund:</b>	<b>Type and name of recipient organizations:</b>  <b>RUNO PNUD</b> <b>RUNO ONU Mujeres</b> <b>RUNO OACNUDH</b> <b>please select</b>										
<b>Date of first transfer:</b> 10 mayo 2017 <b>Project end date:</b> 30 noviembre 2020 <b>Is the current project end date within 6 months?</b> Yes											
<b>Check if the project falls under one or more PBF priority windows:</b> <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project											
<b>Total PBF approved project budget (by recipient organization):</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Recipient Organization</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$1.401,378.72</td> </tr> <tr> <td>ONU MUJERES</td> <td>\$518,779.87</td> </tr> <tr> <td>OACNUDH</td> <td>\$365,940.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$2.286,098.59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 76%          *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE*</p>		Recipient Organization	Amount	PNUD	\$1.401,378.72	ONU MUJERES	\$518,779.87	OACNUDH	\$365,940.00	Total: \$2.286,098.59	
Recipient Organization	Amount										
PNUD	\$1.401,378.72										
ONU MUJERES	\$518,779.87										
OACNUDH	\$365,940.00										
Total: \$2.286,098.59											
<b>Gender-responsive Budgeting:</b>  Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$.629,780.37 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$. 881,036.85											
<b>Project Gender Marker: GM2</b> <b>Project Risk Marker: Medium</b> <b>Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management</b>											

**Report preparation:**

Project report prepared by: Nathaly Mejia

Project report approved by: Iñaki De Francisco

Did PBF Secretariat review the report: Yes

**NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

**PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS**

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500 character limit):

El proyecto se encuentra en el sexto semestre de implementación, a partir de una extensión con costo de 18 meses que finaliza en noviembre de 2020 y una suma adicional de \$1,381,284.40 aprobada por el PBSO. Actualmente se está en la fase final de implementación de las actividades planificadas, con un avance programático de 75% y financiero de 78%.

Se ha avanzado en la elaboración de una metodología para la medición de los grados de confianza y percepción generados durante la vida del proyecto, a través de los tres indicadores del resultado. Se han identificado un total de 451 actores de la sociedad civil, funcionarios públicos, sector privado y representantes de pueblos indígenas que han participado en los procesos impulsados por el proyecto. La metodología será aplicada con las y los actores identificados a partir de su participación en los procesos del proyecto.

Ante las amenazas del COVID-19 y la entrada en vigor del Estado de Calamidad en marzo, se pospusieron las actividades en el territorio hasta nuevo aviso. Las medidas preventivas para frenar la pandemia y los contagios han afectado los procesos previstos del proyecto, por lo cual se han modificado metodologías para la implementación de actividades a través del uso de plataformas virtuales. Respecto al monitoreo de la situación de derechos humanos, se ha continuado de manera remota mientras se analiza el impacto que el COVID-19 ha generado en el goce de los diferentes derechos.

**Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):**

N/A

**FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION:** summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

El proyecto ha contribuido a alcanzar los siguientes cambios a nivel institucional y social:

**En lo institucional**, el Estado de Guatemala cuenta con experiencias exitosas para la coordinación y gestión interinstitucional de conflictos, como el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI, bajo la CPD) con la priorización de los conflictos de más alto impacto, así como herramientas tecnológicas (SART) para el análisis y toma de decisiones estratégicas para el abordaje de los conflictos sociales y la construcción participativa de una política pública para la institucionalización del diálogo y otra para el fortalecimiento de los mecanismos de protección a las y los defensores de DDHH.

En el último proceso de elecciones hubo una disminución de la conflictividad electoral. Desde el proyecto se contribuyó con el fortalecimiento de las capacidades de los órganos temporales como las juntas electorales y la sensibilización en temas de género y derechos humanos, para un proceso transparente, libre de violencia y en paz.

**En lo social**, el proyecto ha generado espacios que han permitido a diversos actores interactuar activamente para desarrollar propuestas de desarrollo que han contribuido a la prevención de conflictos, así como fortalecer la democracia, gobernanza y consolidación de la paz. Es de resaltar los esfuerzos para promover la participación de una multiplicidad de actores, con un enfoque especial en la participación de las mujeres desde diferentes niveles.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

[Historia de éxito Panzos](https://www.youtube.com/watch?v=zww68ApRQII)

<https://www.youtube.com/watch?v=zww68ApRQII>

El proyecto a través de ONU Mujeres ha contribuido a potenciar el auto reconocimiento del liderazgo de las mujeres como constructoras de paz y agentes políticas a nivel local. Un caso de éxito es el de Irma Yolanda Caal Caal, Octava Concejala Municipal de San Pedro Carchá, quien, tras el cambio de conocimientos y capacidades adquiridas en los procesos de intercambio entre las propias lideresas, optó por postularse al cargo de concejala.

“Me motivó darme cuenta de que mi contribución en el trabajo social, como técnica en varias instituciones, podría tener un mayor impacto dentro de un rol municipal [...] Ahora que contribuyo desde el conocimiento que he acumulado como persona, con el apoyo de ONU Mujeres y otras entidades; y aunque todavía es difícil para las mujeres, las otras tres concejalas y yo estamos rompiendo paradigmas”.

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

*Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. **If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.***

- “On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

*If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1:** El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la conflictividad social y fortalecer la consolidación de la paz.

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** (3000 character limit)

Durante el proceso postelectoral y de toma de posesiones, se disminuyó la conflictividad social, lo cual se debe en gran medida a las acciones tomadas por el proyecto en coordinación con La Mesa de Prevención de Conflictividad Electoral del TSE. Estas acciones comprendieron la realización de un curso de sensibilización a las autoridades entrantes y salientes y el monitoreo de los DDHH durante la toma de posesión de las autoridades electas en coordinación con PDH.

En el proceso de transición al nuevo Gobierno, con el cambio de autoridades en las instituciones del Estado se ha dado también un cambio en los funcionarios técnicos encargados de atender la conflictividad. Por lo cual, se estableció una coordinación efectiva entre el PNUD, OACNUDH y COPREDEH para el seguimiento de los procesos desarrollados, como el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, la identificación de las instituciones para una oferta institucional en San Juan Sacatepéquez (municipio identificado para la réplica del modelo implementado exitosamente en Panzós) y la elaboración de la Política Pública para la Protección de Personas Defensores de DDHH.

Debido a las medidas tomadas por el Estado para frenar los contagios de COVID-19, los procesos previstos han sufridos retrasos y se ha ralentizado el avance de los espacios de diálogo a nivel territorial. Para hacer frente a esto, se han identificado nuevas metodologías para garantizar el avance de los procesos en medios digitales, como por ejemplo, en la réplica Panzós, el proceso de Consulta en San Juan Cotzal con la Alcaldía Indígena y consultas en el marco de la Política Pública de Protección a Defensores de DDHH. De igual manera se ha continuado monitoreando la situación de DDHH a través de espacios virtuales de intercambio con la sociedad civil y la comunidad internacional. Además, en respuesta al COVID-19, OACNUDH ha elaborado una recopilación de directrices para incorporar la perspectiva de DDHH en la respuesta y el abordaje de la pandemia por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado.

El proyecto ha promovido espacios de participación entre diversos actores para abordar la conflictividad social, así como la construcción de la política pública de protección a defensores y defensoras de DDHH. Además, se ha buscado generar condiciones y acciones para garantizar la continuidad de los procesos tanto a nivel territorial como nacional.

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

El liderazgo de las mujeres a nivel territorial se ha potenciado a través de intercambios de conocimientos y buenas prácticas entre las mismas lideresas. El reconocimiento de su experiencia generó un cambio en su percepción de capacidades de liderazgo motivando la exitosa participación de 7 de ellas en el proceso electoral.

Se ha contribuido a la concertación entre organizaciones de mujeres y mujeres políticas para la promoción de acciones para el abordaje de la violencia política y su participación igualitaria en procesos electorales. Se desarrolló un encuentro con representantes de organizaciones participantes en la CAME (121 personas), donde 30% de las organizaciones presentaron propuestas de reforma a la Ley de Partidos Políticos para la inclusión de poblaciones históricamente excluidos: mujeres, indígenas y jóvenes, en revisión por el TSE.

Se está implementado un proceso con jóvenes para el relacionamiento con el Estado para la prevención de conflictos causados por el COVID-19.

**Outcome 2: N/A**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

N/A

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

N/A

**Outcome 3: N/A**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

N/A

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

N/A

**Outcome 4: N/A**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select**

**Progress summary:** *(3000 character limit)*

N/A

**Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:**

*(1000 character limit)*

N/A

### **PART III: CROSS-CUTTING ISSUES**

<p><b><u>Monitoring:</u></b> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000 character limit)</p> <p>Se ha avanzado en la elaboración de una metodología y herramienta para la medición de los indicadores del resultado.</p> <p>Se ha desarrollado una nota de proceso que es actualizada con frecuencia por parte de los técnicos del proyecto y revisada por el punto focal de M&amp;E. En este documento se registra el avance en el logro de los productos e indicadores del proyecto y se adjunta evidencia de las diferentes actividades que se llevan a cabo.</p> <p>Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones inter-agenciales utilizando herramientas digitales debido al COVID-19, para monitorear el desarrollo de las actividades.</p> <p>El monitoreo del proyecto también se ha desarrollado con la actualización periódica de una herramienta elaborada por el Secretariado del PBF en Guatemala (matriz de M&amp;E), en la que se ingresan los avances de las actividades del proyecto y permite visualizar el estatus del alcance de los productos a nivel programático y financiero.</p>	<p>Do outcome indicators have baselines? yes</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? no</p>
<p><b><u>Evaluation:</u></b> Has an evaluation been conducted during the reporting period? yes</p>	<p>Evaluation budget (response required): N/A</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (1500 character limit):</p>

	<p>El Proyecto Transformando está en proceso de ser evaluado como parte de la cartera PBF. Esta evaluación está a cargo de PBSO.</p>
<p><b><u>Catalytic effects (financial):</u></b> Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p>	<p><b>Name of funder:</b> Oficina regional ONU Mujeres/Gobierno de Suecia  <b>Amount:</b> 10.000 \$</p> <p>El monto fueron fondos de la oficina Regional de ONU Mujeres cuyo donante fue el Gobierno de Suecia para el encuentro con los representantes de organizaciones participantes en la CAME.</p>
<p><b><u>Other:</u></b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?  <i>(1500 character limit)</i></p>	<p>N/A</p>



**PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT**

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
<b>Outcome 1</b>  El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la conflictividad social y fortalecer la	Indicator 1.1 Percepción de funcionarios públicos, sociedad civil organizada, representantes de pueblos indígenas y sector privado que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre los avances y logros del Gobierno en el	<b>0</b>	<b>3</b>			Se ha avanzado en la elaboración de una metodología para la medición del resultado. La herramienta no ha sido aplicada por lo cual no se tiene un análisis de la percepción de los actores.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
consolidación de la paz.	abordaje y transformación de la conflictividad social					
	Indicator 1.2 Grado de confianza de las instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado en los procesos de diálogo y consulta	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		Se ha avanzado en la elaboración de una metodología para la medición del resultado. La herramienta no ha sido aplicada por lo cual no se tiene un análisis del grado de confianza hacia los actores.
	Indicator 1.3 Cambio en el nivel de confianza de las y los participantes de los procesos de	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		Se ha avanzado en la elaboración de una metodología para la medición del resultado. La herramienta no ha sido aplicada por lo cual no se tiene un análisis del cambio en el nivel de confianza.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	diálogo y consulta en el Estado					
Output 1.1 Instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública para la promoción del diálogo democrático y la transformación de la conflictividad social con enfoque de derechos humanos, diseñados, adoptados y en proceso de implementación	<b>Indicator 1.1.1</b> Grado de avance en la elaboración de los instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	a. Grupo Técnico Interinstitucional = Grado 4  b. Sistema de Alerta y Respuesta Temprana = Grado 3  c. Política Pública de Diálogo = Grado 3  75%	
	<b>Indicator 1.1.2</b> # de instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	100%	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
Output 1.2 Diálogos estratégicos a nivel nacional y territorial con enfoque transformativo diseñados y acompañados para abordar problemáticas estructurales y emergentes de la conflictividad social, con enfoque de derechos humanos.	<b>Indicator 1.2.1</b> Nivel de progreso de los diálogos estratégicos de acuerdo a metodología establecida	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>N/A</b>	100%	
	<b>Indicator 1.2.2</b> Nivel de inclusión de los actores involucrados en los procesos de diálogo	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>N/A</b>	100%	
	<b>Indicator 1.2.3</b> % de conclusiones y recomendaciones de los procesos de diálogos estratégicos usados en la construcción de	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	80%	Se cuenta con documentos desarrollados a través de los espacios de diálogos establecido.  De la Mesa Ampliada en Panzos, resultó en los siguientes recuerdos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT en Panzos. El documento fue retroalimentado por SEGEPLAN y se encuentra en edición.</li> </ul>

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	instrumentos normativos y de política y/o en debates políticos					De la Mesa de Alto Nivel sobre Áreas Protegidas, resultó en los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo de Desalojos con incorporación de estándares internacionales</li> <li>• Política Institucional de Asentamientos Humanos</li> <li>• Oferta Institucional para 5 comunidades en las áreas protegidas en Peten</li> </ul>
	<b>Indicador 1.2.4</b> Numero de procesos de diálogo estratégico que abordan el impacto diferenciado del conflicto en las mujeres y hombres	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	100%	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
Output 1.3 Procesos de consulta previa con pueblos indígenas acompañados en su implementación, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos.	<b>Indicator 1.3.1</b> # de espacios de reflexión activa sobre estándares internacionales en materia de consulta previa.	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	50%	Se esta generado un espacio de reflexión e intercambio con las autoridades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energías y Minas, OIT, GIZ y PNUD sobre mecanismos de consulta a los Pueblos Indígenas.
	<b>Indicator 1.3.2</b> Nivel de progreso de las consultas de acuerdo a metodología establecida	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	67%	Por temas coyunturales se ha quedado estancado el proceso de consulta de acuerdo a la metodología establecida.
	<b>Indicator 1.3.3</b> # de las lecciones aprendidas y buenas prácticas extraídas de los procesos de consulta	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100%	
	<b>Indicator 1.3.4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	100%	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	# de mujeres que se han preparado y participan en los procesos de consulta y/o en el diseño de políticas públicas relevantes					
Output 1.4 Mecanismos institucionales y fortalecimiento de capacidades para la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, diseñados participativamente, adoptados y	<b>Indicator 1.4.1</b> # de mecanismos institucionales de protección de defensoras y defensores de derechos humanos adoptados y en fase de elaboración	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	20%	
	<b>Indicator 1.4.2</b> # de defensores y defensoras de	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	59%	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
en proceso de implementación	derechos humanos participando en espacios de discusión y desarrollo de mecanismos de protección					
	<b>Indicator 1.4.3</b> # de casos en los cuáles los mecanismos de protección nacional/regional/internacional de defensoras y defensores son aplicados	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	30%	El número es generado por el ministerio de gobernación, por lo cual no se ha recibido el numero actualizado por parte de la institución.
Output 1.5 Instrumentos de análisis y estrategias de prevención y monitoreo de la conflictividad	<b>Indicator 1.5.1</b> Número de herramientas de análisis desarrolladas para prevención de	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>N/A</b>	100%	



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
electoral diseñados e implementados con actores clave y con enfoque de derechos humanos, antes, durante y después del proceso electoral.	la violencia electoral.					
	<b>Indicator 1.5.2</b> # de Juntas Electorales que reciben formación sobre estrategias de prevención y mediación de conflictividad electoral.	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>N/A</b>	227%	
	<b>Indicator 1.5.3</b> # de violaciones a derechos humanos documentadas antes, durante y después del proceso electoral	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>N/A</b>	257%	
	<b>Indicator 1.5.4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	125%	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	# de materiales de concientización elaborados sobre el respeto de los derechos humanos durante el proceso electoral					
	<b>Indicator 1.5.5</b> # de instrumentos basados en evidencia para prevenir la violencia política contra las mujeres en procesos electorales elaborados coordinadamente entre organizaciones	2	4	4	50%	Las metodologías para el abordaje de la violencia contra las mujeres en procesos electorales continúan post elecciones.

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	de mujeres en la política y la institucionalidad relevante					
Output 2.1 N/A	Indicator 2.1.1					
	Indicator 2.1.2					
Output 2.2 N/A	Indicator 2.2.1					
	Indicator 2.2.2					
Output 2.3 N/A	Indicator 2.3.1					
	Indicator 2.3.2					
Output 2.4 N/A	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
<b>Outcome 3</b> N/A	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
	Indicator 3.3					
Output 3.1 N/A	Indicator 3.1.1					
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2 N/A	Indicator 3.2.1					
	Indicator 3.2.2					
Output 3.3 N/A	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
Output 3.4 N/A	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
<b>Outcome 4</b> N/A	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Indicator Milestone</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
Output 4.1 N/A	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2 N/A	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3 N/A	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4 N/A	Indicator 4.4.1					

## Annex D - PBF Project Budget

### Instructions:

1. Only fill in white cells. Grey cells are locked and/or contain spreadsheet formulas.
2. Complete both Sheet 1 and Sheet 2.
  - a) First, prepare a budget organized by activity/output/outcome in Sheet 1. (Activity amounts can be indicative estimates.)
  - b) Then, divide each output budget along UN Budget Categories in Sheet 2.
3. Be sure to include % towards Gender Equality and Women's Empowerment
3. Do not use Sheet 4 or 5, which are for MPTF and PBF use.
4. Leave blank any Organizations/Outcomes/Outputs/Activities that aren't needed. DO NOT delete cells.
5. Do not adjust tranche amounts without consulting PBSO.

**Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity**

Outcome/ Output number	Description (Text)	Recipient Organization 1 Budget	Recipient Organization 2 Budget	Recipient Organization 3 Budget	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) (if any):	Current level of expenditure/ commitment (To be completed at time of project progress reporting)	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, esp. for TA or travel costs)
		UNDP	ONUMJERES	OACNUDH				
<b>OUTCOME 1:</b>	Capacidades institucionales, de la sociedad civil, de los pueblos indigenas y del sector privado fortalecidas para transformar la conflictividad social, a través del diálogo democrático, la consulta previa, y la protección efectiva a defensoras y defensores de los derechos humanos.							
<b>Output 1.1:</b>	Instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública para la promoción del diálogo democrático y la transformación de la conflictividad social con enfoque de derechos humanos, diseñados, adoptados y en proceso de implementación.							
Activity 1.1.1:	Asistencia técnica para el diseño e implementación de metodologías, protocolos y herramientas para el análisis de la conflictividad social.	\$ 111,500.00	\$ -	\$ -	\$ 111,500.00		\$ 94,305.00	
Activity 1.1.2:	Asistencia técnica para la elaboración y adopción de la política pública de diálogo y gestión de la conflictividad social.	\$ 122,516.74	\$ -	\$ -	\$ 122,516.74	30%	\$ 108,592.91	
Activity 1.1.3:	Asistencia técnica para el fortalecimiento y articulación de los sistemas de alerta y respuesta temprana sobre la conflictividad social.	\$ 98,800.00	\$ -	\$ -	\$ 98,800.00	20%	\$ 84,949.33	
Activity 1.1.4	Asistencia técnica para facilitar el proceso de transición de gobierno en la institucionalidad del diálogo y conflictividad social	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00		\$ 33,160.00	
	<b>Output Total</b>	<b>\$ 370,816.74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 370,816.74</b>	<b>\$ 56,515.02</b>	<b>\$ 321,007.24</b>	

<b>Output 1.2:</b>	Diálogos estratégicos a nivel nacional y territorial con enfoque transformativo diseñados y acompañados para abordar problemáticas estructurales y emergentes de la conflictividad social, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género, étnica y etaria.							
Activity 1.2.1	Diálogos estratégicos a nivel nacional y territorial con enfoque transformativo diseñados y acompañados para abordar problemáticas estructurales y emergentes de la conflictividad social, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género, étnica y etaria.	\$ 137,600.00	\$ -	\$ -	\$ 137,600.00	33%	\$ 104,555.66	
Activity 1.2.2	Desarrollo de (01) diálogo estratégico que aborde problemáticas territoriales priorizadas en la región del Valle del Polochic, asegurando la participación igualitaria de mujeres, jóvenes, y pueblos indígenas.	\$ 163,000.00	\$ -	\$ -	\$ 163,000.00		\$ 121,510.00	
Activity 1.2.3	Preparación, participación e incidencia de las mujeres en los procesos de diálogos estratégicos con enfoque transformativo	\$ -	\$ 172,240.00	\$ -	\$ 172,240.00	100%	\$ 105,625.20	
	<b>Output Total</b>	<b>\$ 300,600.00</b>	<b>\$ 172,240.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 472,840.00</b>	<b>\$ 217,648.00</b>	<b>\$ 331,690.86</b>	
<b>Output 1.3:</b>	Procesos de consulta previa con pueblos indígenas acompañados en su implementación, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, igualdad de género, etnia y edad.							
Activity 1.3.1	Asistencia técnica para el desarrollo del marco normativo sobre la consulta previa.	\$ 57,630.00	\$ -	\$ -	\$ 57,630.00	30%	\$ 72,087.97	
Activity 1.3.2	Asistencia técnica y financiera para el acompañamiento de dos (02) procesos priorizados de consulta previa, y/o procesos de consulta ordenados por la Corte de Constitucionalidad.	\$ 98,653.00	\$ -	\$ -	\$ 98,653.00	30%	\$ 68,955.37	
Activity 1.3.3	Preparación, participación e incidencia de las mujeres en la consulta previa e informada	\$ -	\$ 125,600.00	\$ -	\$ 125,600.00	100%	\$ 52,270.99	
	<b>Output Total</b>	<b>\$ 156,283.00</b>	<b>\$ 125,600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 281,883.00</b>	<b>\$ 172,484.90</b>	<b>\$ 193,314.33</b>	
<b>Output 1.4:</b>	Instrumentos de política y fortalecimiento de capacidades para la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, diseñados participativamente, adoptados y en proceso de implementación.							
Activity 1.4.1	Fortalecimiento de un entorno seguro u propicio para la defensa de los derechos humanos así como medidas de protección a defensoras u defensores de derechos humanos (incluyendo la propuesta de política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos)	\$ -	\$ -	\$ 217,500.00	\$ 217,500.00		\$ 132,987.00	
Activity 1.4.2	Fortalecimiento de las redes de defensoras para la implementación de la resolución de la asamblea general para la protección de mujeres defensoras de los derechos humanos	\$ -	\$ 38,500.00	\$ 67,000.00	\$ 105,500.00	100%	\$ 177,440.12	Presupuesto conjunto Fase I ejecutada por OACNUDH y Fase II Ejecutada por ONUMJERES
Activity 1.4.3	Preparación, participación e incidencia de las mujeres en la consulta previa e informada (Fase I)	\$ -	\$ 34,501.00	\$ -	\$ 34,501.00	100%	\$ 34,501.00	
	<b>Output Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 73,001.00</b>	<b>\$ 284,500.00</b>	<b>\$ 357,501.00</b>	<b>\$ 140,001.00</b>	<b>\$ 344,928.12</b>	
<b>Output 1.5:</b>	Instrumentos de análisis y estrategias de prevención de la conflictividad electoral diseñados e implementados con actores clave, antes, durante y después del proceso electoral							

Activity 1.5.1	Asistencia técnica para el diseño e implementación de herramientas de análisis y estrategias de prevención de la conflictividad electoral	\$ 112,000.00	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00	19%	\$ 65,840.00	
Activity 1.5.2	Fortalecimiento de capacidades y formación en prevención de conflictos y mediación electoral	\$ 128,000.00	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	8%	\$ 93,410.00	
Activity 1.5.3	Asistencia técnica y monitoreo para la prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral (antes, durante y despues)	\$ -	\$ -	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	50%	\$ 10,801.00	
Activity 1.5.4	Asistencia técnica para prevenir la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral	\$ -	\$ 114,000.00	\$ -	\$ 114,000.00	100%	\$ 57,566.61	
	<b>Output Total</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 114,000.00</b>	<b>\$ 57,500.00</b>	<b>\$ 411,500.00</b>	<b>\$ 174,270.00</b>	<b>\$ 227,617.61</b>	



<b>Additional personnel costs</b>	Administracion y Finanzas	\$ 76,000.00			\$ 76,000.00	50%	\$ 64,360.00	
<b>Additional Operational Costs</b>	Costos Operación	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		\$ 20,000.00	
<b>Monitoring budget</b>	Encargado de Monitoreo y Viajes	\$ 136,000.00			\$ 136,000.00	18%	\$ 128,500.00	
<b>Budget for independent final evaluation</b>		\$ -			\$ -		\$ -	
<b>Total Additional Costs</b>		<b>\$ 242,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 242,000.00</b>	<b>\$ 62,480.00</b>	<b>\$ 212,860.00</b>	

Totals				
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total
	UNDP	ONUMJERES	OACNUDH	
Sub-Total Project Budget	\$ 1,309,699.74	\$ 484,841.00	\$ 342,000.00	\$ 2,136,540.74
Indirect support costs (7%):	\$ 91,678.98	\$ 33,938.87	\$ 23,940.00	\$ 149,557.85
<b>Total</b>	<b>\$ 1,401,378.72</b>	<b>\$ 518,779.87</b>	<b>\$ 365,940.00</b>	<b>\$ 2,286,098.59</b>

Performance-Based Tranche Breakdown					
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total	Tranche %
	UNDP	ONUMJERES	OACNUDH		
<b>First Tranche:</b>	\$ 570,523.72	\$ 363,145.91	\$ 256,158.00	\$ 1,189,827.63	70%
<b>Second Tranche:</b>	\$ 581,598.50	\$ 155,633.96	\$ 109,782.00	\$ 847,014.46	30%
<b>Third Tranche</b>	\$ 249,256.50	\$ -	\$ -	\$ 249,256.50	
<b>Total:</b>	<b>\$ 1,401,378.72</b>	<b>\$ 518,779.87</b>	<b>\$ 365,940.00</b>	<b>\$ 2,286,098.59</b>	<b>100%</b>

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 881,036.85
% Towards GEWE	38.54%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 145,520.00

<b>Total Expenditure</b>	\$ 1,631,418.16
Delivery Rate:	76%

% Towards M&E	6.37%
Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if this minimum threshold is not met.	




Naciones Unidas  
Consolidación de la Paz



# Proyecto Transformando relaciones para la consolidación de la Paz

*Informe Semi-anual  
Junio 2020*

## COBERTURA

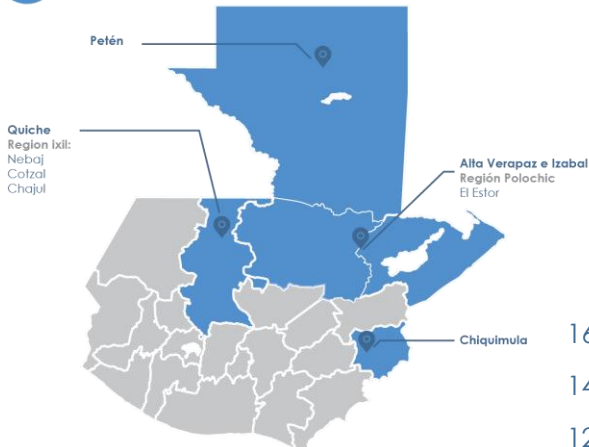

- P.1** Promoción de diálogo democrático
- P.2** Diálogos estratégicos con enfoque de DDHH
- P.3** Consulta Previa con Pueblos Indígenas
- P.4** Protección de Defensores/as de DH
- P.5** Prevención Conflictividad Electoral

## CONTRAPARTES NACIONALES

Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)


## DURACIÓN

**42 MESES**  
(mayo 2017 - noviembre 2020)




## AGENCIA IMPLEMENTADORA



## AVANCES PROGRAMÁTICOS

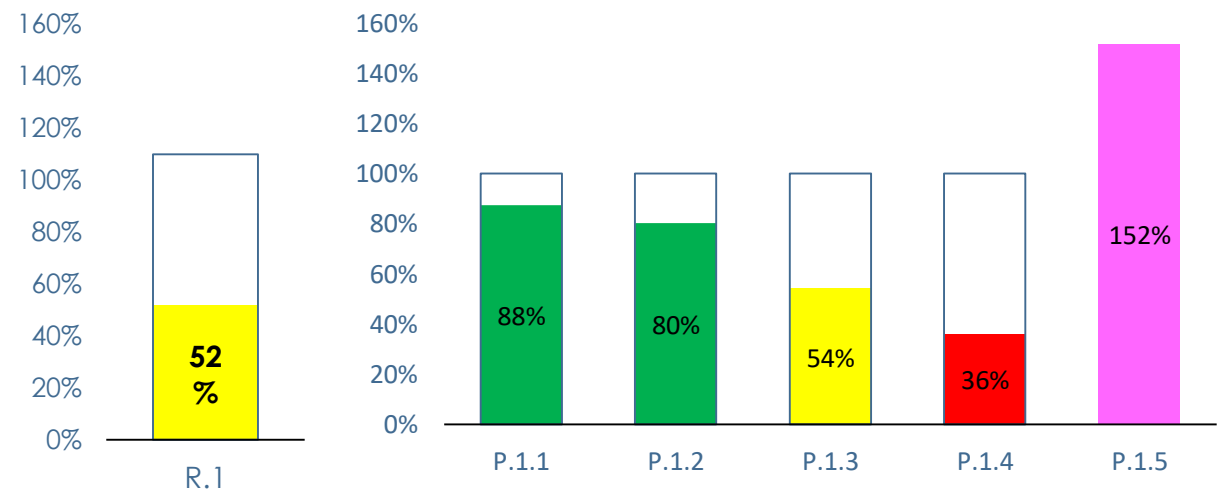

## CUMPLIMIENTO DE METAS

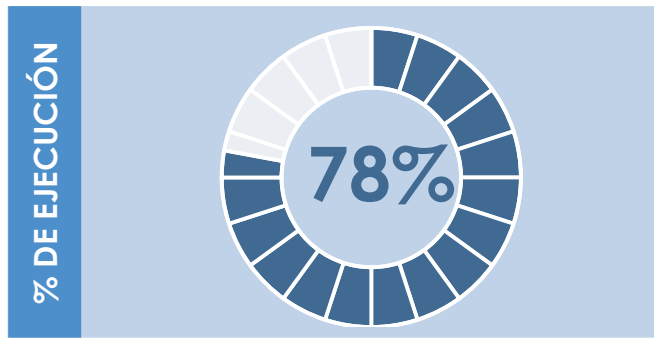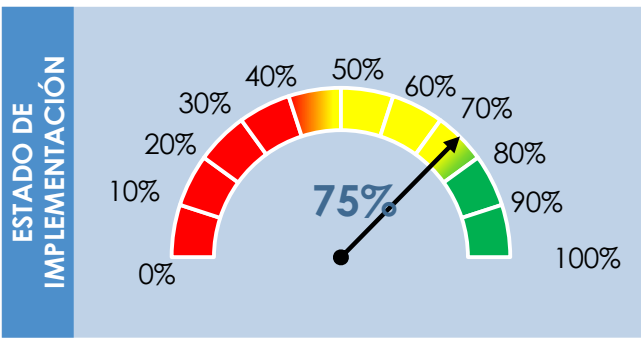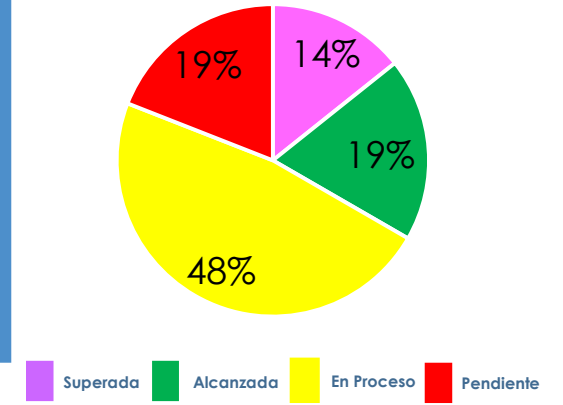

## PRESUPUESTO

Planificado	\$ 2,286,098.59
Ejecutado	\$ 1,780,976.01
<b>Saldo</b>	<b>\$ 505,122.58</b>





## RESULTADO

El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la conflictividad social y fortalecer la consolidación de la paz.

## RESULTADO 1

El proyecto ha contribuido a alcanzar los siguientes cambios a nivel institucional y social:

- El Estado de Guatemala cuenta con experiencias exitosas para la coordinación y gestión interinstitucional de conflictos.
- Se ha generado espacios que han permitido a diversos actores interactuar activamente para desarrollar propuestas de desarrollo que han contribuido a la prevención y transformación de conflictos, así como fortalecer la democracia, gobernanza y consolidación de la paz.
- Se contribuyó con el fortalecimiento de las capacidades de los órganos temporales como las juntas electorales y la sensibilización en temas de género y derechos humanos, para un proceso transparente, libre de violencia y en paz.



Se ha promovido el SART en diferentes espacios para que se convierta en el sistema único para el análisis y abordaje de la conflictividad.



Se ha avanzado en el proceso de co-diseño en San Juan Sacatepéquez en el marco de la réplica del modelo desarrollado en Panzós.



Se están impulsando espacios de reflexión sobre los mecanismos del proceso de consulta previa con PPII. Se está dando seguimiento al acompañamiento del proceso de consulta a nivel territorial en Cotzal.



Reposicionamiento de la política pública de protección de personas defensores de DDHH con la institucionalidad pública y desarrollo de consultas sectoriales y regionales.



Disminución de la conflictividad electoral por acciones coordinadas entre La Mesa de Prevención de Conflictividad Electoral del TSE, la PDH y el CAME.



*Irma Yolanda Caal Caal, Octava  
Concejala Municipal de San Pedro  
Carchá.*



**Impacto en la vida de las personas**

---

*Irma Yolanda Caal Caal,  
Octava Concejala  
Municipal de San Pedro  
Carchá.*

---

*Irma Yolanda Caal Caal, optó por postularse al cargo de concejala debido al conocimientos y capacidades adquiridas en los procesos de intercambio entre las propias lideresas.*

*“Me motivó darme cuenta de que mi contribución en el trabajo social, como técnica en varias instituciones, podría tener un mayor impacto dentro de un rol municipal [...] Ahora que contribuyo desde el conocimiento que he acumulado como persona, con el apoyo de ONU Mujeres y otras entidades; y aunque todavía es difícil para las mujeres, las otras tres concejales y yo estamos rompiendo paradigmas”.*














# Gracias



Naciones Unidas  
Consolidación de la Paz

[www.onu.org.gt](http://www.onu.org.gt)  
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz  
Oficina de la Coordinación Residente  
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala  
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,  
Ciudad de Guatemala  
[onu.gt@one.un.org](mailto:onu.gt@one.un.org) 2384 3100



P.1

