



## La reunión del Comité Directivo del proyecto:

### **BOL/101407 “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria”**

Lugar: Salón Rojo del Tribunal Supremo Electoral

Fecha: Lunes 9 de octubre de 2017

Horario: 11:00 a 12:05 horas

### **Programa del evento**

<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>
11:00 - 11:10	Palabras de bienvenida.	Dr. José Luis Exeni Rodríguez <b>VICEPRESIDENTE DEL TSE.</b>
11:10 - 11:20	Palabras sobre la agenda del PNUD en Autonomía Indígena.	Lic. Maribel Gutiérrez <b>REPRESENTANTE RESIDENTE ADJUNTA DEL PNUD EN BOLIVIA</b>
11:20 - 11:50	Presentación del Informe del proyecto BOL/101407 "Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria".	Msc. Karina Mireya Herrera Miller <b>DIRECTORA NACIONAL DEL SIFDE TSE – OEP</b>
11:50 – 12:10	Diálogo y preguntas.	
12:10 – 12:15	Cierre de reunión.	



**PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES DEL TSE – OEP PARA EL  
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE DEMOCRACIA EN AIOC  
Y DEMOCRACIA PARITARIA”**

Febrero a octubre de 2017



## Objetivo

Fortalecer las capacidades institucionales, técnicas, normativas y de debate público del TSE para atender los procesos vinculados con las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, particularmente lo referido a las AIOC y paridad democrática.

## Alcances del proyecto

### AIOC

- El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos.

### GESTIÓN DEL PROCESO AIOC

- El TSE, a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC.

### MUJERES INDIGENAS



- Género: El TSE cuenta con metodologías para la participación política de mujeres indígenas en las AIOC.

### GESTIÓN CONOCIMIENTO

- Desarrollo de un sistema de información integral sobre el proceso de implementación de la AIOC (avances, normas, procedimientos propios, base de datos, archivo físico y digital).

### GERENCIA PROYECTO

- Se cuenta con personal para ejecución técnica y financiera del proyecto.

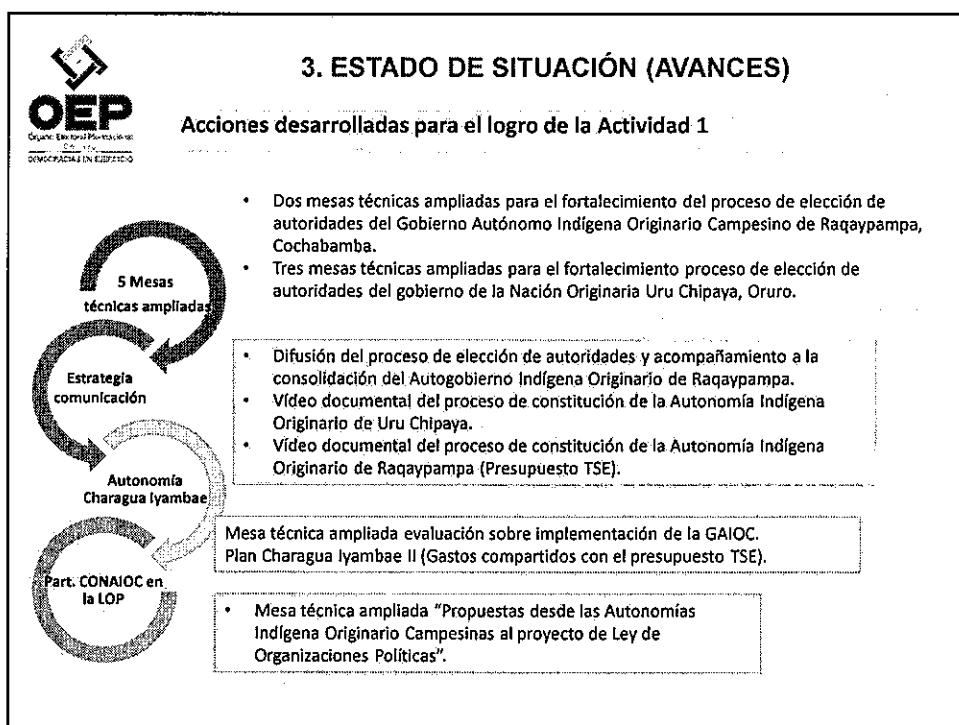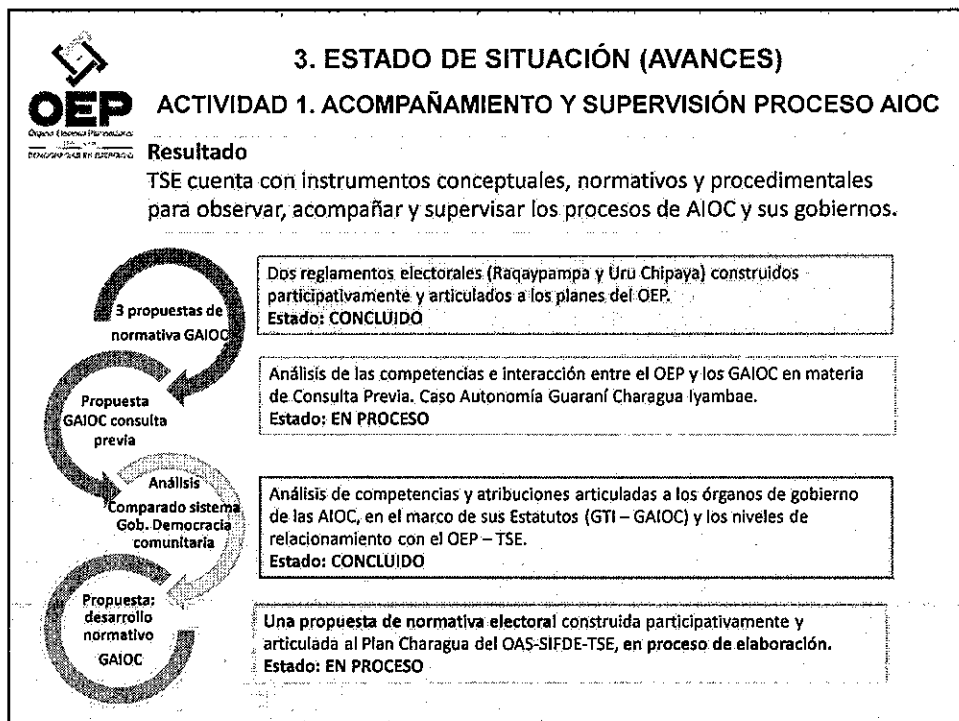



## ACTIVIDAD 1. ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN PROCESO AIOC



Acompañamiento y fortalecimiento al proceso GAIOC Raqaypampa



Acompañamiento y fortalecimiento al proceso GAIOC Uru Chipaya



Mesa técnica ampliada orientada al fortalecimiento del proceso de constitución del GAIOC Uru Chipaya



## ACTIVIDAD 1. ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN PROCESO AIOC



Talleres de consultoría en el territorio, en marco al acompañamiento y fortalecimiento al proceso GAIOC Raqaypampa



Talleres de consultoría en el territorio, en marco al acompañamiento y fortalecimiento al proceso GAIOC Uru Chipaya



Acompañamiento y fortalecimiento al proceso elección del autogobierno de Raqaypampa



Acompañamiento y fortalecimiento al proceso elección del autogobierno de Uru Chipaya



### 3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)

#### ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DEL PROCESO AIOC

##### Resultado

TSE a través de los Tribunales Electoral Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC.



La realización de las acciones de esta actividad están sujetas a la conclusión del proceso de debate sobre la Participación de las mujeres indígenas (Actividad 3) y Acompañamiento y supervisión proceso AIOC (Actividad 1).

Asimismo, se debe considerar que construcción de la Autonomía Indígena es un proceso que lleva tiempo, ya que es imprescindible garantizar la participación activa y directa de los pueblos indígenas en la conformación de sus gobiernos según sus normas y procedimientos propios.




### 3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)

#### ACTIVIDAD 3: PARTICIPACIÓN MUJERES INDÍGENAS

##### Resultado

TSE cuenta con metodologías para la participación política de mujeres indígenas en las AIOC.



Dos propuestas metodológicas y de contenidos implementadas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el proceso de conformación de los autogobiernos AIOC (Raqaypampa y Uru Chipaya).  
Estado: en proceso

Dos documentos de sistematización de la experiencia en 2 AIOC de talleres de fortalecimiento a mujeres (Raqaypampa y Uru Chipaya). Estado: en proceso

Se cuenta con propuesta de metodología  
Estado: En proceso


Estado: Sin avance



### 3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)

#### ACTIVIDAD 3: PARTICIPACIÓN MUJERES INDÍGENAS

##### Acciones desarrolladas para el logro de la actividad 3



- Talleres con mujeres de las Subcentrales de Raqaypampa y en los cuatro Ayllus Uru Chipaya, orientados a la socialización de Estatutos y Reglamentos, es especial los articulados referidos a la participación y representación de las mujeres en los autogobiernos IOC.
- Acompañamiento a los proceso de pre elección y elección de autoridades de los GAIOC de Raqaypampa y de Uru Chipaya, para asegurar el ejercicio de la paridad y alternancia en la elección de autoridades establecidos en sus estatutos y reglamentos.
- Se desarrollaron talleres sobre estatutos, atribuciones de las autoridades y agenda de las mujeres, mediante metodologías que permitieron espacios de reflexión sobre la importancia de la participación de las mujeres en todas las etapas del proceso autonómico IOC.
- Se encuentra en proceso dos investigaciones sobre la participación de las mujeres en las AIOC de Uru Chipaya y Charagua.; asimismo la producción de un video documental que recoge la experiencia de participación de las mujeres IOC en las la conformación de los Autogobiernos AIOC.



#### ACTIVIDAD 3: PARTICIPACIÓN MUJERES INDÍGENAS



Talleres de fortalecimiento a la actoría política de mujeres AIOC Uru Chipaya



Talleres de socialización de estatutos mujeres AIOC Raqaypampa




### 3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)

#### ACTIVIDAD 4: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

##### Resultado 4

Sistematizar en una base de datos las acciones desarrolladas por las autonomías, en el marco a su participación política y el ejercicio de la democracia comunitaria

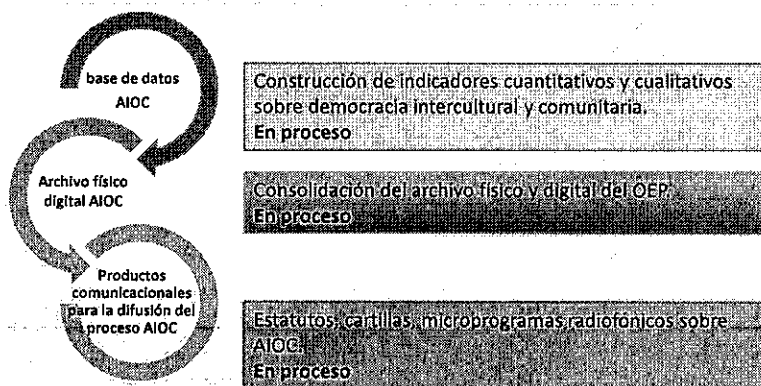

### 3. AVANCE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 5 de octubre 2017

Actividad	Resultado	Presup. Planific. USD	Presup. Ejecut. USD	Presup. comprom. USD	Ejecutado + comprom. USD	% de ejec.	Saldo
Actividad 1: Acompañamiento y supervisión proceso AIOC	El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos	59.986	35.817	11.468	47.285	78 %	12.701
Actividad 2: Gestión del proceso AIOC	El TSE a través de los Tribunales Electoral Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC	19.393	0	0	0	0 %	19.393
Actividad 3: Participación mujeres indígenas	Género: El TSE cuenta con metodologías para la participación política d mujeres indígenas en las AIOC	59.868	7.663	9.493	17.156	28 %	42.712
Actividad 4: Gestión del conocimiento	Gestión del conocimiento	30.128	220	13.820	14.040	46 %	16.088
Actividad 5: Gerencia Del Proyecto	Gerencia del Proyecto	30.624	9.496	0	9.496	31 %	21.128
TOTAL USD.		200.000	53.196	34.782	87.978	44 %	112.022
TOTAL Bs.		1.382.000	367.584	240.341	607.925	44 %	774.075



## CONCLUSIONES

- El proyecto fue diseñado para su implementación en un tiempo de 11 meses, de febrero a diciembre de 2017, quedando un total de cinco (5) meses para el cierre de ejecución.
- De los 5 resultados planteados, uno ha tenido un avance significativo, la **Actividad 1. Acompañamiento y supervisión proceso AIOC**, la cual reporta un 71 % aproximado de avance.
- En cuanto a la ejecución presupuestaria, esta reporta un porcentaje aproximado del **44 % de avance**, a agosto de 2017.
- El proyecto ha **contribuido significativamente, en el proceso de construcción de las AIOC de Raqaypampa, Uru Chipaya y Charagua Iyambae**, además ha coadyuvado en el ejercicio de las competencias del OEP para el fortalecimiento de la democracia comunitaria.



## CONCLUSIONES

- Los insumos analíticos que se han ido generando a la fecha han servido para un marco **mayor de reflexión de las implicancias de la democracia comunitaria en la necesaria transformación de las estructuras estatales.**
- Como **contraparte nacional** del proyecto, y dentro del marco del plan estratégico del TSE, **se ha contribuido con recursos humanos, técnicos y financieros** para el desarrollo de todas las actividades.
- El proyecto se inscribe en un ámbito mayor de esfuerzo y mandato institucionales del OEP, para fortalecer las tres democracias; enmarcados en los lineamientos de la Agenda Patriótica.
- El proyecto se encuentra en el área de interculturalidad de la agenda programática del PNUD y contribuye al objetivo de desarrollo sostenible 16 que promueve la inclusión y la justicia social.





## RECOMENDACIONES

- ✓ **Ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta junio de 2018, teniendo en cuenta los ritmos de los procesos de las AIOC y el proceso de elección de las altas autoridades de Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.**
- ✓ **Reforzar el seguimiento al cumplimiento técnico y administrativo, bajo la coordinación de un o una responsable específica del proyecto y los consiguientes apoyos técnicos.**
- ✓ **Ajustar las acciones orientados al fortalecimiento de la democracia comunitaria, ampliando su alcance hacia las AIOC en proceso de construcción.**
- ✓ **Coordinar actividades conjuntas en el marco del proyecto BOL/94339 "Fortalecimiento del Estado Plurinacional Autnómico y la Democracia Intercultural" del PNUD.**
- ✓ **Ampliar de la ruta crítica del proyecto en el marco de la matriz adjunta en el Anexo 1.**




## DESAFÍOS

- **Definir el rol del Órgano Electoral Plurinacional en procesos electorales de los GAIOC, establecidos por normas y procedimientos propios, a partir de las experiencias ya desarrolladas.**
- **Constituir al Órgano Electoral Plurinacional en un referente institucional en el acompañamiento en los procesos de construcción y constitución de las AIOC en el país y de la democracia comunitaria en particular.**
- **Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional entre Órgano Electoral Plurinacional y los GAIOC, en torno a la transparencia para fortalecer capacidades, en el marco de la democracia intercultural y paritaria.**
- **Fortalecer las capacidades de las servidoras y los servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional en procesos autonómicos IOC.**



## DESAFÍOS


- **Establecer y fortalecer procesos de información a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos respecto al ejercicio de las democracias comunitarias**, en el marco de los procesos de Autonomía Indígena Originaria Campesina.
- **Visibilizar y difundir los procesos de AIOC en múltiples escenarios y actores**, con diversos recursos didácticos, audiovisuales y periodísticos para sensibilizar y concienciar sobre las particularidades del proceso boliviano y la construcción de un Estado plurinacional.
- **Difundir y compartir las experiencias AIOC, además de las prácticas institucionales del OEP al respecto**, en otras instancias y espacios regionales e internacionales a fin de generar diálogos y rescatar buenas prácticas en casos próximos a estos.

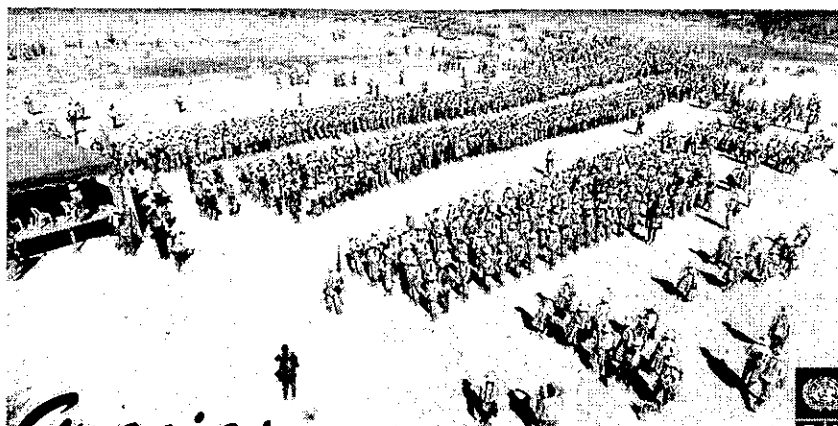

Gracias



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



# OEP

Órgano Electoral Plurinacional  
Bolivia

DEMOCRACIAS EN EJERCICIO

**Informe de avance del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria” TSE – PNUD.**

Elaborado por

**SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO  
DEMOCRÁTICO – SIFDE - TSE**

**UNIDAD DE GÉNERO DEL TSE**

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL  
DESARROLLO - PNUD**



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

Octubre de 2017

## Contenido

<b>1. ANTECEDENTES</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCES DEL PROYECTO (RESULTADOS PROPUESTOS)</b>	<b>3</b>
<b>3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)</b>	<b>5</b>
3.1. <i>Actividad 1. Acompañamiento y supervisión proceso AIOC</i>	5
3.1.1. Resultado esperado y avance de actividades	5
3.1.2. Acciones desarrolladas para el logro de la actividad 1	6
3.2. <i>Actividad 2. Gestión del proceso AIOC</i>	9
3.3. <i>Actividad 3. Participación mujeres indígenas</i>	9
3.3.1. Resultado esperado y avance de actividades	9
3.3.2. Acciones desarrolladas en el proceso de fortalecimiento de la participación de las mujeres en las AIOC	10
3.4. <i>Actividad 4, Gestión del conocimiento</i>	12
3.5. Gerencia del proyecto	12
<b>4. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>12</b>
<b>5. CONCLUSIONES</b>	<b>13</b>
<b>6. RECOMENDACIONES</b>	<b>14</b>
<b>7. DESAFIOS</b>	<b>15</b>
<b>8. ANEXOS</b>	<b>17</b>
8.1. Anexo 1. Propuesta de planificación segundo semestre AIOC	17
8.2. Anexo 1-A. Propuesta de planificación segundo semestre - Género	21
8.3. Anexo 2. Estado de situación de las consultorías AIOC	23
8.4. Anexo 2-A. Estado de situación de las consultorías – Género	32

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS  
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TSE – OEP PARA EL ACOMPAÑAMIENTO  
A PROCESOS DE DEMOCRACIA EN AIOC Y DEMOCRACIA PARITARIA" TSE –  
PNUD.**

**1. ANTECEDENTES**

En el marco de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley 026 del Régimen Electoral, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), viene realizando acciones de observación, acompañamiento y supervisión al procesos de construcción de las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC).

En este sentido y orientados a coadyuvar en el fortalecimiento de estos procesos democráticos, el SIFDE, a partir del segundo semestre del año 2016, entabla relacionamiento interinstitucional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la construcción e implementación del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria", que inicia su implementación el 10 de febrero de 2017.

El proyecto responde a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), articulado al objetivo estratégico "Consolidar la democracia intercultural y paritaria del Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar el ejercicio pleno y complementario de las democracias directa y participativa, la representativa, y la comunitaria (en el marco de los derechos colectivos de las NPIOC)". (OE.1. - PEI); enfocándose en fortalecer las capacidades institucionales técnicas, normativas y de debate público del TSE para atender los procesos vinculados con las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, particularmente lo referido a las AIOC y paridad democrática.

Las principales líneas de abordaje del proyecto se centran en los siguientes aspectos: Desarrollo de las capacidades institucionales y normativas institucionales para el acompañamiento a los procesos de AIOC; Mejorar las condiciones de participación política de las mujeres con énfasis en democracia comunitaria y paridad democrática; y la gestión del conocimiento.

La estrategia de implementación contempla el desarrollo de cinco (5) actividades programáticas, con un presupuesto que asciende a Bs.1.382.153 (Un millón trescientos ochenta y dos mil, ciento cincuenta y tres bolivianos 00/100), los cuales están distribuidos en: a). Acompañamiento y supervisión del proceso AIOC (Bs.411.094); b). Gestión del proceso AIOC (Bs.134.006); c). Participación de mujeres indígenas (Bs.413.689); Gestión del conocimiento (Bs.208.186) y Gerencia del proyecto (Bs. 215.176).

**2. ALCANCES DEL PROYECTO (RESULTADOS PROPUESTOS)**

El proyecto tiene una duración de 11 meses, aproximadamente; del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2017, entre sus principales alcances o resultados por actividad se encuentran:

**Cuadro. 1. Actividades planificadas del proyecto**

Actividad	Resultado	Actividad indicativa	Actividades
<b>ACTIVIDAD 1: ACOMPANIAMIENT O Y SUPERVISIÓN PROCESO AIOC</b>	El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos	Desarrollo de insumos y adecuación para normativa específica del proceso AIOC en sus distintas etapas	Se cuenta con tres propuestas con insumos normativos contruidos participativamente con los GAIOC, articulado al plan Charagua y Planes para Uru Chipaya y Raqaypampa.
			Se cuenta con una propuesta de coordinación/interacción entre OEP y GAIOC en materia de Consulta previa en AIOC, en el caso Charagua.
			Se cuenta con un documento sobre el sistema de gobierno y la democracia comunitaria en el proceso AIOC con base en el análisis comparado de los estatutos autonómicos y las Declaraciones de constitucionalidad en seis casos: Charagua, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totorá Marka, Huacaya y Lomerío.
			Se cuenta con propuestas para el desarrollo normativo de las GAIOC de Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa en el ámbito del autogobierno para el ejercicio de las democracias
<b>ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DEL PROCESO AIOC</b>	El TSE a través de los Tribunales Electoral Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC	Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades del personal de los TEDs y el TSE, en los nueve departamentos	Se cuenta con un documento sistematizado de los nueve talleres internos en los TED sobre democracia intercultural y paritaria. En base a notas conceptuales generadas por el TSE.
			Se cuenta con un documento sistematizado de los espacios de diálogo y debate público con actores departamentales sobre democracia intercultural y paritaria.
<b>ACTIVIDAD 3: PARTICIPACIÓN MUJERES INDÍGENAS</b>	Género: El TSE cuenta con metodologías para la participación política d mujeres indígenas en las AIOC	Desarrollo de insumos, metodología e instrumentos para acompañar procesos de participación de mujeres en AIOC	Propuesta metodológica y de contenidos para el fortalecimiento de la actoría política de las mujeres en las AIOC.
			Documento de sistematización de la experiencia en los 3 AIOC de talleres de fortalecimiento a mujeres de las AIOC de Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa.
		Desarrollo de procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre paridad con mujeres IOC (locales, departamentales y nacionales).	Registro del encuentro y documento de propuestas de encuentro Nacional con mujeres de 11 AIOC* para el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la participación de las mujeres en los procesos de construcción de las AIOC y la inclusión sus propuestas.
			Documento de conclusiones y compromisos de diálogos interculturales con mujeres indígenas sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y hombres de las NyPIOC (La Paz y Santa Cruz).
<b>ACTIVIDAD 4: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	Gestión del conocimiento	Desarrollo de un sistema de información integral sobre el proceso de implementación de la AIOC (avances, normas, procedimientos propios, base de datos, archivo físico y digital).	Documento de conclusiones y compromisos de 9 Diálogos interculturales sobre Democracia Paritaria y las nociones de equivalencia entre mujeres y hombres IOC (departamentales).
			Se cuenta con una base de datos sistemática sobre participación política y democracia comunitaria de NyPIOC.
		Desarrollo de productos comunicacionales con enfoque intercultural	Se cuenta con un archivo físico y digital de todos los procesos AIOC en etapa de acceso, constitución y funcionamiento como GAIOC.
<b>ACTIVIDAD 5: GERENCIA DEL PROYECTO</b>	Gerencia del Proyecto		Se cuenta con productos comunicacionales de documentos y debate público
			Productos comunicacionales, afiches, cartillas, etc.

Fuente: Elaboración propia en base a proyecto TSE-PNUD.

### 3. ESTADO DE SITUACIÓN (AVANCES)

A partir de la implementación del proyecto, 10 de febrero de 2017, se abordaron acciones de fortalecimiento a procesos de consolidación de tres AIOC, Charagua Iyambae, en pleno ejercicio de su Autogobierno; y Raqaypampa y Uru Chipaya en procesos de elección de sus autoridades de gobierno.

Para esto, se aplicaron estrategias orientadas a coadyuvar en el desarrollo de los procesos establecidos por las dinámicas propias de las AIOC, respetando las normas y procedimientos propios, a través del desarrollo de las siguientes acciones, definidas en el proyecto.

#### 3.1. Actividad 1. Acompañamiento y supervisión proceso AIOC

##### 3.1.1. Resultado esperado y avance de actividades.

TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos.

**Cuadro. 2. Estado de avance de las actividades**

Actividades	Avance
Se cuenta con tres propuestas con insumos normativos construidos participativamente con los GAIOC, articulado al plan Charagua y Planes para Uru Chipaya y Raqaypampa.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Dos propuestas de normativa electoral</b> (Raqaypampa y Uru Chipaya) construidas participativamente y articuladas a los planes OAS-SIFDE-TSE.</li><li>- <b>Responsables:</b> consultores Clemente Salazar y Paulino Guarachi.</li><li>- <b>Plazo:</b> junio a septiembre 2017</li><li><b>Estado: Concluido</b></li></ul>
Se cuenta con una propuesta de coordinación/interacción entre OEP y GAIOC en materia de Consulta previa en AIOC, en el caso Charagua	<p>Consultoría por producto: "Análisis de las competencias e interacción entre el OEP y los GAIOC en materia de Consulta Previa. Caso Autonomía Guaraní Charagua Iyambae".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Consultor: Juan Miguel Suárez Augsten</li><li>✓ Entregó dos informes de avance</li><li>✓ Se realizó el primer taller de levantamiento de información con actores clave de la NyPIOC</li><li>✓ Plazo: Junio a noviembre 2017</li><li><b>Estado: en proceso</b></li></ul>
Se cuenta con un documento sobre el sistema de gobierno y la democracia comunitaria en el proceso AIOC con base en el análisis comparado de los estatutos autonómicos y las Declaraciones de constitucionalidad en seis casos: Charagua, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totorá Marka, Huacaya y Lomerío.	<p>Consultoría por Producto, "Análisis de competencias y atribuciones articuladas a los órganos de gobierno de las AIOC Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totorá Marka, Huacaya y Lomerío, en el marco de sus Estatutos (GTI – GAIOC) y los niveles de relacionamiento con el OEP – TSE".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Entregó informe final</li><li>- <b>Consultor:</b> Gonzalo Vargas Rivas</li><li>- <b>Plazo:</b> Mayo a junio 2017</li><li><b>Estado: concluido</b></li></ul>
Se cuenta con propuestas para el desarrollo normativo de las GAIOC de Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa en el ámbito del autogobierno para el ejercicio de las democracias.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Una propuesta de normativa electoral en proceso de elaboración</b>, la cual es construida participativamente y articulada al Plan Charagua del OAS-SIFDE-TSE, en el marco de la consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Charagua Iyambae.</li><li>- <b>Responsable:</b> consultor José Ledezma</li><li>- <b>Plazo:</b> Mayo a noviembre 2017</li><li><b>Estado: en proceso</b></li></ul>

Fuente: Elaboración propia

El Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento a su rol de observación acompañamiento y supervisión de los procesos de construcción de las AIOC, establecidos en la Ley 018 del Órgano electoral Plurinacional y la Ley 026 del Régimen Electoral, tiene la necesidad de contar con insumos técnicos y normativos para acompañar procesos autonómicos. Para ello se ha planteado la elaboración de varios estudios.

- ✓ Para los procesos de elección de autoridades de los gobiernos de las autonomías de Uru Chipaya y Raqaypampa, a través del proyecto, se ha contratado dos consultores indígenas, los cuales han apoyado en la elaboración de los reglamentos para la elección de las autoridades. En los dos casos señalados se cuenta con normativa de elección de autoridades, las cuales han sido elaboradas participativamente por las instancias correspondientes.
- ✓ Con la finalidad de generar insumos técnicos para la implementación de la competencia exclusiva, reconocida a las autonomías indígenas en la Constitución Política del Estado; en Charagua Iyambae se ha procedido a la contratación de un consultor para realizar el relevamiento, sistematización y análisis de información, en materia de consulta previa.
- ✓ En este mismo sentido, el proceso de construcción de autonomías requiere de insumos técnicos que permitan analizar la relación de las competencias en diferentes ámbitos, con la finalidad de coadyuvar en la comprensión y aplicación de las mismas. Para tal efecto, se ha contratado la consultoría por producto "Análisis de competencias y atribuciones articuladas a los órganos de gobierno de las AIOC Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totorá Marka, Huacaya y Lomerío, en el marco de sus Estatutos y los niveles de relacionamiento con el OEP – TSE", la cual, ha sido concluida y entregada al TSE.
- ✓ La implementación del GAIOC requiere de la instrumentalización de sus competencias establecidas en el Estatuto Autonómico. En el caso de la autonomía de Charagua Iyambae, se identificó como prioridad la elaboración de una normativa para el desarrollo de los procesos electorales, que permita el ejercicio de las normas y procedimientos propios. Para tal efecto, se contrató la consultoría "Facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Charagua Iyambae", la cual se encuentra en proceso de elaboración de los insumos técnicos.

### **3.1.2. Acciones desarrolladas para el logro de la actividad 1**

En el proceso de elección de autoridades de las autonomías de Uru Chipaya y Raqaypampa se han desarrollado diversas actividades que coadyuvaron al cumplimiento de la actividad 1, estas son:

#### **a) Mesas técnicas ampliadas de Raqaypampa y Uru Chipaya**

Con apoyo del proyecto PNUD y los recursos del OEP se han realizado mesas técnicas ampliadas, en cada una de ellas se establecieron espacios para una conferencia de prensa orientada a visibilizar los procesos y poner en evidencia las acciones encaminadas por los principales actores de la AIOC.

En las mesas técnicas participaron las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y Oruro, Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático y las autoridades territoriales de las AIOC.



En el caso de las mesas técnicas de Uru Chipaya, cada evento inicia con un acto ritual denominado "p'auta", a través del cual se agradece a los ancestros y desea que el evento llegue a buenos acuerdos. Se debe mencionar que en el evento del 6 de junio, del presente año, las autoridades originarias resaltaron el trabajo coordinado que realiza el TSE, mencionando lo siguiente: "...agradecer a las autoridades del Órgano Electoral por coordinar y trabajar de manera transparente..." (Memoria mesa técnica 6 de junio del 2017).

Mediante la realización de las mesas técnicas se ha **logrado**: a) la coordinación entre las autoridades originarias de los territorios y el Órgano Electoral Plurinacional, b) puesta en agenda pública el proceso de elección de las autoridades y representantes a los Órganos de gobierno, c) el protagonismo de las naciones y pueblos indígenas en el proceso de construcción del Estado Plurinacional.

**Cuadro. 3 Mesas técnicas ampliadas**

AIOC	Eventos	Cantidad	Fecha
Raqaypampa	Dos mesas técnicas ampliadas. Proceso de elección de autoridades del gobierno autónomo indígena originario campesino de Raqaypampa, Cochabamba.	2 eventos	9 de marzo y 9 de junio.
Uru Chipaya	Tres mesa técnicas ampliadas. Proceso de elección de autoridades del gobierno Nación Originaria Uru Chipaya, Oruro	3 eventos	9 de marzo, 22 de abril, 6 de junio.

Fuente: Elaboración propia

**b) Estrategia de comunicación en el proceso de elección de autoridades de los autogobiernos de Raqaypampa y Uru Chipaya**

El proceso de elección de las autoridades de las autonomías de Uru Chipaya y Raqaypampa, contó con la participación del Órgano Electoral Plurinacional, a través del acompañamiento, supervisión y la puesta en marcha de una estrategia comunicacional, esta última apoyada por el proyecto. Para el desarrollo de la estrategia comunicacional en Raqaypampa se contrató una consultoría responsable de difundir, a través de programas de radio, el proceso de elección de autoridades; en el caso de Uru Chipaya la consultoría corresponde a la elaboración de un video documental sobre el proceso eleccionario, así como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro. 4 Consultorías**

AIOC	Responsable	Consultoría	Fechas
Raqaypampa	Epifanio Campos Cordero	Comunicador para la difusión del proceso de elección de autoridades y acompañamiento a la consolidación del Autogobierno Indígena Originario de Raqaypampa	Junio a Julio /2017
Uru Chipaya	Alfonso Antonio Gumucio	Vídeo documental del proceso de constitución de la Autonomía Indígena Originario de Uru Chipaya.	Agosto a Sept/2017
Raqaypampa	Especialista	Vídeo documental del proceso de constitución de la Autonomía Indígena Originario de Raqaypampa.	Recursos TSE

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se ha facilitado la presencia de la prensa nacional en los dos procesos eleccionarios, a través del apoyo en el traslado de periodistas de medios masivos de comunicación a nivel nacional y departamental. Como principal resultado de esta acción resalta el posicionamiento de las AIOC en la agenda pública.

Asimismo, se debe mencionar que con recursos del TSE se han impreso periódicos y banners; además se viene realizado un vídeo documental del proceso de constitución de la Autonomía Indígena Originario de Raqaypampa, como complemento al material comunicacional generado y se mantiene de forma permanente la asistencia técnica de servidoras y servidores públicos del SIFDE.

#### **c) Fortalecimiento de la autonomía de Charagua Iyambae**

El autogobierno de la AIOC de Charagua Iyambae fue posesionado en enero del presente año. Por tanto, y con la finalidad de realizar una evaluación y seguimiento al proceso de implementación del autogobierno se ha convocado a la mesa técnica ampliada "Situación y perspectivas del autogobierno de la Autonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae", en la misma participaron autoridades del Tribunal Supremo Electoral; Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz; la Dirección del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático y autoridades del legislativo y la Asamblea Autonómica del GAIOC de Charagua Iyambae, además de expertos invitados en el tema AIOC.

En el evento, las autoridades del legislativo y de decisión colectiva de la AIOC de Charagua, mencionaron que en la GAIOC persiste la lógica municipalista. Por su parte, el consultor José Ledezma expresó las dificultades por las que está atravesando la autonomía de Charagua Iyambae, concluyendo que no existe coordinación entre los niveles de autogobierno.

Asimismo, se presentó, por parte del Órgano Electoral Plurinacional, el plan Charagua Iyambae II, como un instrumento de planificación para dar continuidad al proceso de fortalecimiento del Gobierno de la autonomía de Charagua, mismo que fue realimentado por las y los participantes.

A partir de la mesa técnica, las autoridades del OEP y de la autonomía han visto la necesidad de una mayor coordinación para el fortalecimiento del GAIOC y la implementación del plan Charagua Iyambae II, que dentro sus líneas centrales expresa:

- ✓ Generar insumos técnicos orientados a fortalecer el ejercicio de las democracias en el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua Iyambae.
- ✓ Establecer procesos de diálogo y construcción colectiva del conocimiento y de fortalecimiento de capacidades, a partir de saberes de la NPIOC Charagua Iyambae.
- ✓ Promover el acceso a la información y procesos de comunicación para fortalecer la democracia intercultural.

Líneas que deben ser tomadas en cuenta dentro las acciones de fortalecimiento de la AIOC.

#### **d) Participación de las organizaciones indígenas en la construcción de la Ley de Partidos Políticos**

Con la orientación de incluir el tema de AIOC en la propuesta indígena para el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, recuperando los principios y prácticas democráticas, así como los aprendizajes producto de los procesos en marcha, el 17 de agosto de 2017, en la ciudad de Cochabamba, se realizó la mesa técnica "Propuestas desde las Autonomías Indígena Originario Campesinas al proyecto de Ley de Organizaciones Políticas".

Este evento contó con la participación de las principales autoridades de diferentes organizaciones indígenas de tierras altas y bajas a nivel nacional.

### 3.2. Actividad 2. Gestión del proceso AIOC

El resultado esperado en la presente actividad es: TSE a través de los Tribunales Electoral Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC.

La realización de las acciones de esta actividad están sujetas a la conclusión del proceso de debate sobre la Participación de las mujeres indígenas (Actividad 3) y Acompañamiento y supervisión al proceso AIOC (Actividad 1).

**Cuadro. 5. Estado de avance de actividades**

Actividad	Avance
Se cuenta con un documento sistematizado de los nueve talleres internos en los TED sobre democracia intercultural y paritaria. En base a notas conceptuales generadas por el TSE.	Sin avance, a espera de resultados de las actividades 1 y 3.
Se cuenta con un documento sistematizado de los espacios de diálogo y debate público con actores departamentales sobre democracia intercultural y paritaria.	Sin avance, a espera de resultados de las actividades 1 y 3.

Fuente: Elaboración propia

### 3.3. Actividad 3. Participación mujeres indígenas

#### 3.3.1. Resultado esperado y avance de actividades

**Resultado 3.1.** Género, el TSE cuenta con metodologías para la participación política de mujeres indígenas en las AIOC.

**Cuadro. 6. Participación de mujeres en AIOC**

Actividad	Avance
Propuesta metodológica y de contenidos para el fortalecimiento de la actoría política de las mujeres en las AIOC.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dos propuestas metodológicas y de contenidos implementadas (Raqaypampa y Uru Chipaya) fortalecen la participación política de las mujeres en el proceso de conformación las AIOC (concluidas).</li><li>- Responsables: consultoras Rosmery Pizarro Jarro (Raqaypampa) y Cecilia Vargas Choquemita (Uru Chipaya)</li><li>- Plazo: junio a septiembre 2017</li></ul> <p>Estado: en proceso, las propuestas metodológicas y de contenidos de Raqaypampa y Uru Chipaya han sido concluidas y presentadas por las consultoras. Falta la propuesta metodológica de Charagua Iyambae.</p>
Documento de sistematización de la experiencia en los 3 AIOC de talleres de fortalecimiento a mujeres de las AIOC de Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dos documentos de sistematización de la experiencia en 2 AIOC de talleres de fortalecimiento a mujeres (Raqaypampa y Uru Chipaya)</li><li>- Responsables: consultoras Rosmery Pizarro Jarro (Raqaypampa) y Cecilia Vargas Choquemita (Uru Chipaya)</li><li>- Plazo: junio a septiembre 2017</li></ul> <p>Estado: en proceso, la sistematización de los procesos AIOC de Raqaypampa y Uru Chipaya han sido concluidas y presentadas por las consultoras; queda pendiente el documento de sistematización de Charagua Iyambae, proceso que se realizará en los meses de septiembre y octubre.</p>
Registro del encuentro y documento de propuestas de encuentro Nacional con mujeres de 11 AIOC* para el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la participación de las mujeres en los procesos de construcción de las AIOC y la inclusión sus propuestas.	Estado: Sin avance.
Documento de conclusiones y compromisos de diálogos interculturales con mujeres indígenas	Estado: Sin avance.

Actividad	Avance
sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y hombres de los NPIOC (La Paz y Santa Cruz).	
Documento de conclusiones y compromisos de 9 Diálogos interculturales sobre Democracia Paritaria y las nociones de equivalencia entre mujeres y hombres IOC (departamentales)	Estado: Sin avance.

Fuente: Elaboración propia

- ✓ Las propuestas metodológicas y de contenido para el fortalecimiento de la actoría de las mujeres en las AIOC de Raqaypampa y Uru Chipaya con autoridades y lideresas, fueron desarrollados a partir de dos consultorías por producto, centrándose en la participación de las mujeres IOC en la conformación de gobiernos autonómicos a partir del seguimiento y observación a la aplicación de los artículos establecidos en sus estatutos, referentes a la conformación de los gobiernos AIOC, la socialización de sus estatutos y reglamentos; promoción de la participación con diferentes acciones. Queda pendiente desarrollar la propuesta metodológica de la AIOC Charagua Iyambae.
- ✓ Por otro lado, se cuenta con dos documentos de sistematización de experiencias de los procesos de conformación de gobiernos AIOC de Raqaypampa y Uru Chipaya, elaborados por las consultoras. Estos documentos recogen las experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en lo referente a la participación política de las mujeres en los procesos de las AIOC. Los talleres dirigidos a las mujeres IOC se constituyeron en espacios de fortalecimiento orgánico de las mujeres orientadas hacia la gestión de los gobiernos AIOC. Queda pendiente el proceso de fortalecimiento de la actoría de las mujeres en Charagua Iyambae.

### 3.3.2. Acciones desarrolladas en el proceso de fortalecimiento de la participación de las mujeres en las AIOC

De acuerdo a las propuestas metodológicas y de contenido para el fortalecimiento de los procesos de conformación de los GAIOC Raqaypampa y Uru Chipaya, se desarrollaron tres acciones:

#### a) Socialización de Estatutos y Reglamentos.

- ✓ Se realizaron talleres de socialización de estatutos y reglamentos en los que se abordaron los artículos que hacen referencia a la participación paritaria y en igualdad de condiciones de las mujeres de las AIOC en la conformación de sus gobiernos autónomos. Se hizo énfasis en la importancia de cumplir el principio de paridad establecido en sus estatutos.

#### b) Acompañamiento al proceso de constitución de los GAIOC de Raqaypampa y Uru Chipaya

Se acompañaron los procesos electorarios de Raqaypampa y Uru Chipaya:

- ✓ En Raqaypampa primero se llevó a cabo una etapa de preselección de candidaturas al Consejo de Gestión Territorial; en este proceso se advirtió la participación limitada de las mujeres por lo que se desarrolló una estrategia comunicacional que implicó la difusión de artículos específicos de representación paritaria en la conformación del gobierno AIOC y la promoción de la participación de las mujeres. Los resultados de esta estrategia fueron muy importantes, ya que participaron un número significativo de mujeres en la elección de autoridades de GAIOC en Raqaypampa.

- ✓ En Uru Chipaya se dio mayor presencia de las mujeres en los procesos electorales porque antes de estos procesos se llevaron adelante talleres de socialización del Estatuto y del Reglamento, donde se enfatizó en la importancia de la participación de las mujeres en las elecciones.

**c) Fortalecimiento de la actoría política de las mujeres en la gestión de las autonomías indígenas.**

- ✓ Para fortalecer la participación de las mujeres en la gestión de la AIOC y fortalecer la actoría de las autoridades mujeres, se desarrollaron talleres sobre estatutos, atribuciones de las autoridades y agenda de las mujeres, mediante metodologías que permitieron espacios de reflexión sobre la importancia de la participación de las mujeres en todas las etapas del proceso autonómico, incluida la implementación del autogobierno IOC.
- ✓ En Raqaypampa se identificó la necesidad de fortalecer las organizaciones de mujeres en las subcentrales de Molinero, Salvia y Laguna y el interés de las mujeres de formar parte protagónica de los espacios de toma de decisiones. En lo relativo a Uru Chipaya, se trabajó con lideresas y autoridades originarias, estos espacios sirvieron para facilitar la identificación de demandas y propuestas para fortalecer la participación de las mujeres en el marco de su normativa interna.

A continuación se presentan cuadros que reflejan resultados cuantitativos en los procesos de acompañamiento:

**Cuadro. 7. Realización de talleres**

AIOC	Talleres	Cantidad	Subcentral o Ayllu	Participantes	
				mujeres	Hombres
Raqaypampa	Taller con organizaciones de mujeres Subcentral Raqaypampa. Difusión y Profundización del EAIOCR, el Reglamento, y la importancia de la participación de mujeres en la conformación de autogobierno de la AIOC.	1	Raqaypampa	50	1
	Talleres de difusión y Profundización del EAIOR, y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres hacia la Gestión Territorial.	3	Laguna	65	25
			Santiago	79	11
			Salvia	37	15
Uru Chipaya	Taller de socialización del Estatuto y del Reglamento de Uru Chipaya con mujeres del Ayllu Ayparavi.	1	Ayparavi	22	28
	Taller de fortalecimiento de la actoría política de las mujeres en el autogobierno de la AIOC Uru Chipaya hacia la gestión territorial.	1	Taller con los cuatro Ayllus	46	13

Fuente: Elaboración propia

**d) Consultorías**

En relación a las consultorías, para los dos procesos de acompañamiento y fortalecimiento a la participación de las mujeres IOC se contrató los servicios de dos consultoras.

**Cuadro 8. Consultorías**

AIOC	Responsable	Consultoría	Fechas	Estado
Raqaypampa	Rosmery Pizarro Jarro	"Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa"	Julio a Agosto /2017	Se entregaron 2 de 3 productos
Uru Chipaya	Cecilia Vargas Choquemita	"Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Uru Chipaya"	Junio a Sept/2017	Ya se entregaron los 3 productos. Aún falta aprobación

Fuente: Elaboración propia

**3.4. Actividad 4, Gestión del conocimiento**

Las AIOC se desarrollan en el marco de la construcción del Estado Plurinacional y el reconocimiento de los derechos colectivos. Por tanto, esta actividad emerge ante la necesidad de sistematizar en una base de datos las acciones desarrolladas por las autonomías, en el marco a su participación política y el ejercicio de la democracia comunitaria. Asimismo, la actividad contempla el desarrollo del archivo físico y digital de los procesos de la AIOC y la generación de productos comunicacionales con enfoque intercultural. En el siguiente cuadro se presenta el estado de situación por actividad.

**Cuadro 9. Estado de situación por actividad**

Actividad	Avances/ situación
Se cuenta con una base de datos sistemática sobre participación política y democracia comunitaria de NyPIOC.	<b>En proceso</b> de contratación de personal (se publicaron TDR)
Se cuenta con un archivo físico y digital de todos los procesos AIOC en etapa de acceso, constitución y funcionamiento como GAIOC.	<b>En proceso</b> de contratación de personal (se publicaron TDR)
Se cuenta con productos comunicacionales de documentos y debate público	Consultoría en elaboración de documental AIOC Uru Chipaya <b>en proceso</b> .  Consultoría en elaboración de documental AIOC Charagua Iyambae. Prevista para la gestión 2018. Se prevé la realización y difusión de cuñas radiales y de un ciclo de cine AIOC.
Productos comunicacionales, afiches, cartillas, etc.	Se tiene prevista la edición de cartillas de los estatutos de las autonomías Uru Chipaya, Charagua Iyambae y Raqaypampa.

Fuente: Elaboración propia

**3.5. Gerencia del proyecto**

Desde marzo a julio de 2017 el proyecto contó con la coordinación de la profesional Magaly Gutiérrez, quien renunció al cargo.

**4. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

El presupuesto asignado al proyecto es de USD 200.000, de los cuales a la fecha se ha ejecutado aproximadamente USD 88.000, un 44%, quedando un saldo de USD 112.000.

**Cuadro 10. Avance de ejecución presupuestaria**

Actividad	Resultado	Presup. Planific. USD	Presup. Ejecut. USD	Presup. comprom. USD	Ejecutado + comprom. USD	% de ejec.	Saldo
Actividad 1: Acompañamiento y supervisión proceso AIOC	El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos	59.986	35.817	11.468	47.285	78,83%	12.701
Actividad 2: Gestión del proceso AIOC	El TSE a través de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC	19.393	0	0	0	0,00%	19.393
Actividad 3: Participación mujeres indígenas	Género: El TSE cuenta con metodologías para la participación política d mujeres indígenas en las AIOC	59.868	7.663	9.493	17.156	28,66%	42.712
Actividad 4: Gestión del conocimiento	Gestión del conocimiento	30.128	220	13.820	14.040	46,60%	16.088
Actividad 5: Gerencia Del Proyecto	Gerencia del Proyecto	30.624	9.496	0	9.496	0	21.128
<b>TOTAL USD.</b>		<b>200.000</b>	<b>53.196</b>	<b>34.782</b>	<b>87.978</b>	<b>43,99%</b>	<b>112.022</b>
<b>TOTAL Bs.</b>		<b>1.382.000</b>	<b>367.584</b>	<b>240.341</b>	<b>607.925</b>	<b>43,99%</b>	<b>774.075</b>

Fuente: Álvaro Moscoso, administrador de proyectos PNUD, en base al Reporte Project Budget Balance (Detail level).

## 5. CONCLUSIONES

El Órgano Electoral Plurinacional, en el marco del proceso de construcción de Estado Plurinacional, orienta sus acciones hacia el fortalecimiento de la democracia intercultural, la cual contempla la garantía y la viabilidad del ejercicio de la democracia comunitaria y su libre determinación expresada en las Autonomías Indígenas Originaria Campesinas. Es en este sentido que, a partir de la presente gestión, asumió el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades institucionales del TSE – OEP para el acompañamiento a procesos de democracia en AIOC y democracia paritaria", el que pretende potenciar las capacidades institucionales del Órgano Electoral Plurinacional para: i) el acompañamiento a los procesos de AIOC y la mejora de las condiciones de participación política de las mujeres en estas instancias, dentro de las normas y procedimientos propios que forman parte de la democracia comunitaria y la paridad democrática. Con este preámbulo, a continuación se describe las principales conclusiones a las que se arriba tras el período de ejecución del proyecto:

- ✓ El proyecto fue diseñado para su implementación en un tiempo de 11 meses, de febrero a diciembre de 2017, quedando un total de cinco (5) meses para el cierre de las actividades.

- ✓ De los 5 resultados planteados, uno ha tenido un avance significativo, la **Actividad 1. Acompañamiento y supervisión proceso AIOC, la cual reporta un 71 % aproximado de avance.** Este proceso estaba orientado principalmente a la consolidación de los gobiernos de las AIOC de Uru Chipaya y Raqaypampa.
- ✓ En cuanto a la ejecución presupuestaria, hasta septiembre de 2017, la misma reporta un porcentaje aproximado del 44 % de avance, siendo la Actividad 1: acompañamiento y supervisión del proceso AIOC, la de mayor ejecución con 67%, del total del monto programado. Las otras dos actividades que demuestran avance presupuestario son: Actividad 5: Gerencia del proyecto, con el 30% y Actividad 3: Participación mujeres indígenas, con el 12%; si bien la Actividad 4: Gestión del conocimiento, no reporta gasto, esto se debe a que se encuentra en proceso administrativo de adjudicación; mientras que el inicio de la Actividad 2: Gestión del proceso AIOC, desde su programación, queda sujeto a la conclusión de acciones de las actividades 1 y 2 (AIOC y Género, respectivamente).
- ✓ El proyecto ha contribuido significativamente en el proceso de construcción de las AIOC de Raqaypampa, Uru Chipaya y Charagua Iyambae, que se encuentran en proceso de institucionalización, con importantes lecciones aprendidas que serán volcadas a la experiencia y gestión de los procesos AIOC en marcha. Además, cada acción emprendida en el proyecto ha coadyuvado a generar nuevas perspectivas y estrategias en el ejercicio de las competencias del OEP para el fortalecimiento de la democracia comunitaria.
- ✓ Asimismo, los insumos analíticos que se han ido generando a la fecha han servido para un marco mayor de reflexión de las implicancias de la democracia comunitaria en la necesaria transformación de las estructuras estatales, no sólo desde las bases normativas sino ante todo desde la práctica y gestión estatales, así como las maneras procedimentales que aún están sujetas a lógicas no propicias del horizonte de lo plurinacional y pluricultural.
- ✓ Como contraparte nacional del proyecto, y dentro del marco del plan estratégico del TSE, se ha contribuido con recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de todas las actividades.
- ✓ Comprender también que este proyecto se inscribe en un ámbito mayor de esfuerzo y mandato institucionales del OEP que ha fijado lineamientos claros para fortalecer las tres democracias, desde la paridad democrática, en el horizonte de la demodiversidad, enmarcados en los lineamientos de la Agenda Patriótica.
- ✓ Finalmente, se debe mencionar que el proyecto se encuentra en el área de interculturalidad de la agenda programática del PNUD y contribuye al objetivo de desarrollo sostenible 16 que promueve la inclusión y la justicia social, asimismo.

## 6. RECOMENDACIONES

Con la finalidad de darle continuidad a la implementación del proyecto se recomienda tomar en cuenta las siguientes acciones:

- a) Ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta **el mes de junio de 2018.** Esto permitirá al Órgano Electoral Plurinacional cumplir con los objetivos y alcances



planteados en el mismo, teniendo en cuenta que la construcción de la Autonomía Indígena es un proceso que lleva tiempo, ya que es imprescindible garantizar la participación activa y directa de los pueblos indígenas en la conformación de sus gobiernos según sus normas y procedimientos propios; considerando, además, que en la actualidad el OEP se encuentra administrando el proceso de elección de las altas autoridades de Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

- b) Reforzar el estrecho seguimiento al cumplimiento técnico y administrativo, a fin de concluir en los plazos previstos y con los productos y resultados esperados, bajo la coordinación de un o una responsable específica del proyecto y los consiguientes apoyos técnicos.
- c) Ajustar las acciones orientados al fortalecimiento de la democracia comunitaria, ampliando su alcance hacia las AIOC en proceso de construcción.
- d) Coordinar actividades conjuntas en el marco del proyecto BOL/94339 "Fortalecimiento del Estado Plurinacional Autonomico y la Democracia Intercultural" del PNUD, especialmente en los encuentros internacionales, conversatorios y otros espacios de diálogo y/o acción.
- e) Finalmente, se recomienda la ampliación de la ruta crítica del proyecto en el marco de la matriz adjunta en el Anexo 1.

## 7. DESAFIOS

En el marco de los procesos que hasta ahora se han desarrollado con el respectivo acompañamiento del OEP a los procesos AIOC, han emergido nuevas experiencias y necesidades que hacen imperioso el seguir profundizando sobre los roles institucionales, los ajustes normativos en los distintos niveles de Estado (desde el central hasta los recientes GAIOC) que merecen atención en esta etapa del proyecto y más allá de él. Estos se refieren a:

- a) Definir el rol del Órgano Electoral Plurinacional en procesos electorales de los GAIOC, establecidos por normas y procedimientos propios, a partir de las experiencias ya desarrolladas.
- b) Constituir al Órgano Electoral Plurinacional en un referente institucional en el acompañamiento en los procesos de construcción y constitución de las AIOC en el país y de la democracia comunitaria en particular.
- c) Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional entre Órgano Electoral Plurinacional y los GAIOC, en torno a la transparencia para fortalecer capacidades, en el marco de la democracia intercultural y paritaria.
- d) Fortalecer las capacidades de las servidoras y los servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional en procesos autonómicos IOC.

- e) Establecer y fortalecer procesos de información a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos respecto al ejercicio de las democracias comunitarias, en el marco de los procesos de Autonomía Indígena Originaria Campesina.
- f) Visibilizar y difundir los procesos de AIOC en múltiples escenarios y actores, con diversos recursos didácticos, audiovisuales y periodísticos para sensibilizar y concienciar sobre las particularidades del proceso boliviano y la construcción de un Estado plurinacional.
- g) Difundir y compartir las experiencias AIOC, además de las prácticas institucionales del OEP al respecto, en otras instancias y espacios regionales e internacionales a fin de generar diálogos y rescatar buenas prácticas en casos próximos a estos.

## 8. ANEXOS

### 8.1. Anexo 1. Propuesta de planificación segundo semestre AIOC

Resultados	Actividades Indicativas	Actividades	Descripción	Canti- dad	Costo unitario	Total	Plazo												Responsable	Observaciones
							9	10	11	12	01	02	03	04	05	06				
El TSE cuenta con instrumentos conceptuales normativos y procedimientos, para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y sus gobiernos	Desarrollo de insumos y adecuación para normativa específica del proceso AIOC en sus distintas etapas	Se cuenta con tres propuestas con insumos normativos construidos participativamente con los GAIOC, articulado al plan Charagua y Planes para Uru Chipaya y Raqaypampa.	Taller territorial - Charagua Iyambae Validación de norma electoral, nivel AIOC	1	20000	20000	x	x										José Ledezma	Realizado	
			Taller territorial - Uru Chipaya Mesa técnica	1	4000	4000		x										Paulino Guarachi - Miguel Vargas	Se realizará 6 de octubre	
			Taller LOP - AIOC Mesa técnica	1	7000	7000	x											Investigación	Realizado con rendición de cuentas.	
			Taller LOP - AIOC Mesa técnica	1	10000	10000	x											Investigación	Realizado con rendición de cuentas	
			Taller CAIB - AIOC 2 días de duración (30 personas)	1	30369	30369		x										OAS - Comunicación	Lugar de realización Cochabamba	
			Intercambio de experiencias entre autoridades AIOC Charagua Iyambae, Raqaypampa, Uru Chipaya, Gutierrez, Yuracaré, Tim 1, Lomerío, Corque y otros - Cochabamba. (2 día)	2	35305	70610						x						Benedicto Karen	Se cuenta con metodología	
			Consultoría por producto - Sistematización de la información producida en el proceso de la construcción de la AIOC de Charagua Iyambae.	1	8500	8500							x					OAS	En base a información documental y audiovisual	
			Edición de video Charagua Iyambae	1	34500	34500							x	x	x			Comunicación	con TDR	
			Otra actividad	9	10000	90000								x				OAS		
			Reunión técnica para intercambio de criterios sobre consultoría Consulta Previa.	1	2000	2000	x											Miguel Suárez	En el marco de la consultoría de Miguel Suárez, para la reflexión sobre el avance de	

Resultados	Actividades indicativas	Actividades	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Total	Plazo										Responsable	Observaciones
							9	10	11	12	01	02	03	04	05	06		
		en AIOC, en el caso Charagua																esta consultoría.
			Taller territorial - Charagua Iyambae Conversatorio a nivel nacional con especialistas - Santa Cruz.	1	10000	10000						x					OAS	
			Taller territorial - Charagua Iyambae (consulta previa)	2	8000	16000		x									Miguel Suárez	
		Se cuenta con un documento sobre el sistema de gobierno y la democracia comunitaria en el proceso AIOC con base en el análisis comparado de los estatutos autonómicos y las Declaraciones de constitucionalidad en seis casos: Charagua, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totora Marka, Huacaya y Lomerío.	Consultoría por producto "Análisis de estatutos y declaración de constitucional, de los modelos de los Gobiernos Autónomos de Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa"	4	8700	34800						x	x	x	x			
		Se cuenta con propuestas para el desarrollo normativo de las GAIOC de Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa en el ámbito del autogobierno para el ejercicio de las democracias.																
			Sub-total			337779												

Resultados	Actividades indicativas	Actividades	Descripción	Canti- dad	Costo unitario	Total	Plazo												Responsable	Observaciones	
							9	10	11	12	01	02	03	04	05	06					
ACTIVIDAD 2. GESTIÓN DEL PROCESO AIOC																					
El TSE a través de los Tribunales Electoral Departmentales (TED) ha fortalecido sus capacidades para la gestión del proceso AIOC y los derechos de las mujeres IOC.	Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades del personal de los TEDs y el TSE, en los nueve departamentos.	Se cuenta con un documento sistematizado de los nueve talleres internos en los TED sobre democracia intercultural y paritaria. En base a notas conceptuales generadas por el TSE.	Taller TED - Santa Cruz	1	5425	5425								x					Siguiendo los acuerdos arribados en la reunión técnica entre SIFDE-PNUD, se vio por conveniente que los talleres planificados se realicen en los cuatro departamentos donde se siguen procesos de GAIOC.		
			Taller TED - Cochabamba	1	3763	3763									x						
			Taller TED - Oruro	1	2713	2713									x						
			Taller TED - Chuquisaca	1	4813	4813									x						
Sub-total						16714															
ACTIVIDAD 1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO																					
Gestión del conocimiento	Desarrollo de un sistema de información integral sobre el proceso de implementación de la AIOC (avances, normas, procedimientos propios, base de datos, archivo físico y digital).	Se cuenta con una base de datos sistemática sobre participación política y democracia comunitaria de NyPIOC	Indicadores de participación política (Sección de investigación)	1	21000	21000	x	x											Investigación	Adjudicada	
				1	28000	28000	x	x							x				Investigación	Adjudicada	
				1	24000	24000	x	x							x					Investigación	Adjudicada
				1	24000	24000	x	x										x			Investigación

Resultados	Actividades indicativas	Actividades	Descripción	Canti- dad	Costo unitario	Total	Plazo												Responsable	Observaciones
							9	10	11	12	01	02	03	04	05	06				
	Desarrollo de productos comunicacionales con enfoque intercultural	Se cuenta con productos comunicacionales de documentos y debate publico	Consultoría por producto "Didactizador/a del contenido de los estatutos autonómicos de Charagua Iyambae, Raqaypampa y Uru Chipaya"	1	17000	17000	x	x										OAS		
			Consultoría por producto "Ilustrador/a del contenido de los estatutos autonómicos de Charagua Iyambae, Raqaypampa y Uru Chipaya"	1	10000	10000	x												OAS	
	Productos comunicacionales, afiches, cartillas, etc.	Cartilla estatuto Charagua Iyambae	4000	4	16000			x										Karen	Con TDR, plan de distribución	
		Cartilla estatuto Uru Chipaya	500	4	2000			x										Karen	Con TDR, plan de distribución	
		Cartilla estatuto Raqaypampa	1000	4	4000			x										Karen	Con TDR, plan de distribución	
		Estatuto - Charagua Iyambae	5000	4	20000			x												
		Estatuto - Raqaypampa	1000	4	4000			x												
		Estatuto - Uru Chipaya	500	4	2000			x												
		Elaboración de microprogramas radiofónicos sobre AIOC, en 4 idiomas.	4	1500	6000	x											OAS - comunicación	Con TDR		
		Difusión de cuñas radiales	1	44278	44278	x		x									OAS	Con recursos con POA y PNUD		
					222278															
		Sub-total																		
		AGENCIA DE GERENCIA DEL PROYECTO																		
Gerencia del Proyecto			Gerencia del proyecto	2,4	10000	24000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			Apoyo logístico a implementación del proyecto	3	8190	24570	x	x	x									OAS	con TDR para 2,5 meses (hasta 31 diciembre)	
Sub-total																				
Total																				

Saldo por ejecutar AIOC y Gerencia del proyecto: Bs. 625.341

## 8.2. Anexo 1-A. Propuesta de planificación segundo semestre - Género

Área	Actividad	Cantidad	Costo unitario	Total	Cronograma												Responsable	Observaciones
					09	10	11	12	01	02	03	04	05	06				
Consultorías	Consultoría por Producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres hacia el proceso de gestión de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae".	1	7.000	7.000		X	X									Unidad de Género	En proceso de contratación (TDR publicados) hasta 25/agosto.	
	Estudio de investigación sobre la participación política de las mujeres en la "Autonomía Guaraní Charagua Iyambae".	1	21.000	21.000		X	X	X								Unidad de Género	En proceso de contratación (TDR publicados) hasta 31/agosto.	
	Servicio de producción de un video documental sobre la participación política de las mujeres Indígena Originaria Campesinas - IOC en los procesos autonómicos de conformación de sus Autogobiernos IOC.	1	54.500	54.500		X	X	X								Unidad de Género	Adquisiciones de PNUD.	
	Consultoría por Producto: Facilitadora Encuentro Nacional de intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre construcción de AIOC (Cochabamba).	1	4000	4000		X	X									Unidad de Género	TDR en revisión	
	Consultoría por producto: Facilitadora para 2 diálogos interculturales con mujeres indígenas sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y hombres de las NyPIOC (La Paz y Santa Cruz).	1	4000	4000		X	X									Unidad de Género	Con TDR	
	Consultoría por producto: 2 diálogos interculturales departamentales sobre democracia paritaria.	2	2.000	4.000		X	X	X								Unidad de Género	Con TDR	
	Consultoría por producto: Sistematización del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la actoría política de mujeres AIOC, y de los procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre democracia paritaria e intercultural.	1	25.569	25.569		X	X	X								Unidad de Género	TDR en revisión	
	Consultoría técnica para procesos y apoyo logístico.	1	26.960	26.960		X	X	X								Unidad de Género	TDR en revisión	
	Sub-total				147.029													
Talleres y diálogos interculturales	Encuentro Nacional de intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre construcción de AIOC (Cochabamba).	1	90.516	90.516		X	X									Unidad de Género	Fecha compatible con la agenda de la Presidencia y vocales	
	Talleres "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres hacia el proceso de gestión de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae"	1	8000	8.000		X	X									Unidad de Género	La sistematizadora participa de los eventos para recojo de insumos.	
	Diálogo intercultural con mujeres indígenas sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y hombres de las NyPIOC (La Paz)	1	28.272	28.272		X	X									Unidad de Género		

Área	Actividad	Cantidad	Costo unitario	Total	Cronograma												Responsable	Observaciones
					09	10	11	12	01	02	03	04	05	06				
ACTIVIDAD 3: GÉNERO	Diálogo intercultural con mujeres indígenas sobre democracia paritaria y las nociones de equidad entre mujeres y hombres de las NyPIOC (Santa Cruz)	1	25.772	25.772		X	X									Unidad de Género		
	Conversatorio con diversas actoras sobre democracia paritaria y las nociones de la equivalencia entre mujeres y hombres IOC en Cochabamba.	1	15.088	15.088			X	X	X							Unidad de Género		
	Conversatorio con diversas actoras sobre democracia paritaria y las nociones de la equivalencia entre mujeres y hombres IOC en Tarija.	1	11.945	11.945			X	X	X							Unidad de Género		
	Sub-total			179.593														
Material Impreso	Documento de sistematización del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de la actoría política de mujeres AIOC, y de los procesos de diálogos interculturales para la construcción de contenidos sobre democracia paritaria.	500		10.000					X							Unidad de Género		
	Banner para el encuentro: Diálogos interculturales sobre democracia paritaria y las nociones de la equivalencia entre mujeres y hombres IOC	1	500	500			X									Unidad de Género		
Material para participantes	Material para participantes	350	100	1.866		X	X	X										
	Sub-total			12.366														
TOTAL MONTO ESTIMADO POR EJECUTAR EN BOLIVIANOS				338.988														



### 8.3. Anexo 2. Estado de situación de las consultorías AIOC

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
José Ledezma	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Charagua Iyambae.	<b>Monto total del contrato</b> 34.500,00	<b>Primer producto:</b> Informe de acompañamiento sobre procesos de elaboración del régimen electoral de la Autonomía Guarani Charagua Iyambae. (Incluye la Propuesta de Ley del Régimen Electoral de Charagua Iyambae).	14-Jul-17	<p>1.- En ajuste primer producto, se cuenta con proyecto de Ley electoral que incluye el rol y momentos de participación del OEP</p> <p>2.- se ha revisado su propuesta y en una conversación con él se ha sugerido que la pérdida de mandato (revocatoria de mandato) debería estar incluida en la ley del régimen electoral, así como definir la participación en consulta, cruzar con la consultoría de consulta, para que estén algunas líneas de marco normativo el rol del TSE o en qué momento interviene. De manera extra se pendo también poder realizar una publicación sobre la construcción de la ley del régimen electoral. (<i>Coordinación - Magaly Gutierrez</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El informe describe de forma amplia el proceso de constitución del GAIOC y de elaboración del régimen electoral, cuenta con:</li> <li>• Antecedentes generales de la AIOC Charagua Iyambae</li> <li>• Facultades de la Estructura de Gobierno de la AIOC Charagua Iyambae.</li> <li>• Agenda de Trabajo del Nemboati Guasu.</li> <li>• Articulación de la Consultoría a la Agenda de Trabajo del Nemboati Guasu.</li> <li>• Actividades de acompañamiento sobre procesos de elaboración del régimen electoral de la AIOC Charagua Iyambae.</li> <li>• Explicación Descriptiva del Desarrollo Normativo de la Ley Electoral (contenido de la ley).</li> <li>• Actividades pendientes para la conclusión de la Ley Electoral.</li> <li>• Como anexos presenta: Acta de Asamblea del Nemboati Guasu de fechas 9 y 10 de mayo de 2017; Acta de Asamblea del Nemboati Guasu de fechas 30 y 31 de mayo de 2017.</li> <li>• Asimismo, envía el Proyecto de Ley Autonómica Electoral (borrador de 53 artículos).</li> </ul>	Se procedió a la cancelación del primer pago.

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
Clemente Salazar	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Raqaypampa.	Fecha de firma de contrato 15-May-17	Segundo producto: Documento de sistematización de los procesos de ejercicio de la democracia comunitaria en las zonas de las capitánías de Charagua Norte, Alto Isozo, Bajo Isozo, Parapitiguasu y las zonas de Charagua Pueblo y Charagua Estación. (Memorias de eventos de capacitación sobre democracia comunitaria).	23-Aug-17	El segundo informe de consultoría realiza una descripción a detalle de los procesos de Democracia Comunitaria antes y durante el proceso de consolidación de la AIOC. <ul style="list-style-type: none"> <li>Incorpora una descripción del contexto histórico, partiendo de la cultura y cosmovisión;</li> <li>Desarrolla el sistema político, por períodos;</li> <li>Detalla y analiza la institucionalidad política actual, en los aspectos técnicos, normativos, organizacionales, por niveles;</li> <li>Describe el proceso de constitución de la AIOC por etapas;</li> <li>Realiza un análisis de la incorporación de procedimientos propios en la elección de autoridades (GAIOC), en el marco a los procedimientos, formas, supervisión, composición de los órganos de gobierno, período de mandato, requisitos y actores.</li> </ul> Con referencia a las memorias de los eventos de capacitación, la realización de los mismos iniciará el mes de septiembre.	El informe en general contempla la sistematización y análisis de los procesos de ejercicio de la democracia comunitaria e intercultural en la NyPIOC Charagua Iyambae, siguiendo el requisito de cumplimiento de segundo producto de consultoría.
		Fecha final de contrato 11-Nov-17	Tercer producto: Propuesta de insumos normativos y procedimentales para observar, acompañar y supervisar los procesos de AIOC y el gobierno de Charagua Iyambae e informe final del proceso de acompañamiento.	11-Nov-17		
		Monto total del contrato 17.900,00	Primer producto: Primera sistematización general y/o registro del proceso de construcción de la AIOC y su reconstitución territorial.	12-Jun-17	1.- Entregó su primer producto, se procedió al primer pago. (Coordinación - Magaly Gutierrez)	Se procedió a la cancelación al primer pago.
		Fecha de firma de contrato 8-May-17	Segundo producto: Segunda Sistematización general y/o registro del proceso de construcción de la AIOC y su reconstitución territorial.	7-Jul-17	2.- Entrego con retrasos su segundo y tercer producto, es necesario complementar información de sus informes. Entregó producto a coordinación. (Coordinación - Magaly Gutierrez)	Se procedió a la cancelación del segundo pago.
		Fecha final de contrato 5-Sep-17	Tercer producto: Documento de análisis de evaluación de la elección de sus autoridades, democracia comunitaria.	6-Aug-17	Entregó producto a coordinación.	Se procedió a la cancelación del tercer pago.

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
Paulino Guarachi	Consultoría por producto para la facilitación de instrumentos conceptuales y normativos y procedimentales, para observar, acompañar y supervisar el proceso de AIOC y el gobierno de Uru Chipaya.	Monto total del contrato 18.100,00	Cuarto producto: informe final de acompañamiento al proceso de conformación de la GAIOC Raqaypampa, incluye la sistematización sobre la nación Raqaypampa y el proceso de construcción de la AIOC.	5-Sep-17		
			Primer producto: Recopilación de los insumos para el Reglamento de elección y conformación de la GAIOC de Uru Chipaya.	8-Jul-17	1.- Preparando 1er producto (8/7/17), rol de acompañamiento a elecciones del 14 al 17 de julio, tras la conclusión de talleres de socialización del reglamento electoral en los 4 ayllus.  2.- Ha entregado su segundo producto, donde hace un profundo análisis evaluación de la elección de sus autoridades, en el marco de la democracia comunitaria. (Coordinación - Magaly Gutierrez)	Se procedió a la cancelación del primer pago
		Fecha de firma de contrato 9-May-17	Segundo producto: Documento de análisis evaluación de la elección de sus autoridades, democracia.	07-aug-17	Entrega de producto denominado "Elección de autoridades del nuevo Gobierno de la Autonomía Originaria de la Nación Uru Chipaya", contiene:  Antecedentes que describen el proceso de la AIOC y de la GTI.  Describe de forma detallada los procesos de definición del calendario electoral.  Conformación de Laymis Parla  Elección de Tantiñi Layminaka Mä Eph Por ayllus (Manazaya, Wistrullani, Parla, Ayparavi y Aranzaya)  Elección del CAIOC - CHAWKH PARLA URU CHIPAYA.  Conformación y detalle de las autoridades.  Finalmente realiza un análisis sobre la paridad y alternancia de género.  Observaciones: El producto es un documento valioso de descripción del proceso de conformación del GAIOC, a detalle. En la parte final, conclusiones, realizar un análisis a la participación de mujeres. Sin embargo y como el investigador señala al final del documento "El tercer producto será un documento analítico del proceso autonómico y proceso de elección de autoridades del nuevo gobierno de la autonomía originaria de la nación Uru Chipaya" el presente informe respondería al tercer producto (final) y estaríamos a la espera del segundo producto "Documento de	Se procedió a la cancelación del segundo pago

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
			<p>Fecha final de contrato 6-Sep-17</p> <p>Tercer producto: informe final de acompañamiento al proceso de conformación de la GAIOC Uru Chipaya, incluye la sistematización sobre la nación Uru Chipaya y el proceso de construcción de la AIOC.</p>	6-Sep-17	análisis evaluación de la elección de sus autoridades, democracia". Por tanto, se debe viabilizar el pago.	
Gonzalo Vargas Rivas	Consultoría por Producto, "Análisis de competencias y atribuciones articuladas a los órganos de gobierno de las AIOC Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totora Marka, Huacaya y Lomerío, en el marco de sus Estatutos (GTI - GAIOC) y los niveles de relacionamiento con el OEP - TSE". (Incluye presentación ejecutiva y ppt.)	<p>Monto total del contrato 9.980,00</p> <p>Fecha de firma de contrato</p> <p>Fecha final de contrato 10-Jun-17</p>	Documento "Análisis competencial, de atribuciones articuladas a los órganos de gobierno de las AIOC Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raqaypampa, Totora Marka, Huacaya y Lomerío, en el marco de sus Estatutos (GTI - GAIOC) y los niveles de relacionamiento con el OEP - TSE". (Incluye presentación ejecutiva y ppt.)	10-Jun-17	<p>El objetivo de la consultoría, no se ha podido conseguir del todo, se tiene una aproximación descriptiva, la cual se constituye en un aporte sustancial en el reconocimiento de las condiciones de ejercicio de los gobiernos indígenas bajo modalidad AIOC.</p> <p>Ingresar con el análisis sobre la AIOC Charagua; Desarrolla la gestión pública y gestión territorial indígena, abarcando el desarrollo de la normativa propia para fortalecer la GTI, así como la entidad gubernativa, organización y visión de desarrollo desde las naciones y pueblos indígenas.</p> <p>Realiza un análisis de las visiones de desarrollo comparativo de las seis AIOC, concluyendo que el desafío está en la no mecanización de las atribuciones y funciones.</p> <p>Plantea una aproximación al Sistema de gobierno propio y la democracia comunitaria: una ruta compleja entre tensiones y avances. Cuyo análisis contiene, muchos elementos de la consolidación de las estructuras institucionales internas pero no llega a aterrizar en los elementos de la democracia comunitaria vinculadas con las competencias en materia electoral como GAIOC. Sin embargo, el contenido siguiente, es amplio y de riqueza descriptiva para conocer la institucionalidad que envuelve a las GAIOC.</p> <p>Tiene un acápite sobre "el largo y tortuoso camino a las AIOC", concentrando su análisis en: Procedimentalismo y libre determinación, como cuestionante al cumplimiento de requisitos y etapas para la constitución de AIOC y su gestión; El OEP y la Democracia Comunitaria, donde se hace una descripción de los articulados que refuerzan el mandato del OEP al respecto a los procedimientos propios de NPIOC; Sobre posición de la democracia representativa liberal, sobre la democracia comunitaria. Remarcando la transgresión a la CPE cuando se hace referendos</p>	Se procedió al pago.

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
					<p>de acceso a AIOC y el cruce con elecciones municipales mientras el Estatuto que da lugar a un nuevo sistema de gobierno local no es aprobado.</p> <p>En el marco de las conclusiones resalta: La necesidad de adecuar instrumentos para la administración de una gestión pública en AIOC; La urgencia de articular la GTI y el desarrollo económico plural; La tensión entre la reconstitución territorial ancestral como derecho constitucional y la influencia liberal en la división político-administrativa, además de las reconfiguraciones y convivencias con población no indígena; La positivización de procedimiento para el ejercicio de la Democracia Comunitaria que es superado por las dinámicas prácticas orales; Desafíos para el ejercicio de la democracia comunitaria en Charagua.</p> <p>Plantea como recomendaciones: Garantizar mecanismos de participación IOC en otras instancias/órganos de gobierno; Democracia comunitaria como parte del pluralismo jurídico; Valoración de la normativa generada de forma oral; Generar metodologías adecuadas al contexto de pueblos indígenas de parte del SIFDE para el proceso de elección de las GAIOC;</p> <p>Reconocimiento de las equivalencias de instancias deliberativas AIOC; Reconocimiento de la elección de autoridades transitorias por normas y procedimientos propios. (Elizabeth Huanca)</p>	
Alfonso Antonio Gumucio Dagrón	Video documental del proceso de constitución de la Autonomía Indígena Originario de Uru Chipaya	Monto total del contrato 54.500,00	Primer Producto: Diseño del proyecto para la realización del documental, que incluya el planteamiento de la estructura del mismo.	14-Aug-17	<p>El diseño del proyecto para la realización del documental, plantea el registro de manera testimonial del proceso de democracia comunitaria, para el caso Uru Chipaya, a través de la descripción de las diferentes etapas que culminan en la elección de las autoridades; en el marco al cumplimiento de los estándares de calidad, imagen y sonido para su difusión en distintos espacios públicos no comerciales.</p> <p>En el marco al planteamiento y concepción, se plantea un material ágil y atractivo, de carácter testimonial, con un enfoque que no solamente se concentre en la mecánica Electoral, y sus actores; sino también en las condiciones de vida cotidiana, en el entorno geográfico y en las aspiraciones de la Nación Uru Chipaya.</p> <p>Propone de forma interesante una primera fase en la que se registrarán todas las etapas del proceso autonómico, incluyendo la socialización del Estatuto en los cuatro ayllus (Aransaya, Manasaya, Wistrullani y Ayparavi);</p>	El informe cuenta con todos los requisitos estipulados en los TDR, por tanto se solicitó proseguir con la cancelación del primer pago.

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
					<p>Las elecciones de nuevos dirigentes en cada Ayllu Uru Chipaya, y la elección general en el Chawk Parla de la dirigencia que tendrá bajo su responsabilidad el gobierno autonómico.</p> <p>Asimismo, plantea la incorporación de procesos en los que se involucre el OEP y la contextualización geográfica de la región, en el marco a la GTI.</p> <p>En la estructura se plantea la descripción de las etapas en orden cronológico, con entrevistas breves, imágenes clave que ayuden a la comprensión visual, evitando la voz en off de carácter institucional que dañaría la calidad testimonial.</p> <p>Incorpora el uso de la lengua originaria (materna) en mujeres, principalmente.</p> <p>Contempla de la valoración del rol o participación política de las mujeres, jóvenes en el proceso de GAIOC.</p> <p>Plantea la consideración de entrevistas a personajes de la película vuelve Sebastiana (orientada a comparar temporalidades). También contempla la incorporación de percepciones de autoridades de otros NyPIOC (Charagua y Raqaypampa) que han atravesado procesos similares y otros que inician el rumbo; Y de autoridades del TSE y del TED Oruro (vocales).</p>	
		<p><b>Fecha de firma de contrato 4-Aug-17</b></p>	<p><b>Segundo Producto:</b> Registro de imágenes, entrevistas a actores claves de la autonomía de Uru Chipaya en su idioma originario, en fechas establecidas por las autoridades de Uru Chipaya y del OEP. El material recolectado debe ser entregado en digital junto a un informe donde se detalle el trabajo realizado.</p>	3-Oct-17		

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
Epifanio Campos Cordero		Fecha final de contrato 2-Dec-17	Tercer Producto: Estructura general del documental, presentación de los guiones técnico y narrativo. La estructura debe ser planteada con un enfoque de género y generacional; en el idioma originario de Uru Chipaya con su respectiva traducción subtitulada en español, y debe incluir el lenguaje de señas. El material debe ser entregado en 2 CD con los guiones aprobados.	2-Nov-17		
			Cuarto Producto: Documental aprobado por el SIFDE más informe final de la realización del documental, con 10 DVD del material en formato para cine (4K), 10 DVD con el documental, en formato para pantalla chica.	2-Dec-17		
	Comunicador para la difusión del proceso de elección de autoridades y acompañamiento a la consolidación del Autogobierno Indígena Originario de Raqaypampa	Monto total del contrato 15.000,00	Primer producto: Documento que contenga el diseño del programa radial en el marco del proceso Autonómico Indígena originario de Raqaypampa.	9-Jun-17	Envío su primer producto se procedió al primer pago, además de 12 programas como parte del 2do producto. (Coordinación - Magaly Gutiérrez)	Se procedió a la cancelación del primer pago.
		Fecha de firma de contrato 1-Jun-17	Elaboración de 4 cuñas radiales que contemplen género y generacional para su difusión con una duración aproximada de entre 30 y 45 segundos.		Entregó su producto a coordinación.	Se procedió a la cancelación del segundo pago.

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
			<p><b>Segundo Producto:</b> Realización y difusión de 12 programas radiales, con una duración mínima de 30 minutos. Contempla entrevistas grabadas y programas difundidos en la radio comunitaria de Raqaypampa 2 veces al día durante un periodo de 15 días. En los horarios de 6 a 7 de la mañana con repis de 18:00 a 19:00 horas.</p> <p><b>Tercer producto:</b> Realización y difusión de 5 programas radiales, con una duración mínima de 30 minutos. Contempla entrevistas grabadas a las autoridades electas de la AIOC de Raqaypampa, su difusión en la radio comunitaria de Raqaypampa 2 veces al día durante un periodo de 15 días.</p> <p><b>Cuarto producto:</b> Difusión de las cuñas radiales elaboradas en la radio comunitaria de Raqaypampa, con 7 pases al día en un plazo de 32 días.</p>	26-Jun-17		
		Fecha final de contrato 11-Jul-17		11-Jul-17	Realizó la entrega de 5 programas radiales de un promedio entre 20 y 35 minutos de duración. Cada audio contempla entrevistas a autoridades electas del GAIOC.	Se procedió a la aprobación del pago.
Juan Miguel Suárez Augsten	Consultoría por producto "Análisis de las competencias e interacción entre el OEP y los GAIOC en materia de Consulta Previa. Caso Autonomía Guarani Charagua Iyambae"	Monto total del contrato 32.000,00	<p><b>Primer producto:</b> Análisis de la información recolectada sobre los alcances y competencias sobre el derecho a la consulta en el marco de las AIOC, la coordinación entre el OEP, el GAIOC y otras instancias en materia de Consulta Previa, caso Charagua Iyambae.</p>	4-Aug-17	<p>La introducción contempla una descripción territorial vinculada a procesos de consulta (de forma general); contiene convenios y declaraciones internacionales y un marco normativo nacional. Hace una revisión del Plan para pueblos indígenas de las TCOs Tacana 1 y Pilón Lajas, como referente sobre procesos que no cumplen procedimientos que establece la normativa nacional e internacional y el resarcimiento a través de programas que protejan sus territorios, denominados "Plan de Protección de Pueblos Indígenas".</p> <p>Incorpora un acápite de entrevistas a exdirigentes, dirigentes actuales y monitores socio ambientales, quienes reconocen los procesos de consulta previa realizadas por Pluspetrol, SINOPEC</p>	Tras las complementaciones solicitadas, se procedió al primer pago.



Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
					entre los años 2012 y 2013, los cuales, según las entrevistas habrían tenido muchas "falacias".  Contempla una revisión a la presencia de instituciones públicas y ONG, haciendo referencia a que CIPCA está apoyando al Nemboatiguasu en la elaboración de la Ley marco de Consulta de la AIOC, la cual estaría en revisión por parte de las capitánías y las zonas. Hace referencia a que CEJIS, sin tener presencia local, ha tenido participación en el proceso de consultas realizado por PLUSPETROL a partir del año 2010.  Presenta una revisión de 8 procesos de consulta realizados entre 2010 al 2017, en una matriz que contempla año, proyecto, responsable y observaciones. De los 8 casos, se informa que, sólo 3 cuentan con documentación (el informe no presenta detalles de la misma).  Las conclusiones del documento se centran en la importancia de la normativa sobre consulta previa; asimismo, se hace referencia a que la escasa información con la que se cuenta del tema es de alta relevancia en el análisis de participación de actores, en los diferentes niveles (TIOC y estado).	
		Fecha de firma de contrato 28-Jun-17	Segundo producto: Propuesta de los alcances de las competencias para la coordinación/interacción entre el OEP, el GAIOC y otras instancias en materia de Consulta Previa en AIOC.	3-Sep-17		
		Fecha final de contrato 27-Oct-17	Tercer producto: Documento de sistematización de las sugerencias y propuestas de los dos talleres en Charagua Iyambae y de los dos conversatorios en La Paz para ser incluírlas en el documento final.	3-Oct-17		

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
			Cuarto producto: Documento final que incluya las sugerencias y modificaciones generadas en las sesiones de construcción y análisis colectivo de la propuesta. (Resumen ejecutivo y un power point).	2-Nov-17		

#### 8.4. Anexo 2-A. Estado de situación de las consultorías – Género

Responsable	Consultorías designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
Rosmery Pizarro Jarro	Consultoría por Producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa"	Monto total del contrato 15.860,00				
		Fecha de firma de Contrato 07-Jun-2017	Primer Producto: Propuesta de plan de trabajo, que incluya: Metodología en cada una de las etapas de intervención, objetivos, resultados esperados, además de una propuesta económica.	27-Jun-2017	1. ENTREGADO: La consultora entregó su primer producto en fecha, previa revisión y aprobación de la responsable de la Unidad de Género Lucia Vargas. Posteriormente se procedió al pago (Coordinación - Magaly Gutierrez) Este incluye: Objetivos y resultados esperados, metodología a ser aplicada en las tres etapas de intervención, y una propuesta económica.	Dado que el primer y segundo producto cuentan con todos los requisitos estipulados en los TDR, se prosiguió con la cancelación del primer y segundo pago.
		Fecha de finalización del contrato 05-Sep-2017	Segundo Producto: Sistematización: fortalecimiento de la actoría política y participación de mujeres en la conformación del autogobierno de la autonomía indígena de Raqaypampa  Tercer Producto: Informe final que contiene: conclusión, indicadores, propuestas metodológicas, resultados del	06-Ago-2017	2. ENTREGADO: La consultora entregó su segundo producto en fecha, previa revisión y aprobación de la responsable de la Unidad de Género Lucia Vargas. Posteriormente se procedió al pago (Coordinación - Magaly Gutierrez) Este incluye: Situación de las organizaciones de mujeres en la CRSUCIR, Recorrido Autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa y la participación de mujeres, Análisis del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa y del Reglamento, estrategias, estrategia de comunicación, sistematización de la experiencia en sus tres líneas de acción, metodologías aplicadas y propuestas, conclusiones, recomendaciones  3. PENDIENTE: La entrega de este producto está programada para el cinco de septiembre. Sin embargo la consultora indicó que lo presentará hasta el 31 de agosto para que este pueda ser revisado.	

Responsable	Consultoras designadas	Características	Productos esperados	Fecha entrega productos	Productos entregados	Observaciones
Cecilia Vargas Choquemita	Consultoría por producto "Fortalecimiento a la participación política de las mujeres en el proceso de conformación del autogobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Uru Chipaya"		acompañamiento y el proceso de fortalecimiento de la actoría a las mujeres, entre otros puntos.			
		Monto total del contrato: 14.000 Fecha de firma de Contrato: 07-Jul-2017	Primer Producto: Propuesta de plan de trabajo, que incluya: Metodología en cada una de las etapas de intervención, objetivos, resultados esperados, además de una propuesta económica.  Segundo Producto: Sistematización: Fortalecimiento de la actoría política y participación de mujeres en la conformación del autogobierno de la autonomía indígena de Raqaypampa.  Tercer Producto: Informe final que contiene: conclusiones, indicadores, propuestas metodológicas, resultados del acompañamiento y el proceso de fortalecimiento de la actoría a las mujeres, entre otros puntos.	27-Jul-2017	1. ENTREGADO: La consultora entregó su primer producto en fecha, previa revisión y aprobación de la responsable de la Unidad de Género Lucia Vargas. Posteriormente se procedió al pago (Coordinación - Magaly Gutierrez) Este incluye: Objetivos y resultados esperados, metodología a ser aplicada en las tres etapas de intervención.  2. ENTREGADO: La consultora entregó su segundo producto en fecha, previa revisión y aprobación de la responsable de la Unidad de Género Lucia Vargas. Posteriormente se procedió al pago (Coordinación - Magaly Gutierrez) Este incluye: Situación de las organizaciones de mujeres en la CRSUCIR, Recorrido Autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa y la participación de mujeres, Análisis del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa y del Reglamento, estrategias, estrategia de comunicación, sistematización de la experiencia en sus tres líneas de acción, metodologías aplicadas y propuestas, conclusiones, recomendaciones.	Consultoría finalizada, la consultora entregó todos sus productos a tiempo, los mismos que fueron revisados y aprobados por la Encargada de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral. Se solicita proceder con el pago a la consultora por estos dos productos.
		Fecha de finalización del contrato: 21-Ago-2017		21-Ago-2017	3. ENTREGADO: La consultora entregó su tercer producto en fecha, el mismo contiene: Acompañamiento a la participación política de las mujeres, resultados de los talleres de fortalecimiento de la actoría política de las mujeres, indicadores, conclusiones, resultados, barreras, recomendaciones, entre otros puntos.	
