

INFORME TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DEL PROGRESO
PROYECTO: COASTAL FISHERIES INITIATIVE – LATIN AMERICA

Trimestre: Junio – Setiembre 2018

Fecha de elaboración del informe: 13 de setiembre de 2018

I. AVANCE ACUMULATIVO

En este período se alcanzó una ejecución financiera binacional acumulada ascendente al **20.11%** del presupuesto total; siendo la ejecución entre WWF y CI, por la parte ecuatoriana del **16.89%** y de **21.74%** por parte de Perú. Respecto al trimestre la ejecución binacional fue de **13.95%** con una ejecución de **12.45%** por parte de Perú y **16.89%** por parte de Ecuador.

Cuadro: Resumen financiero acumulado al 13.12.18

Actividades	Presupuesto Aprobado	Gastos (*)	Compromisos	Anticipos	Total	Saldo por ejecutar	Porcentaje de avance en ejecución
Total Output 00100445 Perú	650,000.00	136,909.94	4,381.68	0.00	141,291.62	423,086.62	21.74%
Total Output 00094305 Ecuador	329,604.00	55,658.80	0.00	0.00	55,658.80	329,604.00	16.89%
Total CFI	979,604.00	192,568.74	4,381.68	0.00	196,950.42	752,690.62	20.11%

Cuadro: Resumen financiero del trimestre 14.09.18 - 13.12.18

Actividades	Presupuesto Aprobado	Gastos Trimestre Julio-Set	Compromisos	Anticipos	Total	Porcentaje de avance en ejecución
Total Output 00100445 Perú	650,000.00	79,577.29	1,378.58	0.00	80,955.87	12.45%
Total Output 00094305 Ecuador	329,604.00	55,658.80 (**)	0.00	0.00	55,658.80	16.89%
Total CFI	979,604.00	135,236.09	1,378.58	0.00	136,614.67	13.95%

(*) Fuente: ATLAS... (13.12.2018)

(**) Corresponde al primer desembolso a Cooperación Internacional realizado el 11.09.18.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



PERÚ: Ejecución Acumulada por Actividad

Output 100445 Award 96507

Actividades	Presupuesto Aprobado	Gastos	Compromisos	Total	Saldo por ejecutar	Porcentaje de avance en ejecución
Actividad 1	245,909.20	6,655.48	1,582.14	8,237.62	237,671.58	3.35%
Actividad 2	153,929.80	12,838.83	608.7	13,447.53	140,482.27	8.74%
Actividad 3	164,700.00	37,521.16	2,190.84	39,712.00	124,988.00	24.11%
Actividad 4	85,461.00	79,894.47		79,894.47	5,566.53	93.49%
Total Output 00100445	650,000.00	136,909.94	4,381.68	141,291.62	508,708.38	21.74%
Total Award 00096507	650,000.00	136,909.94	4,381.68	141,291.62	508,708.38	21.74%
Total Fund 62000	650,000.00	136,909.94	4,381.68	141,291.62	508,708.38	21.74%

ECUADOR: Ejecución Acumulada por Actividad

Output 94305 Award 87177

Actividades	Presupuesto Aprobado	Gastos	Compromisos	Total	Saldo por ejecutar	Porcentaje de avance en ejecución
Actividad 1	194,192.00	55,658.80	0.00	55,658.80	138,533.20	28.66%
Actividad 2	135,412.00	0.00	0.00	0.00	135,412.00	0.00%
Total Output 00094305	329,604.00	55,658.80	0.00	55,658.80	273,945.20	16.89%
Total Award 000871477	329,604.00	55,658.80	0.00	66,572.80	263,031.20	16.89%
Total Fund 62000	329,604.00	55,658.80	0.00	66,572.80	263,031.20	16.89%

Proyecto:
INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



Gráfico No. 1


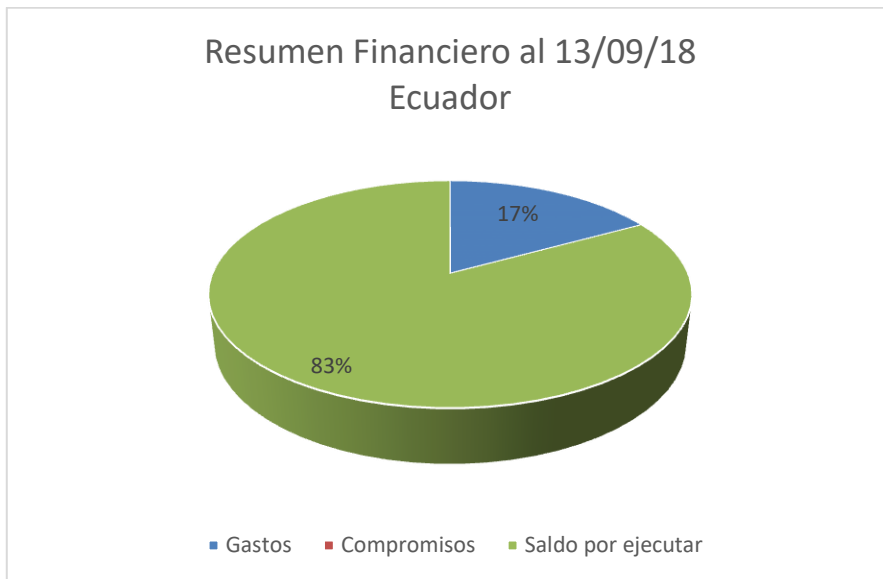


Gráfico N° 2

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA

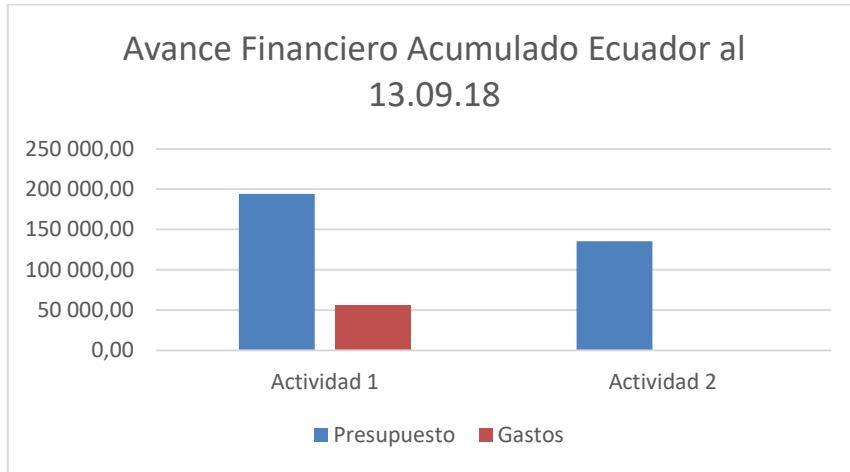

II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS



Actividad pausada

Actividad en proceso

Actividad cumplida

Actividad no iniciada

RESULTADOS	R1: Condiciones habilitantes mejoradas para la gobernanza de siete pesquerías costeras de Ecuador y Perú			
INDICADOR SEGÚN PRODOC	PRODUCTOS	AVAN CE (color)	AVANCE TRIMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)	Links
(1) Número de nuevos o mejorados instrumentos para fortalecer la gobernanza de las pesquerías costeras de Ecuador y Perú.	Producto 1.1. Plan de acción nacional (PAN) de dorado de Ecuador mejorado y actualizado con arreglos de gobernanza fortalecidos.		De acuerdo a lo reportado por WWF este año se llevó a cabo una última evaluación del FIP Dorado. En esta evaluación quedó patente los grandes avances que se han logrado en estos últimos tres años en la toma de información, análisis y manejo de la pesquería respecto al recurso y especies asociadas. Sin embargo, esta evaluación resalta que todavía hay posibilidad de progresar en aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento de los órganos de consulta y toma de decisiones, así como en el plano internacional, en la	<ul style="list-style-type: none"> https://www.dropbox.com/s/y6a9gefjt6dkdhf/Informe%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20del%20FIP%20Dorado%20de%20Ecuador_2018.pdf?dl=0
(2) Número de				

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



<p><i>personas (hombres y mujeres, por nacionalidad) que han tenido entrenamiento (formal, no-formal y en el trabajo) sobre temas clave de gobernanza pesquera mejorada y manejo sustentable de pesquerías.</i></p> <p><i>(3) Número y superficie (ha) de áreas protegidas marinas y costeras con esquemas formales participativos de</i></p>			integración de acciones conjuntas con Perú. Estos son los retos que WWF pretende abordar en el marco del proyecto CFI.	
	Producto 1.2. PAN pomada de Ecuador mejorado y actualizado con arreglos de gobernanza fortalecidos		WWF-Ecuador probó en la flota arrastrera de camarón pomada que opera en el Golfo de Guayaquil, un sistema de bitácora electrónica de pesca para reducir la demora en la disponibilidad de los datos y disminuir los errores que se producen al transcribir datos del papel a una computadora. El monitoreo llevado a cabo aprovechando esta tecnología innovadora, probó ser muy eficaz.	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.dropbox.com/s/h31jidstrbnjimp/WWF%20BitacElect_Resultados%20piloto%20pomada%202017.pdf?dl=0
	Producto 1.3. Nuevo plan de acción provincial para concha en Ecuador		<ul style="list-style-type: none"> • No se ha iniciado 	•
	Producto 1.4. Nuevo PAN cangrejo en Ecuador		<ul style="list-style-type: none"> • No se ha iniciado 	•
	Producto 1.5. Nuevo PAN de atún con caña en Ecuador		<ul style="list-style-type: none"> • No se ha iniciado 	•
	Producto 1.6. Arreglos de manejo actualizados para concha y cangrejo en Perú.		<ul style="list-style-type: none"> • Se lanzó el proceso de selección de la consultoría “Diseño de un piloto de manejo comunitario de áreas de manglar en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y su zona de amortiguamiento”. Este piloto nos permitirá explorar las condiciones habilitantes necesarias para mejorar los arreglos de 	(PNUD/IC-289/2018 Consultoría para el diseño de una prueba piloto para el manejo comunitario de áreas de manglar en el Santuario Nacional Los Manglares de

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



<p><i>gobernanza pesquera.</i></p>			<p>gobernanza en el contexto actual y así identificar lo que se necesita cambiar o mejorar.</p>	<p>Tumbes y su zona de amortiguamiento)</p>
	<p>Producto 1.7. Plan estratégico para fortalecer la gobernanza y manejo pesquero en los gobiernos regionales de Perú.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado talleres regionales en Tumbes y Piura que tuvieron como objetivo identificar las prioridades y problemática de la gestión pesquera. A través de este diagnóstico se buscó obtener una evaluación de la situación actual en la que se encuentra la gestión de los GORE respecto a la administración pesquera y su sostenibilidad, identificando las oportunidades de mejora que se puedan poner en marcha en el corto y mediano plazo, permitiendo diseñar los próximos pasos para el fortalecimiento de las capacidades de gestión pesquera de los GORE. • Se lanzó el proceso de selección para la consultoría Mapeo de actores de la red de gobernanza de las pesquerías de Piura y Tumbes. <p>La participación de los usuarios de los recursos y actores claves en la toma de decisiones es un factor clave para la gobernanza pesquera, esta consultoría nos ayudará a identificarlos.</p>	<p>(PNUD/IC-288/2018 Consultoría para realizar el mapeo de actores para el fortalecimiento de la Red de Gobernanza de las Pesquerías Costeras Artesanales de Piura y Tumbes)</p>
<p>RESULTADOS</p>	<p>R2: Condiciones habilitantes mejoradas para la planificación espacial marina y costera en Ecuador y Perú</p>			
<p>INDICADOR SEGÚN PRODOC</p>	<p>PRODUCTOS</p>	<p>AVAN CE</p>	<p>AVANCE TRIMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)</p>	<p>LINKS (Links a documentos de productos terminados o publicaciones)</p>

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



		(color)		que dan soporte al cumplimiento de dicho resultado
(1) Superficie (ha) bajo procesos de planificación espacial marina y costera en cada país.	Producto 2.1 Plan espacial marino y costero para el norte del Golfo de Guayaquil (Ecuador)		<ul style="list-style-type: none"> No se ha iniciado 	<ul style="list-style-type: none">
	Producto 2.2. Plan espacial marino y costero para la bahía de Sechura (Perú)		<ul style="list-style-type: none"> Como parte del entrenamiento de personal técnico y actores clave en métodos y herramientas de planificación espacial marina y costera, se facilitó la participación de los representantes de los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes a los siguientes eventos organizados por el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental: Seminario Nacional de Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras y el II Encuentro Nacional de Zonificación Ecológica y Económica. Resultado: Se logró la participación 51 hombres y 30 mujeres, entre representantes y funcionarios.... Se preparó la propuesta “Sechura Bay Marine Litter Management Project”, para el Bureau of Oceans, Environmental and International Affairs U.S. 	<ul style="list-style-type: none"> https://www.gob.pe/qu/institucion/minam/noticias/18086-gobiernos-regionales-y-locales-impulsaran-el-manejo-integrado-de-las-zonas-marino-costeras-del-pais-de-comites-tecnicos-regionales ≡
(2) Superficie (ha) de áreas marinas y costeras protegidas incluida en procesos de planificación espacial marina en cada país				
(3) Número de personas (hombres y mujeres, por nacionalidad) que han tenido				

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



<p><i>entrenamiento (formal, no-formal y en el trabajo) en métodos y herramientas para planificación espacial marina y costera y el cálculo y uso del índice de salud de los océanos.</i></p>			<p>Department of State, con la finalidad de obtener financiamiento para implementar un proyecto para la gestión de los desechos marinos en la bahía de Sechura. Este aspecto fue considerado en el Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera de Sechura elaborado por el Comité de Gestión de La Zona Marino Costera de la Provincia de Sechura y con este apoyo se trata de explorar el fortalecimiento de la gobernanza pesquera dentro del contexto de la gestión espacial marino y costero en la bahía de Sechura.</p>	
	<p>Producto 2.3. Lecciones sobre el uso del índice de salud de los océanos en Ecuador y Perú</p>		<ul style="list-style-type: none"> No se ha iniciado 	<ul style="list-style-type: none">
<p>RESULTADOS</p>	<p>R3: Las lecciones y buenas prácticas para mejorar la gobernanza pesquera y el ordenamiento espacial marino y costero se han compartido con actores clave dentro de cada país, entre ambos países, y con los socios globales del programa CFI</p>			
<p><i>(1) Número de personas (hombres y mujeres, por nacionalidad) que han participado en eventos para</i></p>	<p>Producto 3.1. Plataforma electrónica para facilitar la comunicación entre actores clave y diseminar las lecciones y buenas prácticas</p>		<ul style="list-style-type: none"> No se ha iniciado 	<ul style="list-style-type: none">
	<p>Producto 3.2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo la firma de los Acuerdos con CI y WWF 	<ul style="list-style-type: none"> http://www.acuaculturaypesca.g

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



<p><i>diseminar las lecciones y buenas prácticas (p.ej.: talleres, viajes de estudio, seminarios, IWC)</i></p> <p><i>(2) Número de visitas mensuales (promedio anual) registradas en la red de plataformas electrónicas usadas para diseminar el aprendizaje y buenas prácticas del proyecto</i></p>	<p>Lecciones y buenas prácticas documentadas y diseminadas</p>		<p>para la ejecución de los elementos ecuatorianos del Proyecto. Esta actividad se llevó como parte de la actividad 3.2.1 Lanzamiento binacional del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha contratado la preparación de un video profesional para la creación de una nueva área marina protegida en el Perú que tiene como fin mostrar a nivel global los valores y la importancia de conservar el ecosistema marino como modo de supervivencia de las comunidades costeras 	<ul style="list-style-type: none"> • ob.ec/subpesca5060-ecuador-y-peru-implementaran-acciones-integradas-para-conservar-la-sostenibilidad-del-sector-pesquero-artesanal.html • https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-peru-union-pesca-artesanal
	<p>Producto 3.3</p> <p>Experiencia con el instrumento de evaluación de desempeño pesquero documentada y diseminada</p>		<ul style="list-style-type: none"> • No se ha iniciado 	<ul style="list-style-type: none"> •

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



III. APORTES A:

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de reporte, con relación a:

- a) Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular: (no se considera dentro de esta categoría los intercambios entre Oficinas de País o Proyectos)
- b) Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, procesos innovadores)
- c) Promoción del enfoque de género (estadísticas básicas de número de hombres y mujeres que han participado en espacios del proyecto, pero además acciones que hayan generado iguales condiciones a hombres y mujeres en los procesos del proyecto, incluyendo toma de decisiones),
- d) Inclusión de sectores tradicionalmente excluidos (indígenas, campesinos, mujeres solteras cabezas de hogar, ancianos, jóvenes, etc.)

NOTA: Para cada tema reportado, se deberá incluir un link con la evidencia que lo sustente.

- e) *Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular: (no se considera dentro de esta categoría los intercambios entre Oficinas de País o Proyectos)*

No se reportan acciones en este periodo.

- f) *Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, procesos innovadores)*

En relación a la mejora de condiciones habilitantes para la gobernanza de pesquerías, el Proyecto viene promoviendo la utilización de herramientas metodológicas de identificación participativa de problemas y prioridades (p. ej. Matriz Vester, Magnus) en coordinación con la Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental (DMOTA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) lo que ha permitido que los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes elaboren un diagnóstico preliminar con el fin de determinar las acciones para mejorar la gestión institucional de las pesquerías artesanales; esto en el marco del Resultado 1, Producto 1.7 del Proyecto CFI. Se viene gestionando que estas herramientas sean implementadas a nivel de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas marino costeras del Perú.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



- g) *Promoción del enfoque de género (estadísticas básicas de número de hombres y mujeres que han participado en espacios del proyecto, pero además acciones que hayan generado iguales condiciones a hombres y mujeres en los procesos del proyecto, incluyendo toma de decisiones)*

No se reportan acciones en este periodo.

- h) *Inclusión de sectores tradicionalmente excluidos (indígenas, campesinos, mujeres solteras cabezas de hogar, ancianos, jóvenes, etc.)*

(PNUD/IC-288/2018 Consultoría para realizar el mapeo de actores para el fortalecimiento de la Red de Gobernanza de las Pesquerías Costeras Artesanales de Piura y Tumbes)

En este periodo se ha lanzado la consultoría de Mapeo de actores de la red de gobernanza de Piura y Tumbes con el fin de identificar actores y determinar su nivel de participación en la gobernanza, con especial énfasis en las comunidades pesqueras. La participación de los usuarios de los recursos y actores claves en la toma de decisiones es un factor clave para la gobernanza pesquera, esta consultoría nos ayudará a identificarlos:

La consultoría contemplará la inclusión del enfoque de género basado en la estrategia de género del proyecto; en ese sentido entre los resultados de la consultoría se debe diferenciar la proporción de hombres y mujeres, y describir aspectos de su rol en la gobernanza.

(PNUD/IC-289/2018 Consultoría para el diseño de una prueba piloto para el manejo comunitario de áreas de manglar en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y su zona de amortiguamiento)

Asimismo, se ha lanzado la consultoría para el diseño de una prueba piloto de manejo comunitario de áreas de manglar, actividad que brindará la oportunidad a las comunidades de extractores de participar en la gestión del manglar como fuente tradicional de subsistencia.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



Esta consultoría diseñará un modelo de manejo comunitario que promueva el uso sostenible del manglar, generando beneficios a los pobladores involucrados, quienes pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos, y brindando oportunidades de desarrollo a mujeres y hombres por igual.

La ejecución de esta consultoría rescatará las lecciones aprendidas en las concesiones de manglar de Ecuador, las mismas que servirán de insumos para la intervención en el Perú, tal como se prevé en el Documento del Proyecto (ProDoc).

Se ha contemplado en los TDR que la consultoría deberá considerar las experiencias en las concesiones de manglar en Ecuador. Asimismo se planea para fines de año realizar un intercambio de experiencias de concheros y cangrejeros peruanos en Ecuador.

IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS

La decisión del Gobierno de Ecuador de fusionar el Ministerio de Acuicultura y Pesca (MAP) con el de Agricultura y Ganadería ha motivado cierta incertidumbre respecto a la participación del MAP en el lanzamiento del Proyecto Global a llevarse a cabo en Guayaquil en el mes de octubre, esta situación viene siendo abordada por la Oficina País Ecuador del PNUD y la Unidad de Gestión del Proyecto en coordinación con los representantes de dicho Ministerio, a fin de asegurar la presencia del Ministerio en el evento., asimismo la oficina país de PNUD en Ecuador ha iniciado **acercamientos con los nuevos funcionarios para lograr el empoderamiento hacia el proyecto.**

La renuncia del Presidente de la República del Perú y todo su gabinete de Ministros (21 de marzo) originó cierta inestabilidad a nivel de los Ministerios. Aunque el nuevo Presidente de la República juramentó el 23 de marzo, siguió un corto periodo de incertidumbre en los cargos de confianza como los Ministerios del Ambiente y de la Producción, directamente involucrados con el Proyecto, aspecto que motivó replantear la fecha de lanzamiento del Proyecto. Finalmente, los cambios fueron realizados a nivel de Ministros y Viceministros quienes han sido informados del Proyecto y se mantiene una buena comunicación y coordinación. Se ha presentado el Proyecto a la nueva Viceministra del Ambiente.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



Un aspecto encontrado es el demasiado tiempo que viene tomando la contratación del personal de Ecuador toda vez que el proceso incluye entrevistas que se deben realizar con las direcciones nacionales del proyecto en Ecuador (MAP) y Perú (MINAM) quienes deben participar como veedores.

Es importante mencionar que la firma de acuerdos con WWF y CI ha tomado mayor tiempo de lo esperado, así como el proceso para el primer desembolso por lo complicado que ha sido la transferencia de fondos, sin embargo, finalmente se logró la firma de los acuerdos y los montos serán transferidos en la segunda quincena de setiembre.

V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO

Actividades	Involucrados	Fecha aprox.
Lanzamiento de la consultoría para la actualización del Plan de Manejo de los manglares de San Pedro de Vice y elaboración del expediente para declarar Sitio Ramsar el estuario de Virrilá.	PNUD, MINAM, GORE Piura, Municipalidad de Vice, Municipalidad de Sechura	Setiembre
Análisis costo – beneficio de la Zona Reservada Illescas	PNUD, SERNANP	Setiembre
Iniciar la preparación de la plataforma de comunicaciones del Proyecto	Coordinador de Gestión del Conocimiento	Octubre
Se participará entre el 1 y 5 de octubre, en el Curso de Gobernanza Oceánica y Valoración Económica a llevarse a cabo en Panamá. Esta capacitación será de utilidad en el fortalecimiento de capacidades del staff del Proyecto dada su relación directa con el Componente II del mismo.	Coordinador de Planificación Espacial Marino Costera del Proyecto	Octubre
Entre el 22 y 26 de octubre se llevará a cabo el taller de lanzamiento del Proyecto Global Iniciativa de Pesquerías Costeras (CFI Global), en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Evento que servirá para iniciar oficialmente las actividades del CFI Global y permitirá la interacción de los proyectos	Coordinador del Proyecto	Octubre

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



componentes de la iniciativa y los actores directamente involucrados en ellas como son autoridades, actores beneficiarios y socios implementadores		
Estudio de la faja marginal de los manglares de San Pedro de Vice	PNUD, MINAM, GORE Piura, Municipalidad de Vice	Noviembre
Consultoría para el diseño de la mesa de recursos bentónicos de Tumbes	PNUD, SERNANP, GORE Tumbes (DIREPRO)	Noviembre
Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional de Tumbes para controlar y supervisar las pesquerías de concha y cangrejo	PNUD, GORE Tumbes (DIREPRO)	Noviembre
Diseño e implementación de sistema de monitoreo participativo biológico pesquero	PNUD, SERNANP, IMARPE	Noviembre
Diagnóstico situacional de la gestión pesquera marina de los Gobiernos regionales	PNUD, PRODUCE	Noviembre
El Proyecto brindará asistencia técnica en el proceso de establecimiento de una nueva área marina protegida en el Perú denominada Mar Tropical de Grau. En tal sentido, se vienen participando en las coordinaciones para el establecimiento de la estrategia de socialización. Posteriormente entre octubre y febrero se apoyará con la constitución del equipo multidisciplinario a nivel de especialista en comunicaciones, apoyo técnico para la elaboración del expediente final y edición e impresión. El SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú) es quien lidera este proceso por ser de su competencia.	SERNANP, PNUD	Noviembre
En coordinación con las Oficinas de Comunicaciones PNUD Ecuador y Perú, Proyecto PNUD GMC y las ONG WWF y CI se viene preparando la elaboración del video del Proyecto en	PNUD	Noviembre

Proyecto:
INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



Ecuador, el mismo que se lanzará en el taller global de Guayaquil.		
Entre el 5 y 8 de noviembre el personal del Proyecto y representantes nacionales de Ecuador y Perú participarán en la 9° Conferencia Bianual de Aguas Internacionales en la ciudad de Marrakech, Marruecos. Evento que servirá para compartir el estado de avance del Proyecto y tomar contacto con proyectos relacionados y actores involucrados a nivel global.	PNUD	Noviembre

VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE

ACTIVIDAD	Atlas Budget Description	DESCRIPCIÓN	VALOR (incluye IVA)	Método de Contratación	No. días estimados hasta contratación	Estado	Adquisición pendiente desde trimestre anterior
1.1.1	Local Consultant 71300	IC Definición de la estrategia de planificación	\$11,402.64	RFQ	25 días	TDR en revisión	SI
1.1.1	Training 75700	Talleres	\$2,640.00	micro purchase	5 días		NO
2.1	Audio Visual&Print Prod Costs 74200	Impresión de boletines	\$1,455.00	micro purchase	5 días		NO
2.3	International Consultant 71200	IC Desarrollo de capacidades del programa	\$18,000.00	RFQ	30 días	En adquisiciones para lanzar convocatoria	NO
3.5	Audit services 74100	Auditoría	\$3,000.00	RFQ	20 días	TDR en revisión	NO
4.1	Audiovisual Equipment 72400	Compra de Equipos de Laboratorio	\$138,000.00	ITB	60 días	En aprobación de CAP	SI

- a) En el próximo trimestre se contará con la totalidad del personal de la Unidad de Gestión del Proyecto tanto en Ecuador como en Perú seleccionará al personal de la Unidad de Gestión del Proyecto:
- Coordinador(a) de Pesca (Componente I). Concurso N° 17628
 - Coordinador(a) en Gestión del Conocimiento (Componente III). Concurso N° 18130
 - Especialista en Planificación Estratégica, Monitoreo y Evaluación. Concurso N° 16906
 - Especialista Líder en Comunicación. Concurso N° 16900
 - Técnico(a) en Comunicación. Concurso No.18238.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



- b) En el próximo trimestre se efectuarán los desembolsos para las ONG Conservation International y World Wildlife Fund, las mismas que implementarán las actividades del Proyecto en Ecuador, de acuerdo a las cartas habilitantes firmadas en julio.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



I. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERIODO

Activ.	Cuenta presupuestaria atlas	Descripción	Monto estimado	Método de contratación	No. Días estimados hasta contratación	Estado	Adquisición pendiente del trim. anterior
4	71800 - Equipos	Adquisición de 4 laptop + 1 impresora, para equipo del proyecto CFI	7,206.46	Micro compra	20 días	Preparación de especificaciones técnicas	No
3	71600 - ETKTS	Pasajes aéreos Lanzamiento CFI Global	10,500.00	LTA	10 días	Preparación de itinerarios de vuelo	No
3	74200 - Audiovisuales	Servicio de filmación de video Ecuador	5,000.00	Micro compra	10 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Diseño e implementación de prueba piloto de manejo comunitario de áreas de manglar dentro del Santuario Nacional Manglares de Tumbes y su área de influencia	10,000.00	SDC	25 días	En proceso de convocatoria	No
1	71300 - IC	Diseño e implementación de prueba piloto de manejo comunitario de áreas de manglar dentro del Santuario Nacional Manglares de Tumbes y su área de influencia. Acuerdo con Consorcio Manglares del Noroeste	10,000.00	SDC	25 días	En proceso de convocatoria	No

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



1	71300 - IC	Diseño e implementación de la “mesa técnica de recursos bentónicos” de Tumbes	4,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional de Tumbes para controlar y supervisar las pesquerías de concha y cangrejo	15,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Afinar la propagación de concha	40,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Preparar análisis de situación de la administración de pesquerías artesanales marinas en los gobiernos regionales de Tumbes y Piura	15,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Preparar análisis de situación de la administración de pesquerías artesanales marinas en los gobiernos regionales de Tumbes y Piura	36,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Diseño e implementación de pilotos en los gobiernos regionales de Tumbes	71,467.81	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
1	71300 - IC	Diseño e implementación de pilotos en los gobiernos regionales de Piura	71,467.81	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Entrenamiento de personal técnico y actores clave en métodos y herramientas de planificación espacial marina y costera	2,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



2	71300 - IC	Ejecutar estrategia de sensibilización e involucramiento de actores clave	10,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Declarar el estuario de Virrilá sitio Ramsar, y preparar e iniciar la implementación de su plan de manejo	10,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Preparar e iniciar la implementación de una estrategia de manejo para la zona costera de la Zona Reservada Península Illescas	20,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Preparar e iniciar la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice	13,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Preparar e iniciar la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar Manglares de San Pedro de Vice	10,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No
2	71300 - IC	Preparar estrategia de comunicación para grupos específicos y sitios	40,000.00	SDC	30 días	Preparación de TdR	No

VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN DEL TRIMESTRE QUE DEBAN SER DESTACADOS

- Importante apoyo en la gestión del proyecto, se recibió por parte de la Oficina país de Ecuador y del Proyecto Global Marine Commodities específicamente en las diversas coordinaciones relativas al Proyecto en tanto no se contó con personal de la Unidad de Gestión en Ecuador.
- En este periodo se priorizó la conformación del equipo del proyecto, siendo importante mencionar el proceso competitivo efectuado por la Oficina País PNUD-Perú, para la selección del Coordinador de Planificación Espacial Marino Costera del Proyecto, quien tendrá la responsabilidad de asegurar que los correspondientes productos y resultados del Componente II del proyecto, sean generados bajo los estándares de calidad requeridos y dentro de las restricciones de tiempo y costos.
- En relación a los componentes 1 y 2 (sobre Gobernanza y Planificación Espacial Marino Costera) es resaltante el aporte técnico del personal del Proyecto (Coordinador y Administrador) en el taller de identificación de prioridades para proyectos marino costeros organizado por el Ministerio del Ambiente de Perú, con el objetivo de orientar e impulsar el fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión de las zonas marino costeras, y abordar sus problemáticas territoriales, lo cual está alineado a los resultados esperados del proyecto.

VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS


Se adjunta la matriz de riesgos para su seguimiento. En el periodo reportado no se observa incremento de riesgos específicos, pero se continúa con el monitoreo de los aspectos establecidos en el ProDoc.

Proyecto:

INICIATIVA PESQUERIAS COSTERAS CFI-LA



Aprobado por:

<p>Isidro Andrade Director/a de Proyecto</p>	 <p>Mariano Valverde Coordinador/a del Proyecto</p>
<p>Fernanda González Oficial de Programa - PNUD</p>	<p>Mónica Andrade Coordinadora del Área de Ambiente y Energía</p>
