



Comité Directivo Nacional (CDN)

Segunda Reunión Ordinaria

PROGRAMAS CONJUNTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

PC Cuilco: "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"

PC Ixil: "Desarrollo Rural Integral en Ixil"

Minuta

FECHA: 29 de mayo de 2017

LUGAR: Sala Ricardo Stein, Oficinas SNU, Europlaza, Zona 14, Guatemala

PARTICIPANTES:

Integrantes CDN

Instituciones Sectorial

- SEGEPLAN Arq. Luis Ovando, Sub Secretario Planificación y Ordenamiento Territorial
- MAGA Ing. Marco Tulio Díaz, Asesor Despacho del Vice Ministerio de Desarrollo Rural (VIDER)
- MSPAS Dra. Carmen Arreaga, Asesora Vice Ministerio Estratégico

Sistema de las Naciones Unidas

- OCR Rebeca Arias, Coordinadora Residente
- PNUD Igor Garafuic, Director de País
- FAO Diego Recalde, Representante
- OPS-OMS Oscar Barreneche, Representante

Otros participantes

Dr. Gustavo Martínez, Asesor Vice Ministerio Estratégico, MSPAS

Carmen González, Oficial de Coordinación, OCR

Julio Martínez, Oficial de Programa, PNUD

Maynor Estrada, Representante Asistente, FAO

Olivia Brathwaite, Asesora Enfermedades No Transmisibles y Promoción Salud, OPS-OMS

Christina Elich, Especialista Enfoque Territorial, PCDRI

Ivan Lungo, Especialista en Comunicación, PCDRI

Agenda

La segunda reunión ordinaria del Comité Directivo Nacional (CDN) se desarrolló según la agenda que se encuentra en el Anexo 1.

Bienvenida

Rebeca Arias da la bienvenida a los participantes, agradeciéndoles por su presencia y pide que se presenten. Luego, continúa indicando que los Programas Conjuntos (PC) son iniciativas para la puesta en marcha de Políticas Públicas en los municipios más vulnerables del territorio de Guatemala, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), el Programa de Agricultura Familiar y Fortalecimiento de la economía Campesina (PAFFEC), el Modelo Incluyente de Salud (MIS), entre otras, que se llevan adelante coordinadamente y articuladamente, entre las agencias y las instituciones del gobierno a nivel nacional y local.



Informa que el Gobierno de Suecia contribuye con \$10 Millones a estos PC. Agrega que el desarrollo local y el fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades requieren de estos enfoques integrales: *“Ese trabajo articulado es lo que realmente se requiere para el logro de los ODS, que plantean una agenda de desarrollo muy amplia y ambiciosa, que busca la integralidad de las intervenciones al desarrollo a nivel nacional y local, con un enfoque multidimensional para atender las distintas dimensiones de la pobreza y la desigualdad.”* Menciona que el rol del CDN es brindar orientación estratégica, aprobar planes de trabajo anuales y los informes anuales de los programas, y facilitar la institucionalización y la replicabilidad de las iniciativas que tienen éxito. Además, comparte que la reunión tiene como objetivo conocer los informes 2016 y planes 2017, para que sean aprobados por el comité. Invita al CDN dar sus comentarios y sugerencias para mejorar la ejecución de estos programas, para que el resultado esperado se logre y se contribuya al logro de los ODS.

Avances, proyecciones e intercambio

Julio Martínez indica que previamente se circularon los informes y planes a los integrantes del CDN, y comparte conceptos y características de los PCDR1.

Christina Elich continua la presentación, en cuanto a avances y proyecciones de los dos PCDR1, según la presentación que se encuentra en el Anexo 2. Durante la presentación se aclaran dudas sobre las metas planificadas y logradas y las proyecciones, sobre intervenciones en agricultura familiar, hábitat familiar, salud, ingreso, desarrollo de capacidades de gobiernos locales e instituciones sectoriales, sobre razones de atrasos y reprogramación de metas no logradas, y se inicia paulatinamente un intercambio enriquecedor entre los integrantes del CDN, que se resume a continuación.

Julio Martínez da detalles del proceso de establecimiento de las Unidades Municipales de Gestión Ambiental y de Riesgo (UMGAR), que están financiados por las municipalidades, que deben dar respuesta a las emergencias, y que son parte de las Coordinadoras Municipales de Reducción de Desastres (COMRED). **Luis Ovando** complementa que la CONRED (Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres) está estructurada para atender emergencias a desastres. Explica que como parte del PC Coatan Suchiate (SEGEPLAN & PNUD): *“... elaboramos una guía de como incorporar el tema de riesgo y atender a la emergencia desde el enfoque del desarrollo. Las UMGAR, en medida que están vinculadas a la Dirección Municipal de Planificación (DMP), se toman en cuenta los temas de riesgo a desastres y se vinculan a la planificación del desarrollo.”* **Julio Martínez** comparte que en los COMUDE (Consejos Municipales de Desarrollo) ya se observa un efecto esperado del PC Cuilco, ya que, a principios de 2016, ninguno de los cinco municipios que participan en el PC Cuilco logró presentar una propuesta de proyecto para el financiamiento del CODEDE (Consejo Departamental de Desarrollo). Ahora, en una visita del donante en marzo 2017, la SCEP (Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia) expresó que este año, cuatro de los cinco municipios fueron los primeros que presentaron sus propuestas al CODEDE, para su financiamiento. **Rebeca Arias** pregunta sobre los montos que están aprobados por el CODEDE para los cinco municipios. Se compromete realizar este monitoreo y visibilizarlo en el próximo informe.

En el caso del **PC Ixil**, se explica que se está levantando la línea de base, con asesoría del equipo del Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), y que la información de avances en el 2016 comprende procesos de generación de condiciones para poder iniciar el desarrollo de capacidades de sujetos priorizadas, las comunidades y familias, en el 2017. **Carmen Arreaga** pregunta cómo se establece la línea de base y se le explica que, en el caso de salud, se basa en registros del MSPAS. Carmen Arreaga comparte los problemas que hay en el MSPAS con la confiabilidad de los valores de indicadores, por el censo desactualizado (2002) y el sub-registro y agrega que como parte del proceso del MIS se están mejorando los registros. **Christina Elich** aclara que Gabriel Morales (OPS/PC Ixil) está trabajando con la Dirección del Área de Salud (DAS) en Ixil para obtener los



valores iniciales de los indicadores institucionales en salud, del registro que se está actualizando. **Olivia Brathwaite** aclara que en el Universo de las Familias del PC Ixil se está tomando en cuenta las familias víctimas del Enfrentamiento Armado Interno (EAI), que participan en los procesos de Justicia de Transición que implementan las organizaciones de víctimas, socios de PAJUST (Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición) que se implementa por PNUD, también con fondos de Suecia.

Rebeca Arias pregunta sobre la Ley que fue aprobado por el Congreso y vetado por el Ejecutivo para el pago a Comadronas. **Oscar Barreneche** explica que el MSPAS no está en facultad de remunerar a las comadronas, que lo consideran una acción contraria al carácter de la función que desempeñan las comadronas dentro de las comunidades. Además, comparte que su primera reunión en el Ixil era con el Consejo de Autoridades Ancestrales, en el cual pidieron al PC Ixil, respeto y reconocimiento para sus formas de vivir y por sus aportes a la vida comunitaria, entre otros en aspectos de salud, desde su cosmovisión, donde el valor monetario no cabe.

Rebeca Arias pregunta donde funcionan los Espacios Amigables, y **Olivia Brathwaite** explica que en Nebaj y Chajul funcionan dentro de los servicios de salud y en Cotzal funciona fuera del centro de salud, donde un grupo de unos 20 jóvenes bien organizados, con el que se ha hecho un diagnóstico para obtener información sobre cómo atender problemas identificados por los jóvenes (suicidios y embarazos en adolescentes), incluyendo salud sexual y reproductiva y salud mental. El grupo, que ha ganado concursos en teatro, propone hacer obras de teatro en salud y otras actividades lúdicas en las comunidades, para atender los problemas de los jóvenes.

Oscar Barreneche quien facilita el intercambio, invita a los participantes valorar las lecciones aprendidas en la implementación de los PC, que pueden ser sistematizadas y replicadas en otras áreas. Opina que la mejor práctica es hacer operativa la agenda de ODS a nivel local y en comunidades priorizadas: *“Se reconoce la lección importante del trabajo intersectorial, junto con FAO y PNUD en otros determinantes de salud, complementario al trabajo vertical en programas de salud materna infantil, para poder tener un impacto integral que podría ser más sostenible de manera que las contrapartes nacionales se vinculan. No llevamos los proyectos hechos, sino escuchamos a los sujetos priorizados y trabajamos conjuntamente en las soluciones a las prioridades y problemas sentidos a nivel local. Nos están enseñando a la cooperación internacional de salir de nuestro silo técnico y colaborar viendo la integralidad del trabajo que podemos hacer a nivel local. Nos hemos sumado a la implementación de políticas públicas de forma integral y replicable. Estamos apoyando al MSPAS en la implementación del MIS en el territorio, porque queda muy bien con lo que pretendemos lograr con los PC.”*

Diego Recalde está de acuerdo con su colega que aquí estamos tratando de hacer operativa una agenda de los ODS, una aplicación territorial, en el marco de la estrategia nacional de desarrollo rural integral: *“... la multi-sectorialidad en la práctica en un PC que tiene varios sectores, actores y contrapartes. De un lado están los cooperantes trabajando multisectorialmente y del otro lado están las contrapartes tratando de hacer lo mismo. Aprendemos de lado a lado, una riqueza del pasado, ya lo hemos hecho en el otro PC (Coatan Suchiate) y ahora lo estamos replicando en la práctica en otros territorios. La institucionalidad no está en la capital, sino en las comunidades. Es factible hacer una agenda de ODS, local, multisectorial con institucionalidad en las comunidades, eso va a garantizar que seguirán los procesos, cuando el PC ya no esté.”* **Carmen Arreaga:** *“La implementación del modelo (MIS) se está realizando en nueve áreas priorizadas, entre los que están las áreas de trabajo de estos PC, y luego a nivel nacional. El MIS viene a plantear una manera de facilitar y sumar, para que los procesos se complementen. Antes la atención era más a nivel individual. Ahora, es más a familias y comunidades, agua saludable, saneamiento ambiental, reconocimiento y coordinación con otros modelos de atención que existen a nivel comunitaria. Se van a ver todos estos cambios en cuanto entremos a la tercera fase del proceso de implementación del MIS, a finales de este año. La primera fase de ordenamiento territorial*



en salud se hizo el año pasado. Estamos ahora en la fase 2 de creación de condiciones, la formación del personal, y coordinación interinstitucional. “

Luis Ovando: *“El primer PC (Coatán-Suchiate) nos dejó muchos aprendizajes. Es un reto por parte de las instituciones sectoriales, también en la cuenca del río Chixoy, donde MAGA realiza la gestión integral de la cuenca, SEGEPLAN aporta desde la óptica de planificación territorial, y MSPAS se vincula al proceso desde la distribución de los servicios de salud. A través de los PDM (Planes de Desarrollo Municipal) se articulen los distintos planes de ordenamiento territorial, de manejo de microcuenca, de salud, y de desarrollo comunitario. No tengo duda en que los PC han logrado la intersectorialidad en el territorio.*

Acuerdos y Compromisos

Diego Recalde, en este punto concluye que estamos trabajando en territorios complicados donde debemos trabajar con lo que hay, refiriéndose a los datos para establecer la línea de base. *“Tratemos de hacer sentido frente a un proceso histórico en las zonas como Ixil, donde recuperamos a comunidades que sufrieron el enfrentamiento armado interno (EAI). Es factible, acordar temas fundamentales, en que las autoridades van tomando sus responsabilidades, desde las más centrales, hasta las más locales. Algo ya se aprendió, y algo se estará aprendiendo sobre la planificación en comunidades con contextos muy complejos.”* En cuanto a los Planes Operativo del 2017 y los Informes de Avance de 2016, concluye que se está avanzando bien, y que los participantes han expresado su satisfacción con estos documentos. Líneas importantes hacia el futuro son la gestión de riesgo, buscando nexos desde la emergencia al desarrollo, construir una cultura de mayor resiliencia, de mayor prevención, y mejorar la inter-conexión de planes de comunidades y municipales.

Finaliza su intervención agradeciendo a los participantes, agregando: *“Somos un equipo grande que trabajamos a nivel local con pocos recursos que no pueden solucionarlo todo, pero pueden hacer la diferencia, y si podemos perfeccionar este modelo un poco, podemos tener algo muy importante para demostrar al país.”*

Rebeca Arias agradece la participación y la presentación, felicitando al equipo del PC, a las instituciones y agencias participantes por los avances que se ven muy promisorios. Destaca: *“Son modelos que debemos replicar, visibilizando las historias de éxito. Es importante la institucionalización de las prácticas que le den sostenibilidad a los resultados. Comparto la opinión de mis colegas que éste es un modelo de Desarrollo Sostenible a nivel local.”* A su pregunta sobre la ejecución financiera, **Julio Martínez** indica que, durante el 2016, se ha ejecutado el 30% de los fondos depositados aproximadamente.

Rebeca Arias finaliza compartiendo que el Ministerio de Gobernación está impulsando una estrategia de prevención de violencia con jóvenes y coordinando con programas que ya están en marcha. **Olivia Brathwaite** informa que se está articulando el trabajo a nivel escolar y municipal con la Unidad de Prevención de la Violencia del Ministerio de Gobernación, dentro del marco de la Política Nacional de Prevención de la Violencia.

Rebeca Arias cierra la reunión agradeciendo a los participantes.



Firman por acuerdo:

Por las Instituciones Sectoriales:

SEGEPLAN

Arq. Luis Ovando, Sub Secretario Planificación y Ordenamiento Territorial



MAGA

Ing. Marco Tulio Díaz, Asesor Despacho VIDER

Handwritten signature of Marco Tulio Díaz

MSPAS

Dra. Carmen Arreaga, Asesora Vice Ministerio Estratégico

Handwritten signature of Carmen Arreaga

Por el Sistema de las Naciones Unidas:

OCR

Rebeca Arias, Coordinadora Residente

Handwritten signature of Rebeca Arias



PNUD

Igor Garafulic, Director de País

Handwritten signature of Igor Garafulic



FAO

Diego Recalde, Representante

Handwritten signature of Diego Recalde



OPS-OMS

Oscar Barreneche, Representante

Handwritten signature of Oscar Barreneche





Anexo 1

Comité Directivo Nacional Segunda Reunión Ordinaria

PROGRAMAS CONJUNTOS DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

PC Cuilco: "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"

PC Ixil: "Desarrollo Rural Integral en Ixil"

AGENDA

RESULTADOS ESPERADOS:	FECHA: Lunes 29 de mayo de 2017, 15:30-17:00.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis realizado sobre el estado de implementación de los Programas Conjuntas y sus proyecciones. 2. Informes Consolidados de Avances de 2016 aprobados 3. Planes Operativos Anuales 2017 aprobados 	LUGAR: Sala Ricardo Stein, Oficina del SNU 5a Av. 5-55 Zona 14, Europlaza, Torre IV, Nivel 10, Ciudad de Guatemala

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
15:30 – 15:40	Apertura Presentación de participantes, introducción y objetivos	Rebeca Arias Coordinadora Residente, SNU
15:40 – 16:10	Socialización Implementación de los Programas Conjuntos: <i>Avances, alertas y proyecciones.</i>	Julio Martínez Oficial de Programa, PNUD
16:10 – 16:40	Intercambio Análisis, Valoraciones, Aprendizajes, Buenas Prácticas para réplica en otras áreas, Recomendaciones	Integrantes CDN Moderador: Oscar Barreneche Representante OPS-OMS
16:40 – 16:50	Acuerdos y Compromisos <ul style="list-style-type: none"> • PC Cuilco: Informe 2016 & POA 2017 • PC Ixil: Informe 2016 & POA 2017 • Otros 	Diego Recalde Representante FAO
16:50 – 17:00	Cierre Conclusiones y palabras de cierre	Rebeca Arias Coordinadora Residente, SNU

Oficina Ciudad de Guatemala, 15 avenida "A", 14-40 zona 10, Oakland II
Oficina San Marcos, 4 Calle 8-50, Zona 2
Oficina Santa María Nebaj, 6 Avenida 10-30, Zona 4, Cantón Tikajay





Comité Directivo Nacional

SUECIA

GUATEMALA

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala


Desarrollo Rural Integral
PROGRAMA CONJUNTO
Culco / Int



Segunda Reunión Ordinaria, 29 de Mayo 2017



Situación Municipios participantes en los PCDRÍ Índice de Pobreza, IDH, Desnutrición (2011), Gestión Municipal (2013)									
Nombre del Municipio	Pobreza Total %	Pobreza Extrema %	IDH	Índice Salud	Índice Educación	Índice Ingresos	Desnutrición Infantil	Prioridad Pacto Hambre Cero	Posición de Gestión Municipal
Promedio Nacional	64.2	32.1	0.481	0.397	0.461	0.651	49.8	# de 166	# de 333
<i>Quiché – IDH</i>									
Nebaj	85.5	29.5	0.439	0.391	0.401	0.493	78.3	7	210
Chajul	92.8	40.6	0.393	0.410	0.274	0.518	76.7	9	291
Cotzal	83.9	29.1	0.427	0.410	0.353	0.525	74.5	15	250
<i>San Marcos – Cuilco</i>									
Concepción Tutuapa	92.2	45.4	0.495	0.575	0.421	0.488	80.9	3	206
Comitancillo	90.7	44.1	0.398	0.184	0.478	0.531	77.7	8	43
San Miguel Ixtahuacan	86.4	32.8	0.502	0.488	0.499	0.520	61.5	76	93
Sipacapa	87.0	27.6	0.572	0.736	0.464	0.515	61.6	74	247
Tejutila	72.0	17.3	0.637	0.653	0.700	0.558	52.6	116	187



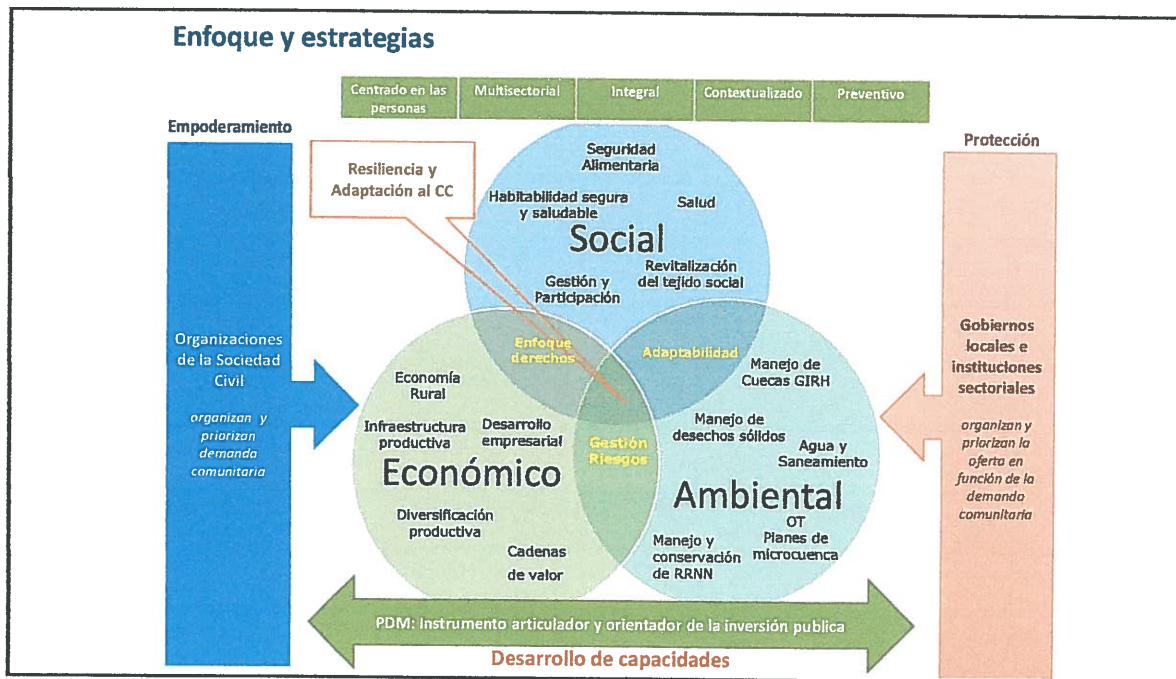

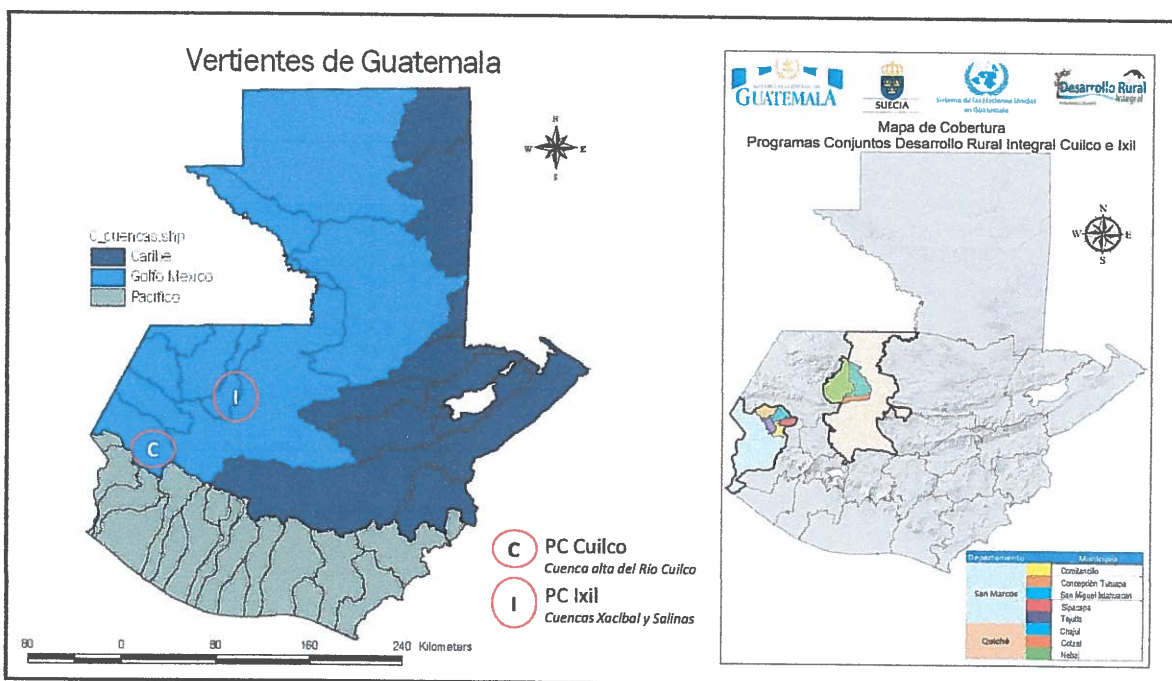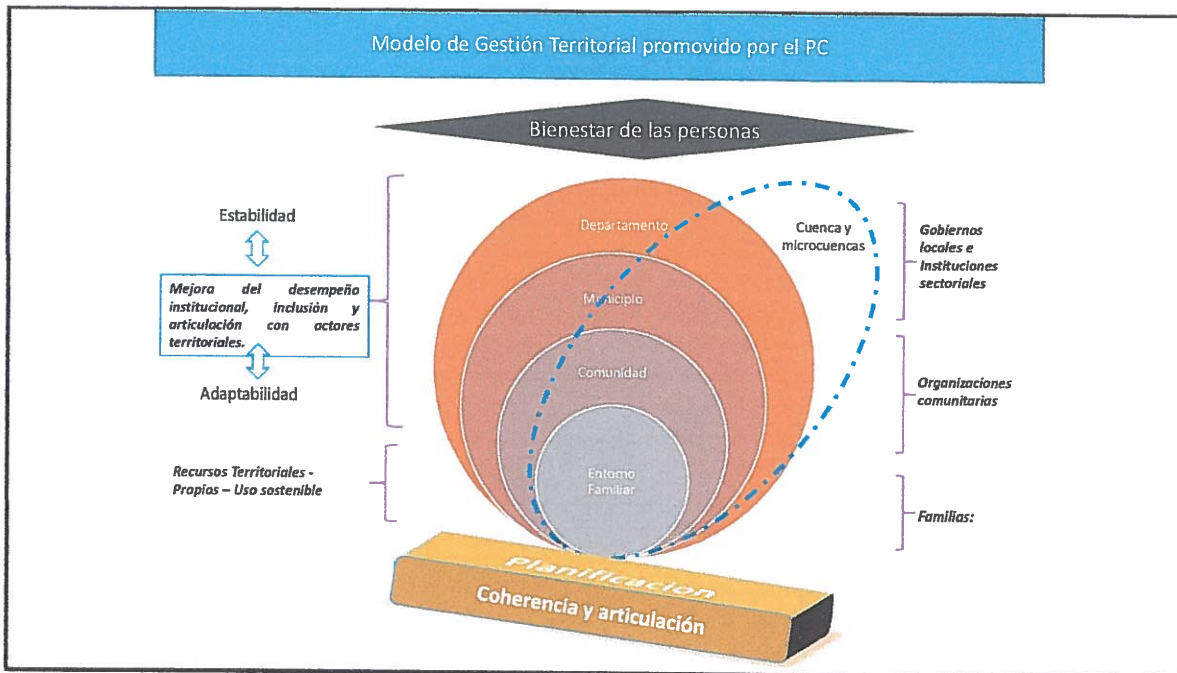

Programas Conjuntos de Desarrollo Rural Integral - PCDRI

Quiché - Ixil

Duración: Diciembre 2015 - Noviembre 2018

Monto: SEK 45 Millones (US\$5.4 Millones)

Donante: Gobierno de Suecia

Impacto Esperado:

Mejoradas las condiciones para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible de los recursos naturales en comunidades de las cuencas de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.

San Marcos - Cuilco

Duración: Diciembre 2015 - Noviembre 2018

Monto: SEK 38 Millones (US\$4.3 Millones)

Donante: Gobierno de Suecia

Impacto Esperado:

Mejoradas las condiciones para un desarrollo rural integral y el manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático en las comunidades de la cuenca del río Cuilco, de los municipios de Concepción Tutuapa, Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa y Tejutla, en el departamento de San Marcos.

PCDRI - Resultados Esperados

Quiché - Ixil

Resultado 1: (Titulares de Derechos)

Familias víctimas del EAI de infra-subsistencia y subsistencia, y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial.

Resultado 2: (Portadores de Obligaciones)

Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.



San Marcos - Cuilco



Resultado 1: (Titulares de Derechos)

Familias de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.


Resultado 2: (Portadores de Obligaciones)

Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos, y adaptabilidad al cambio climático.

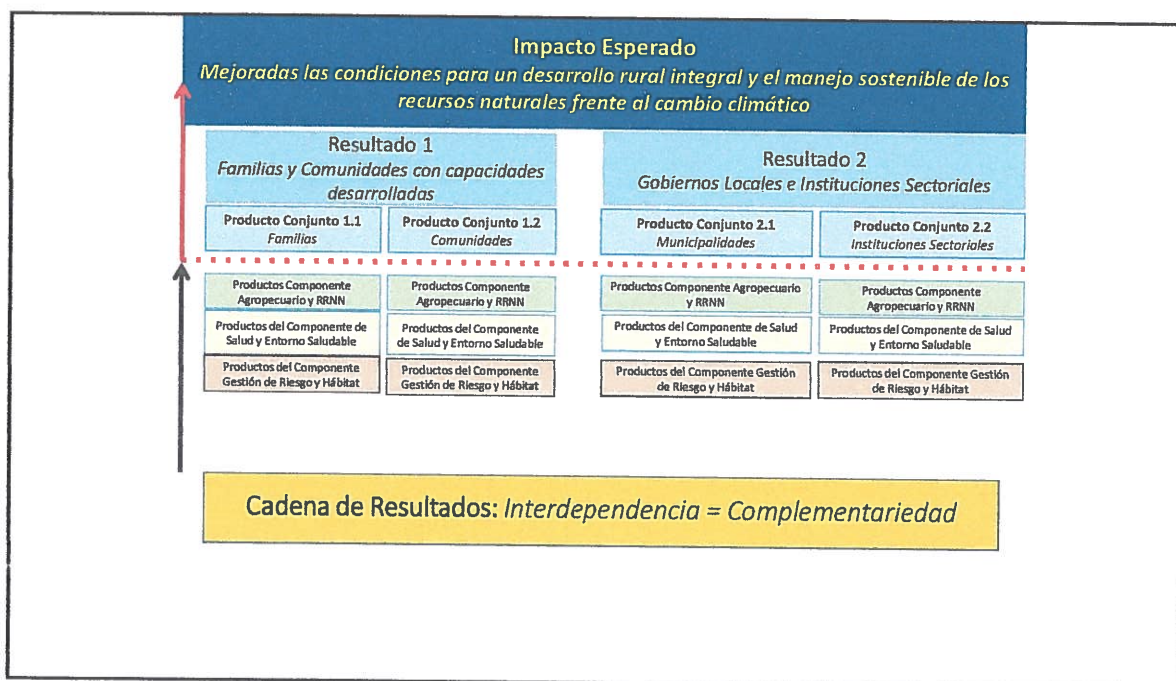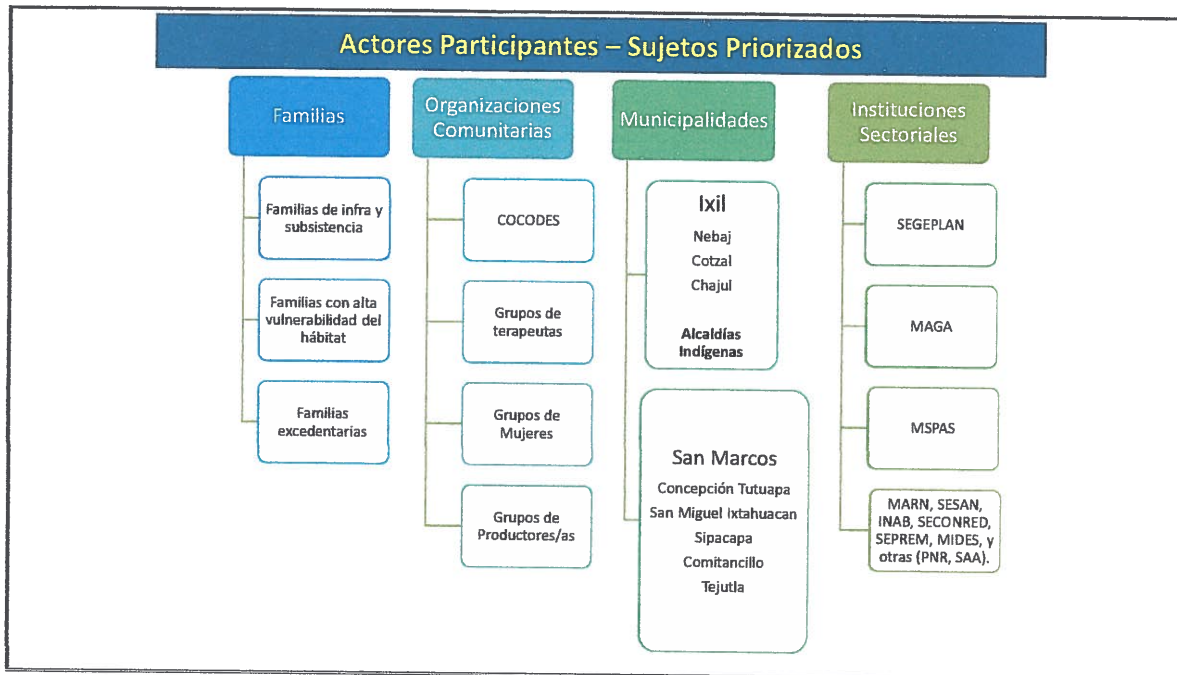


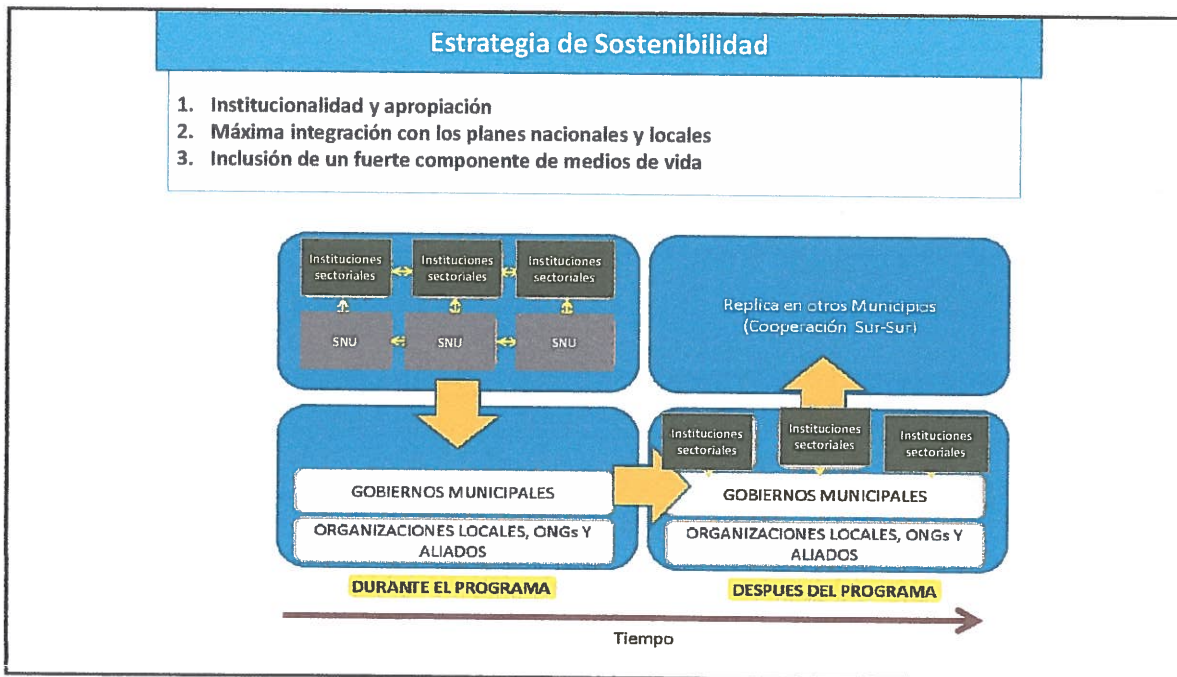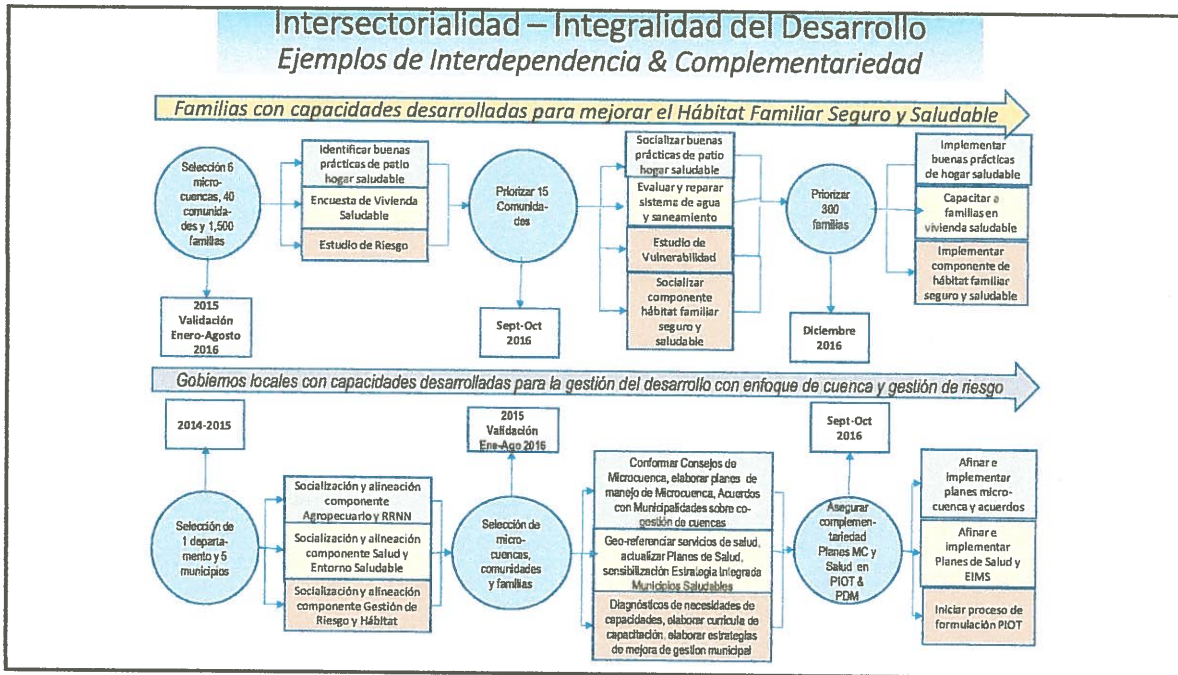


**Avances 2016
Proyección 2017**



PC CUILCO
"Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"

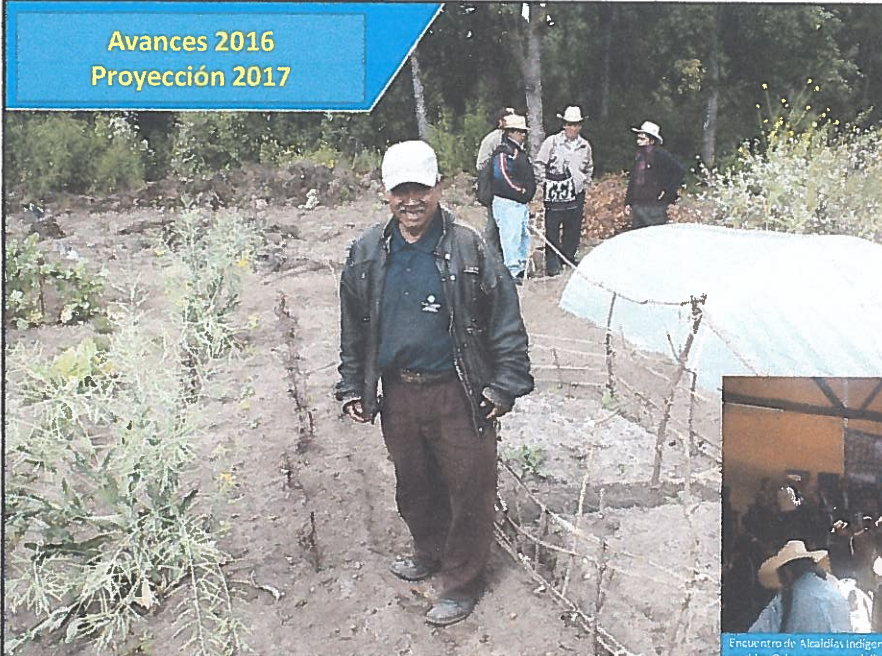



Encuentro de Alcaldes indígenas para la armonización de conocimiento y sabidurías de múltiples Orientarios para el diseño de las estrategias de revitalización del tejido social.

PC CUILCO		AREA DE INTERVENCIÓN		40 Comunidades & 1437 Familias participantes	
Cuenca	Municipio	Microcuenca	Comunidades /familias		
Río Cuilco	Tejutla 332 familias	Xolabaj	1. Chalanchac: 53	5. Armenia: 46	
			2. San Isidro : 24	6. Quipambe: 50	
	Comitancillo 312 familias	Chixal	3. Campachan: 45	7. Las Taplas: 24	
			4. Cuya: 55	8. Tojuchoc: 35	
	Concepción Tutuapa 339 familias	Lacandon	1. Los Bujes . 22	5. El Eden 32	
			2. Tuitzajaja 77	6. Molino Viejo 46	
	Sipacapa 161 familias	Tzalá	3. Tojcheche 30	7. Agua Tibia 23	
			4. Taltimiche. 57	8. Piedra de Fuego 25	
	San Miguel Ixtahuacán 286 familias	Taxaná	1. El Remate. 39	5. Tuizmo. 61	
			2. Uano Grande. 99	6. Salamá. 31	
Agua Caliente	Agua Caliente	3. Lacandon. 41	7. Lacandón Chico. 24		
		4. El Porvenir. 44			
		1. Pie de la Cuesta. 41	5. Chual. 39		
		2. Escupija. 21	6. Setiva. 11		
			4. Pueblo Viejo. 13	7. Llano grande. 22	
			1. Sholtanan. 20	2. Tzale. 20	
			3. Subcha. L20	7. Chisman. 34	
			4. Sicabe. 36	8. Las Escobas. 37	
			5. La Cumbre. 27	9. EL Pito Subchal. 17	
			6. Tierra Colorada. 27	10. Chillive. 48	

Familias desarrollan capacidades para mejorar la: Seguridad Alimentaria

Indicador	Línea Base	Meta Planificada a 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# familias que disponen de hortalizas	109 (7%)	200 (13%)	672 (47%)	700	900 (60%)
# familias que disponen huevos	263 (18%)	400 (26%)	786 (55%)	800	900 (60%)
# familias que incrementen sus ingresos por venta de productos producidos por ellas mismas	Q248/mes	150 familias capacitadas	289 familias capacitadas	240	300
% incremento en producción maíz	1.48qq	700 familias capacitadas	950 familias capacitadas	+5%	+10%
% incremento en producción frijol	0.27qq			+10%	+17%
# promotores/as comunitarios/as capacitados/as para el mejoramiento de la producción y diversificación agropecuaria de autoconsumo y para el mercado.	0	80	83	80	80
# familias asistidas por los promotores/as	300	400	657	750	1,050

- 0%-49%
- 50%-74%
- 75%-100%



Aldea Tiquachoc, Tejiata. Huertos Familiares.



Capacitación por promotores/as a familias sobre elaboración de abonos ras, Escujá, Sipacapa. Foto: Mario Cano, PC Culiaco



SAN en tu Casa

Familias desarrollan capacidades para mejorar el Hábitat Familiar

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda a 2016	Meta 2017	Meta Final
# familias mejoran las condiciones del hábitat.	300 familias disponen de un hábitat familiar inseguro y no saludable	Estudio de Riesgo	100%	300 familias priorizadas y capacitadas	300
# de familias con la estrategia de vivienda saludable implementada.		Estudio vulnerabilidad del hábitat	100%		
# de familias con medidas que permiten el acceso a agua segura y saneamiento.		15 comunidades priorizadas	100%		



Socialización Hogares Saludables Aldea Siricabe, San Miguel Interoceánico.



Estudio de la Percepción ciudadana de riesgo, alcalde auxiliares, autoridades CODUDE, líderes/esas Comunidad Bujes. Ponderando vulnerabilidades existentes en la comunidad. Foto: Erwin Castro, PC Culiaco.



Comunidad Iacandón, Concepción Tutuapa. Charla de lavado de manos en visita domiciliar. Entrega de materiales sobre VMendá Saludable. Foto: Gonzalo Ball, PC Culiaco

- 0%-49%
- 50%-74%
- 75%-100%

Organizaciones de Productores/as & Grupos de Mujeres con capacidades desarrolladas para mejorar sus Ingresos

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
% de incremento de ingresos de grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas.	Q675/mes	8 Grupos o organizaciones con emprendimientos productivos capacitados	100%	50%	80%
# de grupos de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial.	0	3 grupos de mujeres organizadas. (96)	100%	3	5



Sipacapa, Manejo de Frutales Deciduos



Capacitación sobre SAT Café a Organizaciones de Productores, Llano Grande Sipacapa. Foto: Milton Orozco, PC Cuñico

0%-49%
50%-74%
75%-100%

Familias y Comunidades desarrollan capacidades para mejorar la Salud Materna Infantil

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# familias con conocimientos sobre los servicios de salud materna infantil y otros servicios especializados que ofrecen los centros de salud.	0	500	500	1,000	1,500
# Comisiones Comunitarias de Salud Integral (CCSI) para la detección temprana y referencia oportuna de los casos de desnutrición aguda creadas o reorganizadas.	0	10	22	30	40
# CCSI conocen sus funciones en vigilancia en salud, prevención de muerte materna, desnutrición, mortalidad infantil.	0	10	22	30	40
# Centros de Recuperación Nutricional (CRN) mejorados.	0	0	1	2	2
# CCSI capacitadas en Salud Sexual y Reproductiva.	0	10	0	20	40
# COCODE participando en talleres sobre prevención de la violencia de género y violencia social.	0	10	0	20	40

0%-49%
50%-74%
75%-100%



Comunidad Cuyá, Tejutla. Diagnóstico de situación de salud y revisión de funciones con ocho comisiones comunitarias. Ejercicio de traslado seguro en caso de primeros auxilios. Foto Gonzalo Ball, PC Cuñico



Comadronas en una campaña de lactancia materna. Afiches sobre lactancia materna. San Miguel Ixtahuacan Foto Gonzalo Ball, OPS

Organizaciones Comunitarias desarrollan capacidades para mejorar la Gestión del Desarrollo Comunitario

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# de órganos de coordinación del COCODE con conocimientos de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.	0	10	14	20	40
# de COLRED con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgo en sus territorios.	8	25 comunidades prioritizadas para conformar COLRED	100%	10	25
# de Consejos de Microcuenca (CMC) conformados y fortalecidos para gestión sostenibles de microcuencas.	0	2 CMC conformados	100% Xolabaj (Tej) Agua Caliente (SMI)	3	3
# COCODE capacitados sobre importancia de manejo de microcuenca y conformación de CMC.	0	20	25	40	40
# de Planes de Microcuencas PMC.	0	Guía para elaborar PMC socializada en 3 Municipalidades	100%	2	3
# hectáreas con manejo de suelos en áreas degradadas de las microcuencas.	0	125	93	250	300



Capacitación a COCODES



Capacitación en Comunidad Qulpambe, Tejutla sobre conservación de suelos. Foto: Heber Ramos, PC Cullco.

0%-49%
50%-74%
75%-100%

Gobiernos locales desarrollan capacidades para ofrecer Salud con Calidad y Equidad

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
% de proveedores de salud de la red de servicios capacitados y fortalecidos en sus competencias en la oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, con enfoque de género e interculturalidad.	0%	25%	25%	50%	100%
% de servicios con brechas cuentan con equipamiento básico para brindar los servicios.	0%	Brechas identificadas en 5 Distritos	Brechas identificadas en 5 Distritos	25%	75%
# de Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en vigilancia epidemiológica y respuesta.	0	1	5	5	5
# de Distritos Municipales de Salud con competencias fortalecidas en gestión de servicios de salud.	0	1	5	5	5
# de Municipios que participan en la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS).	0	5 Municipios sensibilizados sobre EIMS	100%	3	5




Plan Municipal de Salud, San Manuel Antigua


0%-49%
50%-74%
75%-100%

Gobiernos locales desarrollan capacidades para la Gestión de Riesgos & Gestión de Cuentas					
Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# de Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres.	0	5 DMM Nivel I & II	100%	5 Nivel III	5 Nivel IV-V
# de Unidades Municipales de Gestión Ambiental y de Riesgo (UMGAR) con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos a desastres.	0	3 UMGAR constituidas Curricula de formación	100% (4 UMGAR)	4 Nivel I-II	4 Nivel III-IV
# de gobiernos municipales fortalecidos para la gestión de cuentas, aplican criterios de manejo de microcuenca en la gestión del desarrollo territorial.	0	5 gobiernos municipales capacitados en criterios de manejo de microcuenca y gestión de cuentas.	100%	2	3
# de comisiones municipales inter-institucionales conformadas y capacitadas para la co-gestión de cuentas.	0	2 comisiones conformadas	100%	2	2

Niveles de Capacitación		
I	Sensibilización	
II	Organización	
III	Planificación	0%-49%
IV	Gestión	50%-74%
V	Incidencia	75%-100%




Capacitación DMM (DMM) Tejutla



Visita a varios municipios y comunidades para conocer avances del PC Culico. Junio 2016.


Gobiernos locales desarrollan capacidades para la Gestión Municipal Estratégica & Democrática					
Indicador	Línea Base	Metas Planificadas 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# de Municipalidades con 1 instrumento de gestión financiera formulado e implementado.	0	a) 5 Municipalidades sensibilizadas sobre el Ranking de Gestión Municipal; b) Diagnóstico de capacidades y necesidades; c) Currícula de fortalecimiento municipal. (Nivel I: Creación condiciones; II: Diagnóstico; III: Priorización; IV: Marco estratégico; V: Planificación; VI: Gestión)	100%	5 Municipalidades con instrumento de gestión financiera en formulación. (Fase I-V)	5
# de Municipalidades con 1 instrumento de gestión de servicios públicos formulado e implementado.	0			5 Municipios con instrumento de gestión de servicios públicos en formulación. (Fase I-III)	5
# de Municipalidades con un POT formulado en la fase III Fases: I: Generación de condiciones; II: Análisis de dinámicas territoriales; III: Escenarios y directrices municipales.	0	a) 5 UMGAR desarrollan conocimientos sobre fase I del PIOT; b) Evaluación capacidades municipalidades; c) Mapeo actores que transforman el territorio.	100%	3 Municipios con fase I cumplido	3
# de COMUDE reorganizados y capacitados	0	a) Diagnóstico de organización y funcionamiento de 5 COMUDE; b) Currícula diseñada y avalada (SCEP) c) 2 COMUDE reorganizados	100%	4 COMUDE reorganizados y capacitados (nivel I-III)	5




Fortalecimiento Financiero municipal, Tejutla

0%-49%
50%-74%
75%-100%

Instituciones Sectoriales desarrollan capacidades para la Gobernanza Pacífica e Incluyente					
Indicador	Línea Base	Metas Planificadas 2016	Meta Lograda 2016	Metas 2017	Meta Final
% de avance en el desarrollo de la guía para la actualización de los PDM	0	60%	100%	Guía validada, mediada y editada	100%
% de avance en el desarrollo de la plataforma para el atlas municipal	0	20%	100%	Propuesta metodológica para articular el atlas al SINIT. Condiciones generadas para el uso de la plataforma INFORM	100%
# de escuelas participan en el programa de escuela segura y saludable	0	a) 25 escuelas priorizadas b) Curricula de formación docente-alumno creada	100%	25 escuelas participan en los niveles I y II del programa de formación (sensibilización y organización)	25
# de instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para fortalecer la coordinación interinstitucional	0	a) Diagnóstico necesidades y capacidades UTD b) POA 2016 de UTD c) Encuentro de Plataforma Interinstitucional	100% UTD & COACCYP	Plan de Formación diseñado e iniciado; POA 2017 UTD Encuentro Plataforma	20
# de técnicos capacitados para la mejora de servicios de extensión rural y apoyo a la agricultura familiar	0	a) Estrategia de capacitación b) 15 técnicos de 5 AMER capacitados (3 módulos)	a) 100% b) 80% 12 técnicos	15 técnicos capacitados	15
# de agencias de extensión implementan sistema de planificación, seguimiento y evaluación enfocado a agricultura familiar	0	5 AMER capacitadas según Plan de Capacitación 2016	100%	5 AMER capacitadas según Plan de Capacitación 2017	5




Reunión UTD, restructuración San Marcos. Parte del fortalecimiento interinstitucional. Foto Erwin Castro.




Primera reunión CGP PC Culliac, San Marcos. Agosto 2016. Foto Ivan Lungo.

0%-49%
50%-74%
75%-100%


Avances 2016
Proyección 2017






PC IXIL

Desarrollo Rural Integral en Ixil



Inicio del PC Ixil. reunión con Autoridades Ancestrales y Municipales

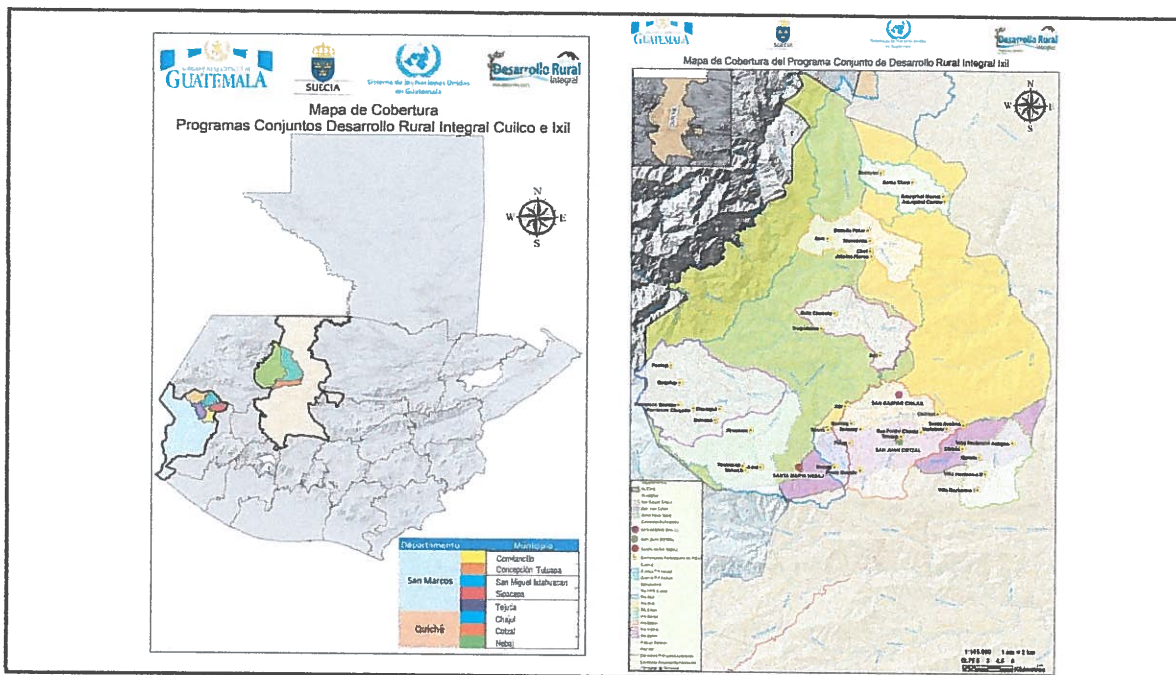

PC Ixil: Cobertura (finales 2016)					
39 Comunidades seleccionadas (Universo = 45)					
569 familias prioritizadas (25%) del Universo (2,250)					
CUENCA	MICROCUENCA	MUNICIPIO	COMUNIDADES		
			#	Nombres	
SALINAS 19 comunidades	Río Cotzaj 10 comunidades	Nebaj	1	Pexla Grande	
			2	Pulay	
			3	Santa Avelina	
			4	Vichibala	
		Cotzaj	5	Chichel	
			6	San Felipe Chenla	
			7	Tixelap	
			8	Iix	
			Chajul	9	Sontzaj
				10	Xolcuay
	Río Chipal 5 comunidades	Cotzaj	11	Villa Hortencia 1	
			12	Villa Hortencia 2	
			13	Villa Hortencia Antigua	
			14	Chisis	
			15	Quisis	
	Río Copón 4 comunidades	Chajul	16	Xecoyeu	
			17	Santa Clara	
			18	Amajchel Nuevo	
			19	Amajchel Centro	
XACLBAL 20 comunidades	Río Sichel 6 comunidades	Nebaj	20	Qeqch'ip	
			21	Paolop Grande	
			22	Parramos Grande	
			23	Parramos Chiquito	
			24	Canaquii	
			25	Xoloché	
	Río Xajal 4 comunidades	Nebaj	26	Xexocom	
			27	Xexuxcap	
			28	Acul	
			29	Uchuch	
	Río Azul 2 comunidades	Nebaj	30	Cocop	
			31	Xonca	
	Río Pumila 3 comunidades	Nebaj	32	Batz Chocola	
			33	Trapichitos	
		Chajul	34	Juil	
	Río Chel o Xachal 6 comunidades	Chajul	35	Xaxmoxan	
			36	Chel	
			37	Jala Las Flores	
			38	Ilom	
			39	Estrella Polar	
40			Comunidades seleccionadas		
2 Cuencas	8 Microcuencas	3 Municipios	39	Comunidades seleccionadas	
				Comunidades prioritizadas	
Sta. María Nebaj				16	comunidades
San Gaspar Chajul				13	comunidades
San Juan Cotzaj				10	comunidades
				24	FAO
				24	PAJUST

Familias desarrollan capacidades para mejorar la: Seguridad Alimentaria

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
% familias incrementan producción alimentos en 30%.	En proceso Junio 2017	Planes de capacitación: • Extensionistas • Promotores Buenas prácticas milpa, patio hogar y con especies menores identificadas CADER identificados Diagnostico plantas nativas y medicinales	100%	2250 familias con huertas para hortalizas, especies nativas.	Se define al conocer LB en Julio 2017
% familias aumentan en 50% número meses reserva maíz y frijol				500 familias con huertas de plantas medicinales	
% familias implementan al menos 2 prácticas agropecuarias.				1000 familias con buenas prácticas milpa	
# familias con sistemas de captación de agua para riego.				1000 instalaciones para especies menores	
				45 CADER establecidos y fortalecidos	

0%-49%
50%-74%
75%-100%



Reconocimientos de prácticas CADER en Vichibala, Cotzal



Nombramiento promotores agropecuarios Comunidad Pulay, Nebaj.

Familias desarrollan capacidades para mejorar el Hábitat Familiar Seguro y Saludable

Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# familias con una práctica de mejora de condiciones de habitabilidad implementada.	0	• Enfoque de hábitat familiar seguro socializado con SEGEPLAN/DMP; • Instrumento para priorizar familias diseñado y validado (SEGEPLAN/CONRED).	100%	• Índice de vulnerabilidad de comunidades; • 15 comunidades priorizadas • Análisis vulnerabilidad familias; • 200 familias priorizadas inician procesos capacitación.	300
# de sistemas de abastecimiento de agua comunitarios mejorados.	0	• Proceso evaluación sistemas de agua y saneamiento diseñado e iniciado; • Material educativo agua y saneamiento para familias diseñado y producido; • Proceso para conformar y fortalecer Comités de Agua iniciado con Consejos Municipales.	100%	• 15 comunidades con sistemas de agua y saneamiento evaluados; • Red de fontaneros de Comités de Agua creada; • 15 Sistemas de Agua con reparaciones realizadas.	15
# familias con acceso a sistemas de abastecimiento de agua mejorados.	0				Se define al tener priorizados 15 comunidades
# familias con sus hábitos nutricionales y de higiene mejorados.	0	Acciones iniciaron en 2017		• Buenas prácticas identificadas y priorizadas para acceso a agua segura; • 100 familias implementan sistemas para filtrar aguas grises para re-uso productivo	300







Reunión Análisis de Gestión de Riesgo, Red DMP, Sta Cruz Quiché



0%-49%
50%-74%
75%-100%

Familias y Comunidades desarrollan capacidades para mejorar la Salud Materna Infantil					
Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final
# mujeres en control prenatal.	Estudio LB en proceso Junio 2017	<ul style="list-style-type: none"> Diplomado Epidemiología Básica realizado; Actualización arbovirosis (Zika, Chikungunya y Dengue) brindada a Unidad de Vectores y Epidemiología; Proceso de diálogos interculturales con enfoque del Modelo Inuyente de Salud (MIS) diseñado e iniciado; Material nutricional reproducido para Comisiones Salud; Estrategias temas maternos, neonatales, salud mental y saneamiento definidas con DAS/MSPAS; Necesidades capacitación personal y equipamiento red servicios salud identificadas. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> 1150 familias capacitadas en signos y señales peligro para reducción muerte materna; 1000 comadronas registradas en servicios salud y capacitadas según normativa con enfoque MIS; 50 camillas emergencia entregadas a Comisiones Salud; Diálogo Intercultural iniciado servicios salud, comadronas y terapeutas; 15 comunidades con huertos medicina tradicional en servicios salud. 	 <p>PC Intl. Diagnóstico de necesidades de equipamiento en puesto de salud Chel Chajul. Foto: Jorge Cardano.</p>  <p>10 Reglas de Oro. Para vivir las mejores condiciones de vida por alimentos y agua.</p>
# mujeres embarazadas suplementadas con hierro y ácido fólico.					
# niños menores de 2 años en control de crecimiento.					
# familias incrementan sus conocimientos sobre signos y señales de peligro de muerte materna.					
# comadronas conocen los signos y señales de peligro durante el embarazo, parto, postparto y recién nacido, y refieren oportunamente.					
# comisiones de salud conformados y funcionando.					

Familias con oportunidades de mejorar sus Ingresos					
Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda a 2016	Meta 2017	Meta Final
# grupos de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial.	0	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta trabajo con grupos mujeres socializada con SEPREM/DMM. TDR para identificar grupos mujeres y potencialidades mercado diseñados y criterios definidos para priorizar grupos mujeres. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> 2 grupos mujeres integradas para participar en programa emprendimientos no agrícolas; Primer módulo curricular formación desarrollo empresarial implementado con 2 grupos mujeres; Gira intercambio experiencias entre grupos mujeres con emprendimientos exitosos. 	 <p>Coordinación de actividades con grupos de mujeres con DMM y Comisión Municipal de la Mujer, Nebaj.</p>
# grupos de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementadas.	0				
# familias que conforman MIPYME asociativas de café y hortalizas mejoran sus sistemas de producción, información y comercialización.	0				
# familias con alianzas comerciales para la vinculación de pequeños productores/as de café y hortalizas.	Estudio LB en proceso				
# mujeres que pertenecen a CADER que mejoran sus ingresos a través de nuevos emprendimientos agrícolas establecidos.	0				

Organizaciones Comunitarias desarrollan capacidades Gestión del Desarrollo de su Territorio						
Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final	
# COCODE con conocimientos sobre sus funciones, según establecido en Ley Consejos Desarrollo Urbano y Rural (CODEUR), con instrumentos de gestión y equipados.	Estudio LB en proceso Junio 2017	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento evaluación COCODE diseñado y consensado con SEGEPLAN/DMP; 30% avance diseño curricula. 	100%	Diagnóstico COCODE Curricula Formación 16 COCODE capacitados 1 modulo (Sensibilización) y con insumos oficina	45	 <p>Visita para socialización del PC a comunidad de Pexla, Nebaj con líderes comunitarios y de comité de víctimas.</p>
# de COLRED capacitadas sobre la gestión de riesgo en sus territorios, con planes de emergencia y equipadas.		<ul style="list-style-type: none"> Estado COLRED definido; Criterios priorización comunidades definidos. 15 COLRED priorizadas. 	100% 100% 0%	15 COLRED conformadas y reorganizadas	15	
# de jóvenes capacitados en gestión de riesgo (GLR).	0			Grupos jóvenes identificados. Diagnóstico y curricula. 3 grupos formados etapa 1 sensibilización	PD/LB	
# de Consejos de Microcuena (CMC) conformados, capacitados en manejo sostenibles de microcuencas, y con planes de microcuencas diseñados.	0	COCODE, alcaldes comunitarios, líderes/esas, de comunidades de microcuencas Ríos Azul y Cotzal con información y sensibilización sobre organización consejos microcuena y manejo sostenibles de microcuena.	100%	3 CMC conformados con planes de inversión, regeneración y manejo de 3 microcuencas	PD/LB	
# hectáreas con manejo de suelos en áreas degradadas de las microcuencas.	0			100 hectáreas 6 viveros	PD/LB	


Familias y Comunidades desarrollan capacidades Salud Mental y Prevención de Violencia						
Indicador	Línea Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final	
# jóvenes participando en acciones de la estrategia de Estilos de Vida Saludables.	Estudio LB en proceso. Junio 2017	Grupo de jóvenes identificado y capacitado para desarrollar actividades, herramientas y reproducir acciones a jóvenes en comunidades participantes. Diagnóstico capacidades y preferencias lúdicas.	100%	Red de jóvenes creado para incidir en estilo vida saludable, derechos y participación ciudadana.	Por definir con base en LB. Julio 2017	 <p>PC Idl. Presentación Estrategia Municipios Saludables. Salon Municipal San Juan Cotzal. Foto: Carlos Gallego, Promotor de Salud</p>
# Comisiones de Salud capacitadas en salud mental y prevención de violencia.		Material preparado para capacitar a comunidades en prevención de violencia intrafamiliar, violencia basada en género y uso de sustancias nocivas.		Comisiones salud capacitadas en salud mental, prevención violencia y rutas de denuncia		
% familias en riesgo de abuso de alcohol y violencia doméstica que participan en procesos de capacitación con modelo psicopedagógico.		Líderes comunitarios seleccionados y participando en capacitación y réplica de conocimiento sobre salud mental. Diagnóstico necesidades de equipamiento de espacios amigables en tres distritos.		3 eventos lúdico-pedagógicos con familias para prevención violencia y prevención consumo de sustancias.		

0%-49%
50%-74%
75%-100%

Gobiernos locales desarrollan capacidades Gestión del Desarrollo Saludable y Resiliente						
Indicador	Línea a Base	Meta Planificada 2016	Meta Lograda 2016	Meta 2017	Meta Final	
# Municipios que participan en la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS).	0	• Gobiernos y autoridades locales sensibilizados sobre EIMS, Estrategia de Escuelas Saludables y Estrategia de Municipios Verdes;	100%	• 3 Planes Municipales de Salud diseñado y en implementación;	3	 <p>Autoridades Municipalidad Cotzal y SEGEPLAN, generación condiciones fortalecimiento Gestión Municipal</p>
# Municipios con diagnósticos para aplicación de energías alternativas.	0	• Condiciones generadas para elaborar los Planes Municipales de Salud;	33%	• Inicio elaboración Planes Municipales Prevención Violencia;	3	
# Planes Municipales de Salud (PMS) que integran aplicación de energía alternativa.	0	• Diagnósticos para la aplicación de energías alternativas realizadas.	0%	• Ferias realizadas sobre deterioro Medio Ambiente, Municipios y Escuelas Saludables.	3	
# Municipios con COMUDE capacitado.	0	• Tres municipios sensibilizados, con análisis brechas de capacidades gestión municipal;	100%	• COMUSAN funcionando con POA y reglamento;	3	 <p>Taller con Autoridades indígenas de la región Ixil, Octubre de 2016. Nebaj, El Quiché.</p>
# Municipios con instrumento de gestión.	0	• Instrumento de gestión para el fortalecimiento municipal diseñado;	100%	• Diagnostico funcionamiento DMP y DMM finalizado;	3	
# Estrategias para incrementar recaudación de ingresos municipales.	0	• Instrumento de gestión de la COMUSAN diseñado;	70%	• 1 Municipio con estrategia recaudación ingresos;	3	
# Estrategias para mejorar gestión servicios públicos (cobertura y calidad)	0	• Diagnóstico de desempeño de DMP y DMM realizado.	100%	• 2 COMUDE formados nivel I y con instrumentos de gestión.	3	
# Municipios con estrategia de municipio resiliente diseñada	0	<i>Acciones iniciaron en 2017</i>		Programa de municipios resilientes formulado.	3	
# Municipios con programa diseñado para promover cultura Ixil.	0	• Ruta fortalecimiento Consejo Autoridades Ancestrales Maya Ixiles desde su cosmovisión;	100%	• Consejo Mayores consolidado;	3	
		• Plan de Vida con para recuperación y revitalización de tejido social (25%)		• Plan de Vida (60%);		<p>0% - 49%</p> <p>50% - 74%</p> <p>75% - 100%</p>
				• Diplomado Cultura de Paz y Resiliencia (60%)		
				• Carta Entendimiento Autoridades Ancestrales y Municipales		

Instituciones Sectoriales desarrollan capacidades Gobernanza Pacífica e Incluyente						
Indicador	Línea Base	Metas Planificadas 2016	Meta Lograda 2016	Metas 2017	Meta Final	
# mesas diálogo implementadas que impulsan gobernanza y tenencia tierra, con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres.	Estudio LB en proceso	Mapeo realizado de actores y acciones que realizan en el territorio para el abordaje de la problemática relativo a la tenencia de la tierra en el Ixil.	70%	• Mapeo finalizado;	Par Definir al conocer LB	
# mecanismos articulación SAA y familias diseñados e implementados.						• Comisión Diálogo Ixil fortalecida;
# actores sociales de las mesas capacitadas en DVGT (Directrices Voluntarias Gobernanza Responsable de Tenencia Tierra, Basque y Pesca)						• SAA capacitada en DVGT y con asistencia técnica.
% avance desarrollo guía actualización PDM	0	• Diagnóstico necesidades activos (mobiliario y equipo), y plan desarrollo capacidades SEGEPLAN formulado;	100%	• Guía alineación PDM	100%	
% avance desarrollo plataforma atlas municipal	0	• 60% avance diseño guía alineación PDM al PND K'atun 2032;	75%	• Equipamiento Delegación SEGEPLAN	100%	
		• Red DMP departamental con conocimientos metodología para incorporar gestión riesgo proyectos inversión pública;	100%	• Comisión Cooperación Internac. reactivada;		
		• 60% avance elaboración propuesta articular atlas de riesgo dentro plataforma SINIT.	100%	• Plataforma atlas riesgo 100%		
# instituciones sectoriales participan en mecanismo coordinación interinstitucional y conocen las funciones.	Estudio LB en proceso	• Plataforma Coordinación Interinstitucional local conoce enfoques, dimensiones, líneas estratégicas, resultados y sujetos priorizados del PC;	100%	• Diagnóstico UTD;	Par Definir al conocer LB	
						• POA 2017 UTD;
						• Encuentro Plataforma;
						• Lineamientos Intervención sectorial en PCRII establecida;
						• Red de DMP y Plataforma Institucional con coordinación y seguimiento.
		• 75% avance diagnóstico capacidades Unidad Técnica Departamental (UTD);	80%			
		• Acciones intervención articulada definidas (SEGEPLAN, INFOM, CONRED, MINEDUC, SESAN, SEPREM)	100%			
		• Encuentro Plataforma local desarrollado;	100%			
		• 50% avance formulación o adaptación programa de desarrollo capacidades UTD.	100%			

Instituciones Sectoriales desarrollan capacidades Gobernanza Pacífica e Inuyente, Salud Integral, Espacios Amigables, Escuelas Saludables								
Indicador	Línea Base	Metas Planificadas 2016	Meta Lograda 2016	Metas 2017	Meta Final			
# Diagnósticos condiciones mínimas atención para los Centros de Atención permanente /CAP)	0	3 Diagnósticos condiciones mínimas atención CAP elaborados.	100%	<ul style="list-style-type: none"> 3 Planes de Mejora; 3 Distritos fortalecidos en abordaje situación nutricional, materno infantil, farmacoterapia, y otros; Fortalecimiento redes para implementación MIS, gestión de servicios, referencias y contra-referencias institucional y con personal comunitario (terapeutas); 400 personal de salud con información del enfoque intercultural y derechos a salud; Personal no especializado con conocimiento sobre salud mental. 	3			
# Planes de mejora distritales gestión e implementación cambios en servicio salud.	0	Acciones iniciaron en 2017			3			
% avance en fortalecimiento de redes locales salud.	0				100%			
# personal salud no especializado que incrementan conocimientos salud mental.	0				PD/LB			
# Espacios Amigables creados, puestos en marcha, con servicios mejorados en los distritos de salud.	0	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico condiciones iniciales; Plan de Trabajo con base en condiciones encontradas. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Equipamiento Espacios Amigables; Jóvenes y personal institucional capacitados para replicar actividades lúdicas en comunidades; 24 comunidades con presentaciones de teatro. 	3			
# Escuelas participan en programa de escuela segura.	0	Acciones iniciaron en 2017		<ul style="list-style-type: none"> 15 Escuelas identificadas; Curricula formación docente diseñada; 25 Docentes formados (Cultura, paz y resiliencia); 15 Escuelas con índice seguridad y consejos educativos. 	15			
<table border="1"> <tr> <td>0%-49%</td> </tr> <tr> <td>50%-74%</td> </tr> <tr> <td>75%-100%</td> </tr> </table>						0%-49%	50%-74%	75%-100%
0%-49%								
50%-74%								
75%-100%								

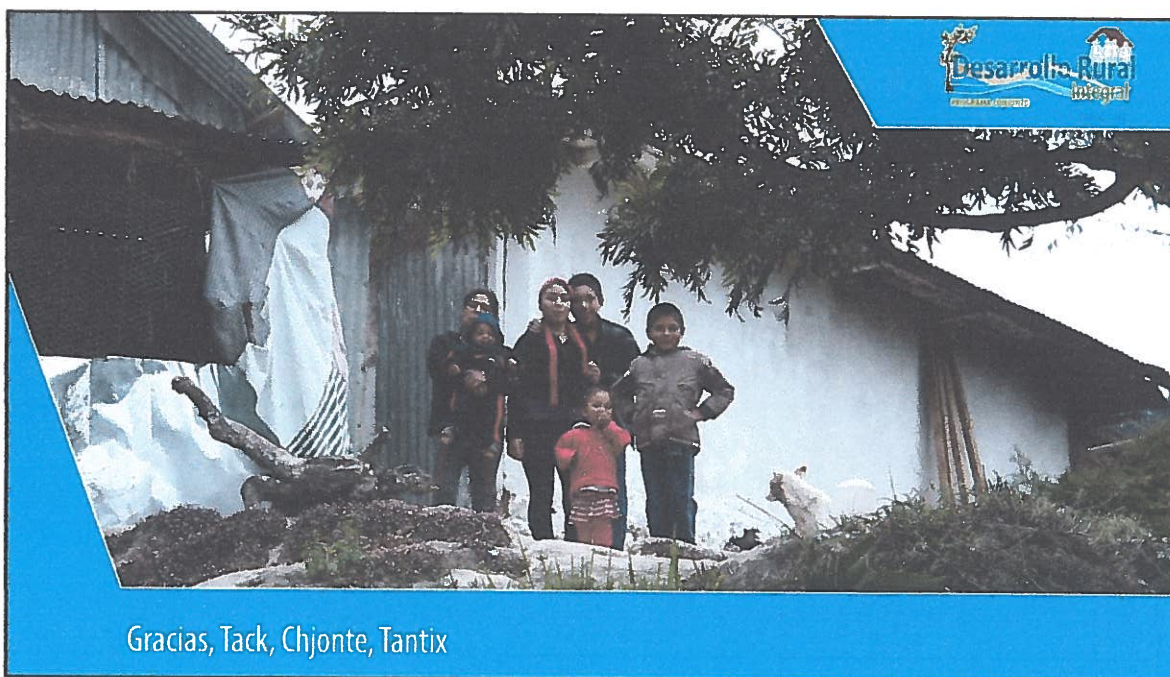

Gracias, Tack, Chjonte, Tantix
