



Titre du projet : Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti

Numéro du projet : 00103055

Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement (MdE)

Date de début : Mars 2018 **Date de fin :** Mars 2023 **Date de réunion du COPIL :** 21/10/2021

Justification de la révision substantive

Le Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Ministère de l'Environnement a démarré en mars 2018 et a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours en 2021. Des retards considérables dans le lancement des travaux de construction du site de décharge de Jérémie représentent un défi majeur à cause de la non-disponibilité de terrain approprié. Plus d'une dizaine de terrains ont été visités par des équipes multidisciplinaires du PNUD, de la Mairie, de la société civile et du MDE, notamment avec le Bureau National des Evaluations Environnementales.

Au regard de cette réalité, les partenaires de mise en œuvre (MDE et PNUD) ont eu plusieurs discussions, en consultation avec la mairie de Jérémie, pour analyser la situation. Les conclusions de ces discussions ont été soumises à l'attention du Comité de Pilotage (MDE, Ambassade du Japon et PNUD) le 21 octobre 2021 pour décider de la suite à donner à la mise en œuvre du projet. Il en résulte des modifications substantives dans les activités avec une implication budgétaire associée. Ces modifications portent spécifiquement sur les points suivants :

- a) la composante infrastructures à Jérémie sera relocalisée aux Cayes et le budget prévu sera révisé et redistribué pour faciliter l'exécution des changements adoptés.
- b) des interventions planifiées sur La Saline (le site de Jérémie) seront budgétisées et mises en œuvre sur la base d'une étude des risques liés à son exploitation et d'autres actions susceptibles de le valoriser tout en adoptant des mesures de mitigation appropriées.

Les révisions substantives sont présentées dans le plan de travail et le cadre des résultats ci-joints.

Effet contributif du Descriptif de programme de pays du PNUD :

Les institutions nationales, régionales et locales ainsi que la société civile améliorent la gestion des zones urbaines et rurales, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que les mécanismes de prévention et de réduction des risques, afin d'améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.

Produits indicatifs :

3.2 Des mécanismes et partenariats sont mis en place pour promouvoir des modes de production, de distribution et de consommation durables.

Total des ressources nécessaires :	8 556 934.41 US	
Total des ressources allouées :	TRAC du PNUD :	525 967.41 US
	Japon :	8 030 967 US
	Gouvernement :	
	En nature :	

Lu et approuvé par (signatures) :

Gouvernement Ministère de la Planification et de la Coopération Externe	Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l'Environnement	Programme des Nations Unies pour le développement
Ricard Pierre, Ministre du MPCE	James CADET, Ministre du MdE	Fernando HIRALDO, Représentant Résident PNUD-Haïti
Date : 16/02/2022	Date : 30/10/2021	Date :

Liste des Annexes

Annexe 1 : Le nouveau cadre de résultats

Annexe 2 : Le Plan de travail /budget pluriannuel

Annexe 3 : La théorie de changement

Annexe 4 : Compte Rendu de la réunion du Comité de Pilotage du 21 octobre 2021



CR COPIL octobre
2021.pdf

Annexe 5 : Le Document de projet



ProDoc_signe
Dechet 1 mars 2018.

Annexe 6 : Le dernier document de révision substantive



Justification de la
révision sustantive -

ANNEXE 1

CADRE DE RÉSULTATS

<p>Effets attendus comme indiqué dans le cadre de résultats et d'allocation des ressources du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) /du programme de pays [ou du programme mondial/régional] :</p> <p>Les institutions nationales, régionales et locales ainsi que la société civile améliorent la gestion des zones urbaines et rurales, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que les mécanismes de prévention et de réduction des risques, afin d'améliorer la résilience de la population aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.</p>
<p>Indicateurs d'effets, comme spécifiés dans le Cadre de ressources et de résultats du programme national [ou mondial/régional], comprenant la ligne de base et cibles :</p>
<p>Résultats applicables du Plan stratégique du PNUD :</p> <p>3.1 Les acteurs nationaux ont les connaissances, les capacités et les outils nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles ainsi que la réduction et la gestion des risques.</p> <p>3.2 Des mécanismes et partenariats sont mis en place pour promouvoir des modes de production, de distribution et de consommation durables.</p>
<p>Titre du projet : Projet de renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti</p>
<p>Numéro de projet dans Atlas : 00103055</p>
<p>Award ID : 00099802</p>

PRODUITS ESCOMPTÉS	INDICATEURS	SOURCES DES DONNÉES	SITUATION DE RÉFÉRENCE		CIBLES (par fréquence de recueil des données)						MÉTHODE DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS	
			Valeur	Année	2019	2020	2021	2022	2023	Final		
1.1 Le processus d'amélioration du cadre juridique actuel (Loi du 21 septembre 2017 créant le SNGRS) est soutenu par un mécanisme de consultation participatif et inclusif et un processus de plaidoyer.	1.1.1. Nombre de groupes thématique sous-(tables sectorielles) mis en place assortis de termes de référence pertinents et réalistes	Procès-verbaux de réunions / rapports d'activité / document des TDR	0	2018	0	1					1	Examen de procès-verbaux de réunions de travail / Liste de participation / examen du document des TDR
	1.1.2. Nombre d'activités de consultation et/ou de réflexion organisé ou appuyé par le projet sur le cadre juridique et/ou la problématique du secteur de la GDS en Haïti	Rapports d'activités, procès-verbaux de réunions / document de protocole d'accord	0%	2018	0	3	0	1			4	Liste de participation / examen de rapport d'activités, de procès-verbaux de réunions ou de protocoles d'accord
	1.1.3. % de femmes parmi les participants aux activités de consultation et/ou de réflexion sur le cadre juridique et/ou la problématique du secteur de la GDS en Haïti	Rapports d'activités, procès-verbaux de réunions	0%	2018	0%	30%	00%	30%			30%	Liste de participation / examen de rapport d'activités ou de procès-verbaux de réunion
1.2 La définition d'une stratégie nationale durable en matière de GDS est supportée par le projet.	1.2.1. Nombre d'entités étatiques dont les capacités en GDS ont été renforcées par le projet.	Rapports d'activités de formation ou d'assistance technique / document de planification, de budget ou de stratégie des ministères / liste de matériels de GDS remis	0	2018	2	1	2	0			5	Examen des rapports / visites et/ou réunions avec les ministères / examen de documents disponibles

PRODUITS ESCOMPTÉS	INDICATEURS	SOURCES DES DONNÉES	SITUATION DE RÉFÉRENCE		CIBLES (par fréquence de recueil des données)						MÉTHODE DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS	
			Valeur	Année	2019	2020	2021	2022	2023	Final		
1.3 Des partenariats sont établis avec des universités pour la recherche et l'innovation au profit de la GDS (recyclage, financement, etc.).	1.3.1. Nombre d'accords de coopération conclu avec des centres de recherche et/ou des universités.	Documents d'accord / rapports d'activités	0%	2018	1	1					2	Examen des rapports et/ou des documents d'accord
	1.3.2. Nombre d'articles scientifiques et/ou mémoires de recherche réalisés et publiés sur la GDS avec des recommandations réalistes sur la stratégie efficace à adopter par le secteur GDS	Documents produits / rapports d'activités / revue scientifiques	0%	2018		0	0	6			6	Examen de rapports d'événement / publication de mémoires et d'articles / recherche dans les revues scientifiques / procès-verbaux de réunions avec les universités partenaires
	1.3.3. % de femmes parmi les chercheurs ayant produits les articles scientifiques et/ou les mémoires publiés	Rapports d'activités, procès-verbaux de réunions	0%	2018				30%			30%	Liste des chercheurs / examen de rapport d'activités ou de procès-verbaux de réunions
1.4 Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer est menée auprès du grand public et de groupes d'agents de changement ciblés pour promouvoir un plan stratégique efficace en faveur de la gestion des déchets solides	1.4.1. Nombre d'événements public de masse ou de manifestations de plaidoyer réalisés à travers le pays	Rapports d'activité / procès-verbaux d'événements / protocoles d'accord conclus avec des organisateurs d'événements	0	2018	7	11	3	2			23	Liste de participation, vidéos, photos, examen de rapports d'activités
	1.4.2. Nombre de personnes directement touché par les événements (par sexe)	Rapports d'activité / procès-verbaux d'événements	0	2018	2500	2000	250	250			5000	Liste de participation, vidéos, photos, examen de rapports d'activités
	1.4.3. Nombre de supports de communication produit et diffusé au grand public	Rapport d'activité / documents de contrats ou de protocoles d'accord	0	2018	2	7	2	1			12	Examen de rapports d'activités et de documents / Disponibilité des documents de contrats ou protocoles d'accord
2.1 Un programme efficace d'éducation et de sensibilisation à la gestion des infrastructures et services appropriés de GDS est parrainé pour améliorer la santé publique et accroître la protection de l'environnement	2.1.1. Nombre de personnes formées ou ayant participé dans des sessions d'assistance technique sur la GDS dans les municipalités	Rapports de formation ou d'assistance technique / Procès-verbaux d'activité	0	2018	273	1789	100	88			2250	Analyse de rapports / liste de participation / documents de formation
	2.1.2. % de femmes formatrices parmi les membres des communautés ayant reçu une formation de formateurs	Rapports d'activités/ Procès-verbaux d'activités	0%	2018	0%	26%	35%	35%			30%	Examen de rapports d'activités / liste de formateurs locaux
	2.1.3. Nombre de participants aux ateliers thématiques organisés par les communautés	Rapports d'activité/ Procès-verbaux d'événements	0	2018	100	250	250	200			800	Analyse de rapports / liste de participation / photos / vidéos

PRODUITS ESCOMPTÉS	INDICATEURS	SOURCES DES DONNÉES	SITUATION DE RÉFÉRENCE		CIBLES (par fréquence de recueil des données)						MÉTHODE DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS	
			Valeur	Année	2019	2020	2021	2022	2023	Final		
2.2 Les parties prenantes locales et les municipalités sont soutenues pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de GDS locaux tenant compte de la notion de genre, fondés sur la politique nationale.	2.2.1. Nombre de municipalités ou d'arrondissements disposant d'un plan de GDS.	Plans de GDS élaborés / Rapports d'activité/ contrats et/ou rapports de consultation	0	2018	0	3					3	Examen de rapports, réunions avec les municipalités, évaluation d'activités
	2.2.2. Nombre d'organisations communautaires impliqué dans les efforts de GDS.	Rapports d'activités / protocoles d'accord avec les organisations	0	2018	27	13					40	Examen de rapports, visites de terrain, réunions de travail
	2.2.3. Nombre d'études réalisé sur la composition des déchets et les options de recyclage viables	Documents d'étude / Rapports d'activités	0	2018	1						1	Examen de rapports, réunions avec les municipalités, évaluation d'activités
	2.2.4. % de femmes impliqué dans le processus d'élaboration des plans de GDS	Rapports d'activités / procès-verbaux de rencontres communautaires	0	2018	30%						30%	Liste de participation aux réunions / examen de rapports d'activités / vidéos / photos
2.3 Les capacités internes des municipalités pour assurer la gouvernance du secteur de la GDS sont renforcées.	2.3.1. Nombre de groupes communautaires sur la GDS établi et/ou renforcé dans le cadre du projet et activement impliqué dans la GDS	Rapports d'activités / procès-verbaux	0	2018	27	27	27	27			27	Examen de rapports et de procès-verbaux / liste de participation / réunions avec les groupes
	2.3.2. Nombre de municipalités dont les capacités ont été renforcées pour la mise en œuvre d'un système de gestion des déchets solides.	Rapports d'activité / rapports d'évaluation / Document de réception par les autorités locales / rapports de voyages d'échange	0	2018		2	2	2	2		2	Enquêtes auprès des municipalités / examen de rapports / liste de d'équipements / réunions avec les municipalités
	2.3.3. Nombre d'organisations de femmes ou de groupes dirigés par des femmes renforcé pour appuyer les efforts de GDS dans leur commune	Rapport d'activités / liste de membres	0	2018		1	1				2	Examen de rapports d'activité / liste des membres /procès-verbaux de réunions
2.4 Une communauté plus respectueuse du principe des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets) est établie au moyen de la promotion des meilleures	2.4.1. Nombre de familles impliqué dans le recyclage et/ou le compostage domestique de déchets solides	Rapports d'activités	0	2018		15	20	15			50	Examen de rapports, visites de terrain, réunions avec les familles
	2.4.2. Nombre d'organisations impliqué dans le recyclage, la production et/ou la promotion du compost à partir des déchets solides	Rapports d'activités / procès-verbaux	0	2018		1	2	2			5	Examen de rapports, visites de terrain, liste de participation

PRODUITS ESCOMPTÉS	INDICATEURS	SOURCES DES DONNÉES	SITUATION DE RÉFÉRENCE		CIBLES (par fréquence de recueil des données)						MÉTHODE DE RECUEIL DES DONNÉES ET RISQUES Y RELATIFS
			Valeur	Année	2019	2020	2021	2022	2023	Final	
<i>pratiques identifiées dans les trois zones cibles du projet</i>	<i>2.4.3 Nombre de personnes sensibilisé et/ou informé sur la transformation des déchets en compost et/ou produits artisanaux</i>	Rapports d'activités	0	2018	250	1500	500	250		2500	<i>Examen de rapports, liste de participation, réunions avec les communautés</i>
	<i>2.4.4. Nombre de femmes formé et engagé dans la transformation des déchets solides en compost et/ou produits artisanaux</i>	Rapports d'activités / procès-verbaux de discussions	0	2018			15	5		20	<i>Examen de rapports, visites de terrain, liste de participation, réunions avec les communautés</i>
<i>2.5 Des activités génératrices de revenus liées au traitement des déchets sont développées pour améliorer les conditions de vie des populations les plus marginalisées de l'emploi formel, notamment les femmes et les jeunes.</i>	<i>2.5.1. Nombre d'emplois créé par les activités génératrices de revenus appuyées par le projet</i>	Rapport d'activité / documents de support / rapport des entreprises parrainées	0	2018			25	25		50	<i>Examen de rapports, visites de terrain, liste de travailleurs</i>
	<i>2.5.2. Nombre de microentreprises et d'entreprises individuelles créées et/ou renforcées</i>	Rapport d'activités / accords signés / documents de support	0	2018		2	2	2		6	<i>Examen de rapports et de documents d'accord, visite de terrain</i>
	<i>2.5.3. Nombre d'entreprises créés et ou renforcées dirigé ou géré par des femmes</i>	Rapport d'activités / accords signés / documents de support	0	2018			1			1	<i>Examen de rapports et de documents d'accord, visite de terrain</i>
<i>3.1 Des études de faisabilité ont été réalisées incluant un avant-projet détaillé et une étude technique, sociale, environnementale.</i>	<i>3.1.1. Nombre de rapports d'études avec des recommandations claires et réalistes produit et approuvé</i>	Rapport d'activité / documents de rapport / contrats signés	0	2018				2		2	<i>Examen de rapports et de documents d'études.</i>
<i>3.2 La mise en place et/ou la construction et la mise en service des infrastructures de GDS sont menées à bien.</i>	<i>3.2.1. Nombre de municipalités ayant des infrastructures et équipements de GDS opérationnels pour la collecte, le transport, le recyclage et l'élimination des déchets solides</i>	Rapport d'activité / rapport de fin de travaux	0	2018					2	2	<i>Examen de rapports, visites de terrain, réunions avec les municipalités</i>
	<i>3.2.2 % de femmes parmi les gestionnaires des infrastructures de GDS</i>	Rapports d'activités / PV de comité de gestion	0%	2018				30%	30%	30%	<i>Liste des membres du comité / examen de rapports ou de PV</i>
<i>3.3 Une étude des risques liés à l'exploitation du site de décharge de La Saline/ Jérémie est conduite.</i>	<i>3.3.1. Nombre de sites de décharge existant avec une étude de risques et des mesures de mitigations adaptées.</i>	Rapport d'activité / rapport de visite de supervision	0	2018				1		1	<i>Examen du rapport d'étude</i>

ANNEXE 2

PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUUEL

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PREVUES	DÉPENSES 2018 à 2021 (USD)	BUDGET PREVU (USD) 2022 - 2023					Montant (\$) Total
			2022	2023	Partie responsable	Source de financement	Poste budgétaire	
Composante 1 : Assistance technique au Ministère de l'Environnement pour la définition participative d'une stratégie durable en matière de GDS tenant compte des sexes et basée sur le cadre juridique en vigueur								
1.1 Le processus d'amélioration du cadre juridique actuel (Loi du 21 septembre 2017 créant le SNGRS) est soutenu par un mécanisme de consultation participatif et inclusif et un processus de plaidoyer.	Activité 1.1.1 : Etablissement d'une plate-forme consultative et de réflexion (table sectorielle) sur le nouveau cadre juridique en vigueur et la problématique de la GDS en Haïti en général				PNUD	Japon	71300	
	Activité 1.1.2. Planification et organisation d'activités de consultation et de réflexion (tables rondes techniques, de forums, de réunion et d'ateliers de travail) rassemblant les principaux acteurs et parties prenantes du secteur public et du secteur non public pour identifier les problèmes d'ordre juridique, réfléchir sur la problématique de la GDS en Haïti et proposer des améliorations lorsque nécessaire.		15000			PNUD	Japon	75700
1.2 La définition d'une stratégie nationale durable en matière de GDS est supportée par le projet.	Activité 1.2.1. Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités (sessions d'assistance technique, discussions et consultations, appui aux événements thématiques) avec les ministères et/ou entités étatiques concernés pour encourager l'inclusion de la GDS dans leur stratégie, leur planification et leur budget annuel		10000		PNUD	Japon	71300 & 75700	10000
	Activité 1.2.3. Fourniture d'appui direct et d'accompagnement technique au MDE pour renforcer le SNGRS		10000			PNUD/MDE	Japon	71300, 72200 & 75100
1.3 Des partenariats sont établis avec des universités pour la recherche et l'innovation au profit	Activité 1.3.1. Développement et renforcement de partenariats et de coopération avec des universités et ou centres de recherche pour la production et la diffusion de documents sur la GDS en Haïti.		20000		MDE	Japon	75100 & 75700	20000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PREVUES	DÉPENSES 2018 à 2021 (USD)	BUDGET PREVU (USD) 2022 - 2023					Montant (\$) Total
			2022	2023	Partie responsable	Source de financement	Poste budgétaire	
de la GDS (recyclage, financement).	Activité 1.3.2. Conduite des recherches sur la GDS par les étudiants et professeurs des universités et/ou centres de recherche partenaires.		30000		MDE	Japon	72100	30000
1.4 Une campagne de sensibilisation et de plaidoyer est menée auprès du grand public et des groupes d'agents de changement ciblés pour promouvoir un plan stratégique efficace en faveur de la gestion des déchets solides.	Activité 1.4.1. Planification et organisation d'événements de communication, de sensibilisation et de plaidoyer axés sur la GDS.		10000	5000	PNUD	Japon	72400 & 75700	10000
	Activité 1.4.2. Production et diffusion de matériels de communication et d'informations sur la GDS		7000	2000	PNUD	Japon	72400 & 74200	7000
	Sous-total composante 1	625909.41	102000.00	7000.00				734909.41
Composante 2. Les capacités sont renforcées en matière de gestion des déchets solides dans les municipalités par l'instauration d'un mécanisme efficace, sensible à la dimension de genre et rentable.								
2.1 Un programme efficace d'éducation et de sensibilisation à la gestion des infrastructures et services appropriés de GDS (écosite, déchetterie, sites de décharges, etc.) est parrainé pour améliorer la santé publique et accroître la protection de l'environnement.	Activité 2.1.1 Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités en GDS pour les institutions, entreprises, écoles et communautés des municipalités bénéficiaires		30000		PNUD	Japon	72100 & 75700	
	Activité 2.1.2 Planification et organisation d'ateliers techniques sur la santé publique et la protection de l'environnement				PNUD	Japon	71300 & 75700	
	Activité 2.1.3. Conception et réalisation d'une campagne d'informations, d'engagement communautaire et de sensibilisation sur la GDS dans les écoles et communautés		10000		PNUD	Japon	71300 & 72400	


PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PREVUES	DÉPENSES 2018 à 2021 (USD)	BUDGET PREVU (USD) 2022 - 2023					Montant (\$) Total
			2022	2023	Partie responsable	Source de financement	Poste budgétaire	
2.2 Les parties prenantes locales et les municipalités sont soutenues pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de GDS locaux tenant compte de la notion de genre, fondés sur la politique nationale.	Activité 2.2.1 Mise en place d'un système communautaire efficace de collecte des déchets.		40000		PNUD	Japon	72100 & 71300	
	Activité 2.2.2 Promotion des activités communautaires de collecte et de recyclage des déchets solides auprès des hommes, des femmes et des jeunes.		40000		PNUD	Japon	72400 & 74200	
	Activité 2.2.3 Conduite d'évaluations et d'études locales sur la GDS (Baseline incluant notamment la composition des déchets) dans les municipalités du projet				PNUD	Japon	71300 ou 72100 & 72200	
2.3 Les capacités internes des municipalités pour assurer la gouvernance (à la fois les éléments physiques et de gouvernance) du secteur de la GDS sont renforcées.	Activité 2.3.1 Fourniture de l'équipement pour la collecte et le transport des déchets et des équipements de protection individuelle (EPI) dans deux municipalités.					Japon	72100 & 72200	120000
	Activité 2.3.2 Établissement et renforcement des capacités de groupes communautaires dans les municipalités cibles				PNUD	Japon	71300 & 75700	26000
	Activité 2.3.3. Développement et implémentation d'un programme de renforcement des capacités techniques des municipalités incluant des voyages d'échange et de partage d'expériences avec des parties prenantes du secteur de la GDS		40000		PNUD	Japon	72100, 71300 & 75700	80000
	Activité 2.3.3. Conduite d'activités de développement de synergie et de sessions de travail avec la municipalité des Cayes		40000					
2.4 Une communauté plus respectueuse du principe des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets) est établie au moyen	Activité 2.4.1 Mise en place d'un mécanisme collectif de compostage domestique des déchets, comportant des bacs appropriés.		40000			Japon	71300	24000
	Activité 2.4.2 Développement d'un partenariat avec des organisations communautaires pour renforcer les efforts de recyclage en général et		40000		PNUD	Japon	71300 & 75700	140000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PREVUES	DÉPENSES 2018 à 2021 (USD)	BUDGET PREVU (USD) 2022 - 2023					Montant (\$) Total
			2022	2023	Partie responsable	Source de financement	Poste budgétaire	
de la promotion des meilleures pratiques identifiées dans les deux zones cibles du projet.	produire du compost et promouvoir son utilisation par les agriculteurs locaux							
	Activité 2.4.3. Conduite d'activités de sensibilisation sur l'utilisation du compost sur les marchés agricoles municipaux dans certaines localités		20000		PNUD	Japon	75700 & 72400	11000
2.5 Des activités génératrices de revenus liées au traitement des déchets sont développées pour améliorer les conditions de vie des populations les plus marginalisées de l'emploi formel, notamment les femmes et les jeunes	Activité 2.5.1 Développement d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois				PNUD	Japon	72600 & 72100	70000
	Activité 2.5.2 Promotion de mécanismes financiers appropriés pour aider à la création de nouvelles entreprises ou au renforcement des entreprises de GDS existantes.		30000		PNUD	Japon	72200, 72400 & 75700	100000
	Activité 2.5.3 Parrainage d'entreprises privées investies dans le recyclage des déchets solides à l'aide d'une technologie et de procédés reproductibles novateurs.		40000		PNUD	Japon	72200 & 75700	50000
Sous-total composante 2		1806137.00	370000.00					2176137.00
Composante 3 : Des infrastructures critiques et des services de GDS sont mis en place et facilitent le développement économique et l'amélioration des qualités de vie de façon inclusive et équitable								
3.1 Des études de faisabilité ont été réalisées incluant un avant-projet détaillé et une étude technique, sociale, environnementale.	Activité 3.1.1 Conduite des études de faisabilité de la mise en place des infrastructures (Cayes & Ouanaminthe)		225000		PNUD	Japon	72100, 71300 & 74100	225000
	Activité 3.1.2 Conduite d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) détaillée pour les infrastructures qui seront mises en place à Ouanaminthe.		40000		PNUD	Japon	72100 & 71300	40000
	Activité 3.1.3 Conduite d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) détaillée pour les infrastructures qui seront mises en place aux Cayes.		45000		PNUD	Japon	72100 & 71300	45000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PREVUES	DÉPENSES 2018 à 2021 (USD)	BUDGET PREVU (USD) 2022 - 2023					Montant (\$) Total
			2022	2023	Partie responsable	Source de financement	Poste budgétaire	
3.2 La mise en place et la mise en service des infrastructures de GDS sont menées à bien.	Activité 3.2.1 Mise en place des infrastructures à Ouanaminthe et aux Cayes		1100000.00	1000000	PNUD	Japon	74500	
	Activité 3.2.2 Fonctionnement, opérations et maintenance		50000.00	25000.00	PNUD	Japon	72100	
3.3 Une étude des risques liés à l'exploitation du site de décharge de La Saline/Jérémie est conduite.	Activité 3.3.1 Conduite de l'étude des risques à Jérémie et application de potentielles mesures de mitigation et de renforcement		350000	100000	MDE/PNUD	Japon	74500 72100 & 74100	
Sous-total composante 3		90522.00	1810000.00	1125000				3025522
Sous-total des activités (composantes 1,2&3)		2522568.41	2282000	1132000				5936568.41
Supports et accompagnements techniques et administratifs								
Les supports administratifs et techniques nécessaires sont disponibles et fournis au projet	Ressources humaines et couts associés à la mise en œuvre du projet	1792126.00	360000.00	60000.00	PNUD/MDE	Japon / PNUD	71400	1254421.9
	Audit et évaluation			30000	PNUD	Japon	74100	30000
	Bureaux locaux et autres couts d'aménagement et de fonctionnement		54000	10000	PNUD	Japon	73100	336518
	Services généraux de gestion (8%)		215680	98560.00	PNUD	Japon	75100	594886.5
Sous total		1792126.00	629680	198560				2620366
Montant total du projet		4314694.41	2911680.0	1330560				8556934.41
Financement Japon		4154194.41	2711680.0	1165092.59		Japon		8030967
Financement PNUD		160500.00	200000.00	165467.41		PNUD		525967.41

ANNEXE 3

Théorie de changement du projet

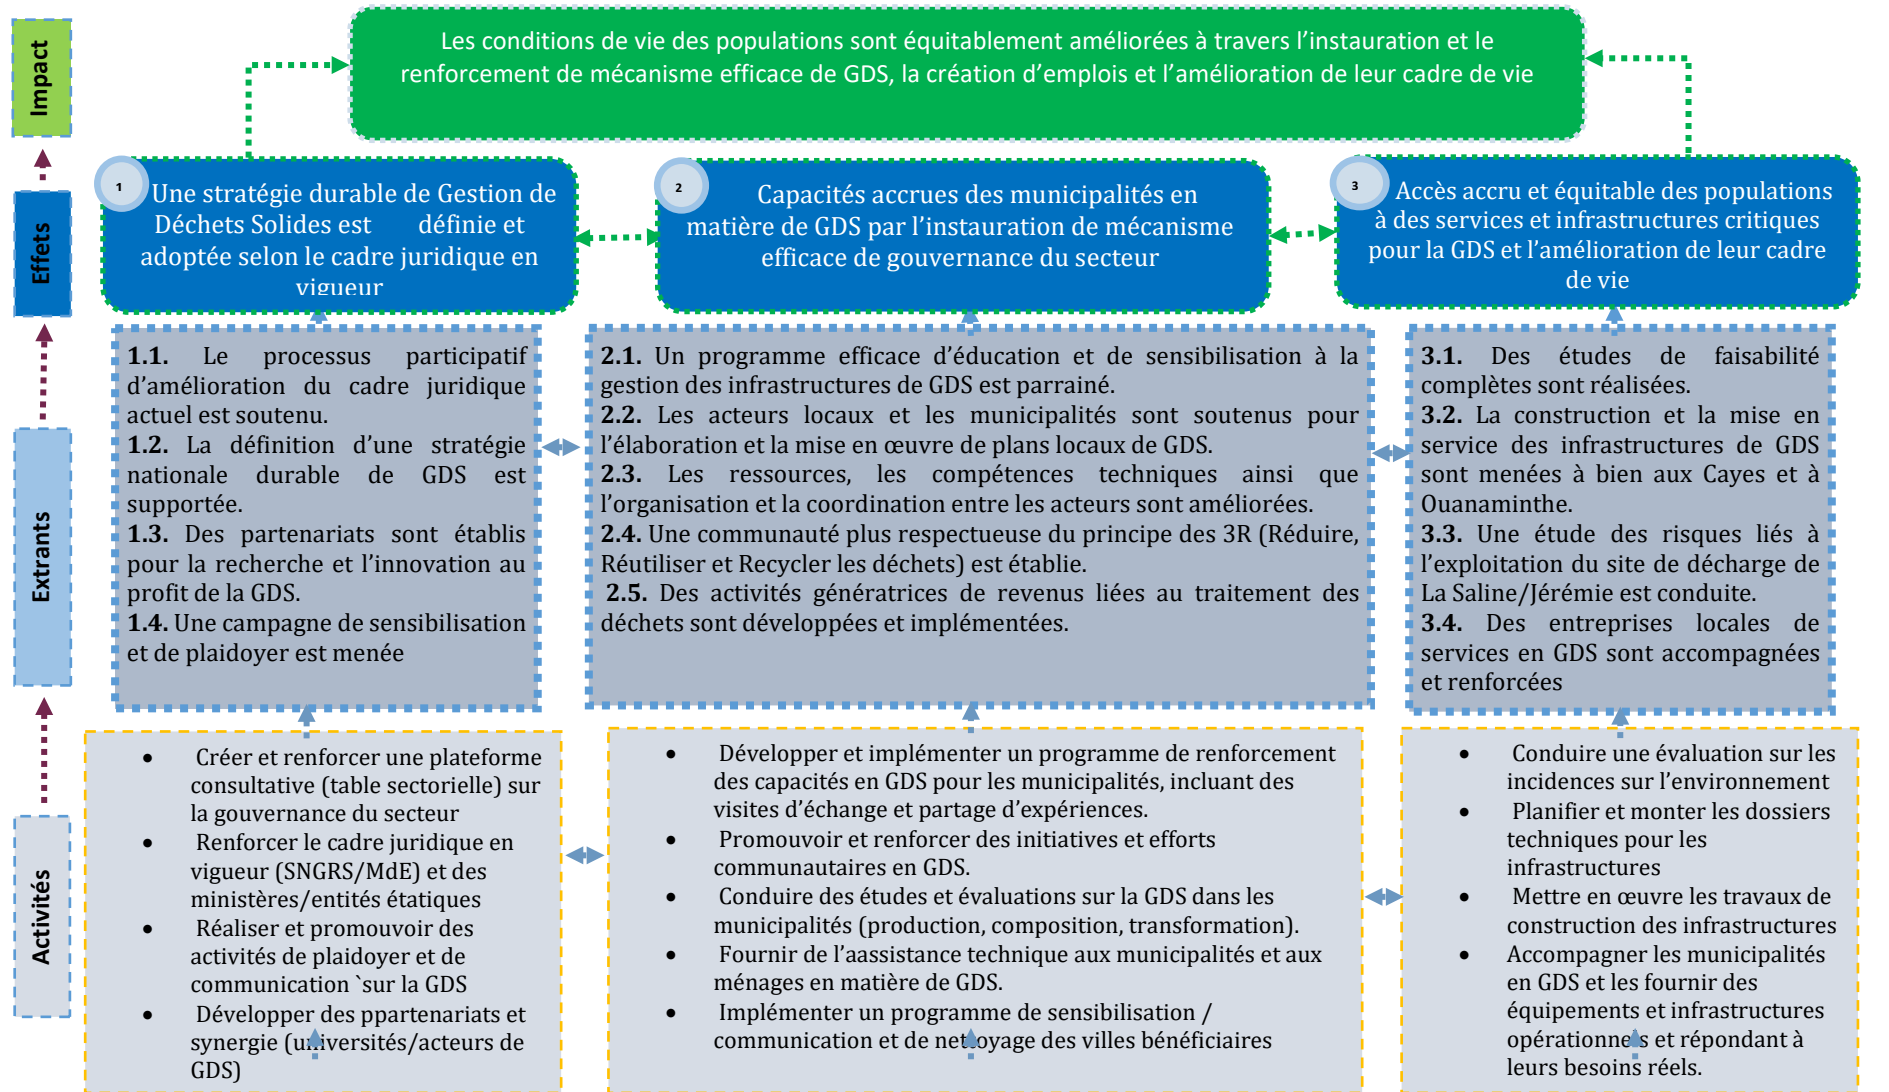

Problème : Le pays fait face à un déficit accru en matière de gestion des éléments physiques et de gouvernance de la GDS résultant notamment de l'urbanisation grandissante et incontrôlée de nos villes couplée à la faiblesse de l'Etat à fournir les services adéquats en GDS et à faire respecter les réglementations en vigueur
