

**ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ****Туркменистан**Empowered lives.  
Resilient nations.

**Наименование проекта:** Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам

**Номер проекта:**

**Партнер-исполнитель:** Государственный комитет Туркменистана по статистике

**Дата начала:** 01.08.2018г.

**Дата завершения:** 31.12.2020г.

**Краткое описание**

Целью настоящего проекта между ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике является укрепление национального статистического и институционального потенциала для осуществления концептуального перехода от применяемой в настоящее время СНС 1993 года к версии СНС 2008 года и расширении сферы охвата, степени детализации и качества национальных счетов и дополняющих их данных экономической статистики.

В этой связи были определены следующие компоненты проекта: 1) согласование национальной программы внедрения СНС 2008 и определение институциональных механизмов координации национальной статистической системы; 2) подготовка предложений по совершенствованию системы статистических классификаций; 3) адаптация к требованиям СНС 2008 бизнес-регистра; 4) усиление методологического, информационного и кадрового потенциала национальных счетов Туркменистана в соответствии с требованиями СНС 2008 и 5) усиление ИТК потенциала, обеспечивающего построение национальных счетов Туркменистана.

**Конечный результат проекта:** Полное внедрение и переход к версии системы национальных счетов 2008 года  
**Конечный результат РППР 2016-2020гг.:**

Качественные данные приведены в соответствие с международными стандартами и доступны для высших должностных лиц, законодателей и заинтересованной общественности для мониторинга достижения основных целей национальных программ, ЦУР после 2015 г., РППР и формирования новых национальных стратегий и программ  
**Промежуточный результат РППР 2016-2020 гг.:**

Создана система мониторинга и отчетности на основе фактических данных в целевых отраслевых министерствах и учреждениях для оценки прогресса в реализации национальных и отраслевых стратегий и программ, в том числе соответствующих ЦУР, в соответствии с международными стандартами

**Всего  
необходимых  
ресурсов:**

**542179.26 долл. США**

**Всего  
выделенных  
ресурсов:**

**ПРООН:**

**73500  
долл.  
США**

**Правительство  
Туркменистана:**

Сумма в  
национальной  
валюте (манат),  
эквивалентная  
официальному курсу  
на момент  
проведения платежа

**468679.26  
долл.  
США**

Согласовано:

Государственный комитет Туркменистана по статистике	Программа развития ООН
 Халыкдурды Гурбанов Председатель	 Елена Панова Постоянный представитель
Дата: 29.08.2018	Дата: 27.07.2018

## I. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Система национальных счетов Туркменистана в настоящее время включает в себя следующие счета, по которым обеспечена методологическая основа расчетов в соответствии с методологией СНС 1993 года:

- счет производства;
- счет образования доходов;
- счет распределения первичных доходов;
- счет вторичного распределения доходов;
- счет использования располагаемого дохода;
- счет операций с капиталом;
- счет внешнеэкономических связей.

В рамках построения национальных счетов проводятся месячные, квартальные и годовые расчеты валового внутреннего продукта и других важнейших макроэкономических агрегатов, а также годовые расчеты валового регионального продукта по производственному методу по методологии СНС 1993 года.

Построение основных национальных счетов является существенным достижением статистики Туркменистана, однако в настоящее время большинство стран, согласно рекомендациям ООН, уже осуществило или осуществляет переход на новую версию СНС 2008 года. Хотя СНС 2008 года сохраняет основополагающие концепции, определения и классификации СНС 1993 года, но, вместе с тем, она вводит целый ряд новых методологических подходов к исчислению ряда важных показателей, что является насущной необходимостью в связи с новыми вызовами, с которыми сталкиваются национальные статистические службы.

В частности, в связи с принятием ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, возникает необходимость укрепления национального статистического потенциала в интересах измерения, мониторинга и представления отчетности о целях в области устойчивого развития, включая связанные с ними задачи и показатели. Цель 17 конкретно касается укрепления средств осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в то время как задача 17.18 заключается в том, чтобы усилить к 2020 году поддержку в целях наращивания потенциала, с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий.

Цели устойчивого развития также включают ряд показателей, которые непосредственно относятся к СНС 2008. В частности, это касается целей 8 (экономика) и 17 (партнерство). К примеру, задача 17.13 предусматривает повысить макроэкономическую стабильность посредством координации экономической политики и обеспечения ее последовательности и устанавливает в качестве показателя набор основных макроэкономических показателей. Во времена экономических и финансовых трудностей, точность и своевременность национальных счетов являются особенно важными для предупреждения относительно уязвимости и подверженности глобальным экономическим потрясениям.

После утверждения СНС 2008 в качестве международного стандарта для составления и распространения национальных счетов, Статистическая комиссия ООН поддержала ее применение во всех странах. Тем не менее, многие страны испытывали сложности в переводе своих счетов с СНС 1993 года на вариант СНС 2008 года. В этой связи, на сорок первой сессии Статистической комиссии ООН была создана Группа друзей Председателя по факторам, затруднявшим применение СНС. Согласно Докладу Группы друзей Председателя<sup>1</sup> основными препятствиями на пути процесса внедрения является недостаточная готовность национальных статистических и институциональных систем к применению СНС, а также наличие источников базовых данных. Необходимость повышения статистического и

<sup>1</sup> Доклад Группы друзей Председателя по факторам, затруднявшим применение Системы национальных счетов 1993 года. Экономический и социальный совет, 20 декабря 2011 года

институционального потенциала в области применения СНС также стала ключевой рекомендацией самооценки, проведенной Туркменстатом в 2014 году с целью совершенствования своей институциональной структуры. Оценка была проведена с использованием модифицированной версии международной методологии Адаптированной Глобальной Оценки, поддержанной Евростатом, ЕЭК и ЕФТА, которая была успешно применена в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

В Туркменистане уже начата работа по внедрению СНС 2008. В частности, Туркменстат сотрудничает со Всемирным банком в рамках проекта «Укрепление потенциала в области статистики национальных счетов», который предусматривает: а) практическое внедрение методологии построения таблицы «ресурсов и использования» и таблицы «затраты-выпуск», и б) подготовку плана действий по совершенствованию системы национальных счетов в Туркменистане, соблюдению международных методологических стандартов (в частности, СНС 2008).

В рамках этого проекта экспертами дана оценка результатов пилотного обследования структуры промежуточного потребления, проведенного в Туркменистане в 2015 году для нужд построения таблиц затраты-выпуск, оказана помощь в исправлении недочётов при обзоре результатов обследования и в доработке методологии построения таблиц «ресурсов и использования» в соответствии с требованиями СНС 2008. Ожидается, что к концу проекта Всемирного банка будет построена первая версия таблиц «ресурсов и использования», которая будет, в основном, соответствовать рекомендациям СНС 2008.

Также, в рамках данного проекта экспертами будет дана оценка текущего статусу системы классификации СНС Туркменистана и конкретные рекомендации по поэтапному внедрению обновленной системы классификации, соответствующей СНС 2008 года.

В этой связи, Программа развития ООН, руководствуясь рекомендациями Группы друзей Председателя, рекомендациями самооценки, планирует оказать техническое содействие в области наращивания статического потенциала с целью поддержки перехода на СНС 2008 и реализации задач и показателей соответствующих Целей устойчивого развития.


## II. СТРАТЕГИЯ

В руководящих указаниях Статистической комиссии ООН по внедрению СНС 2008 описаны три этапа внедрения:

- Этап 1. Рассмотрение основы стратегии и разработка детальных национальных и региональных программ реализации;
- Этап 2. Адаптация систем классификации, реестров и рамок коммерческих регистров, обследований, административных источников данных и инфраструктуры информационных технологий;
- Этап 3. Применение адаптированных систем и источников данных, ретроспективный анализ и переход на СНС 2008.

Данные рекомендации предполагают проведение ряда мероприятий, а также временные рамки по каждому этапу, чтобы помочь странам создать структурированные планы реализации, которые принимают во внимание допустимую нагрузку на статистическую систему, потребности основных пользователей и необходимые ресурсы. Эти мероприятия не должны рассматриваться как строго последовательные, большинство из них должны проводиться параллельно<sup>2</sup>.

Рисунок 1: Этапы внедрения СНС 2008

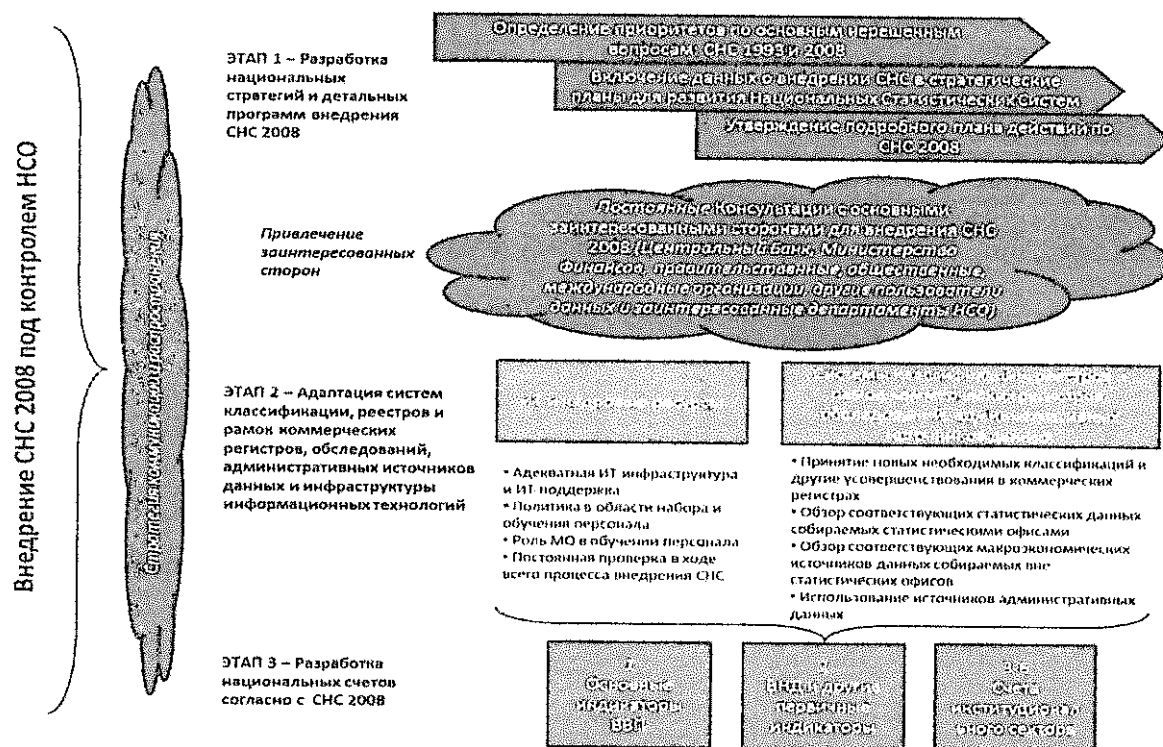

Проект Всемирного банка «Укрепление потенциала в области статистики национальных счетов» оказывает содействие Туркменстату в разработке стратегии по совершенствованию национальных счетов в Туркменистане, соблюдению международных методологических стандартов, включая СНС 2008, и плана действий по ее реализации.

Целью настоящего проекта между ПРООН и Государственным комитетом Туркменистана по статистике является укрепление национального статистического и институционального потенциала для осуществления концептуального перехода от применяемой в настоящее время СНС 1993 года к версии СНС 2008 года и расширению сферы охвата, степени детализации и качества национальных счетов и дополняющих их данных экономической статистики. В этой связи были определены следующие компоненты проекта: 1) согласование

<sup>2</sup> Рекомендации ЕЭК ООН по внедрению Системы национальных счетов 2008 в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и Юго-Восточной Европы, январь 2013г. Европейская экономическая комиссия ООН Статистический отдел.

национальной программы внедрения СНС 2008 и определение институциональных механизмов координации национальной статистической системы; 2) подготовка предложений по совершенствованию системы статистических классификаций; 3) адаптация к требованиям СНС 2008 бизнес-регистра; 4) усиление методологического, информационного и кадрового потенциала национальных счетов Туркменистана в соответствии с требованиями СНС 2008 и 5) усиление ИТК потенциала, обеспечивающего построение национальных счетов Туркменистана.

Настоящий проект соответствует целям и задачам, обозначенным Рамочной Программе Партнерства между Туркменистаном и ООН на период 2016-2020 годы (РПП) и Плана действий Программы по стране между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН на 2016-2020 годы (ПДПС), направленных на повышение качества статистических данных. В частности, проект способствует достижению Результата 1: Качественные данные, приведенные в соответствие с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РПП ООН и для разработки новых национальных стратегий и программу. Проект будет способствовать достижению Глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), национализированных Туркменистаном в сентябре 2016 года. В частности, ЦУР 8 (экономика) и ЦУР 17 (партнерство).



### III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

#### *Ожидаемые результаты*

Ожидается, что в рамках проекта будут достигнуты следующие результаты, которые способствуют укреплению институционального и статистического потенциала в области национальных счетов.

*Результат 1: Национальная программа внедрения СНС2008 согласована и институциональные механизмы определены.* Мероприятия по достижению данного результата будут базироваться на результатах работы Всемирного банка по разработке стратегии в области совершенствования системы национальных счетов и будут скоординированы с мероприятиями, включенными в стратегию. В частности, настоящий проект окажет содействие в проведении консультаций Туркменстата с основными заинтересованными сторонами, которые являются составителями взаимосвязанной экономической статистики и поставщиками данных по национальным счетам, включая Центральный банк и Министерство финансов и экономики, с целью повышения их осведомленности о рекомендациях СНС 2008, применимых зонах их ответственности. Также будут проведены круглые столы с пользователями данных национальных счетов, включая Центральный банк, Министерство финансов и экономики и других правительственных учреждений, ответственных за мониторинг экономической и финансовой политики, а также планирование национального развития. Проект также окажет содействие в обновлении существующих и заключении новых рамочных соглашений, таких как Меморандумов о взаимопонимании между Туркменстатом и другими учреждениями. Проект будет способствовать включению мероприятий по внедрению СНС 2008 в общую среднесрочную стратегию развития национальной статистической системы.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 1.1 Количество специалистов министерств и ведомств, знакомых с рекомендациями СНС 2008;
- 1.2 Количество совместных консультаций между Туркменстатом, Центральным банком, Министерством финансов и экономики и другими ведомствами;
- 1.3 Количество обновленных и заключенных соглашений с ключевыми учреждениями - поставщиками данных для СНС.

*Результат 2: Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены* будет достигнут путем оказания содействия в совершенствовании и применении международных стандартных классификаций, включая классификации экономической деятельности ISIC версии 4 (NACE 2), классификации основных продуктов (CPC 2) и классификации институциональных секторов. В рамках реализации проекта будут проводиться регулярные встречи с целью координации между различными управлениями Туркменстата, ответственными за национальные счета, бизнес регистры, а также с соответствующими департаментами Центрального банка и Министерства финансов и экономики.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 2.1 Проекты экономических классификаций разработаны в соответствии с международными стандартами и представлены для утверждения и внедрения.

*Результат 3: Бизнес-регистры адаптированы.* Данный результат будет достигнут путем проведения консультаций с международными экспертами, проведения необходимых практических мероприятий по совершенствованию регистров, а также обучения работников центрального аппарата и велаятских подразделений Туркменстата работе с обновленными регистрами.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 3.1 Бизнес регистры приведены в соответствии с требованиями СНС 2008.

*Результат 4: Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены.* Мероприятия в рамках данного компонента будут направлены на практическую реализацию рекомендаций СНС 2008 касательно валового

внутреннего продукта (ВВП) и его компонентов. Проект представит техническую экспертизу с целью улучшения существующих методов и внедрения изменений 2008 года, которые повлияют на оценку ВВП и его основные компоненты, включая следующее: 1) измерение услуг, включая финансовые услуги FISIM и услуги страхования; 2) оценка постоянных цен: разработка подходящих дефляторов; внедрение метода двойной дефляции; 3) оценка ненаблюдаемой экономики; 4) оценка жилой ренты; 5) расходы на НИОКР; 6) расчет регионального ВВП на уровне велятов; 7) расчет экономических и экологических счетов. В рамках проекта будут представлены соответствующие консультации по применению методологий, а также проведены выборочные обследования, например, в сфере услуг в неформальном секторе. Помимо этого, будет организовано практическое обучение по национальным счетам. В частности, для сотрудников соответствующих управлений Туркменстата и других министерств и ведомств будет проведен практический вводный курс по национальным счетам, подготовленный Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, который позволит ознакомиться с подробностями в СНС 2008, и с видами и методами практического применения. Проект также будет поддерживать участие сотрудников Туркменистана в различных тренингах по СНС 2008, включая отдельные компоненты, проводимых Статистическим отделом ООН, Европейской экономической комиссией ООН, Евростатом, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими. Особое внимание будет уделено обучению сотрудников Туркменстата в велятах.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 4.1 Оценка ВВП и его основных компонентов осуществляется согласно СНС 2008;
- 4.2 Доля показателей, по которым разработаны и апробированы методологии;
- 4.3 Количество обследований, адаптированных согласно рекомендациям СНС 2008;
- 4.4 Количество международных семинаров и конференций, на которых участвовали специалисты Туркменстата;
- 4.5 Совместный квартальный отчет по СНС 2008 года составлен к третьему кварталу 2020 года;
- 4.6 Количество специалистов Туркменстат, прошедших обучение по СНС 2008 года.

*Результат 5: ИКТ потенциал, относящийся к построению национальных счетов, усилен.* В рамках проекта планируется обновление программного и компьютерного обеспечения для ведения и поддержания базы данных СНС 2008. Будет разработано специальное программное обеспечение, с помощью которого в автоматическом режиме будут осуществляться расчеты показателей СНС2008 и формироваться стандартные выходные таблицы данных.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 5.1 Оборудование и программное обеспечение обеспечивает расчеты основных показателей СНС в соответствии с рекомендациями 2008 года.

### **Ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов**

В целях достижения вышеперечисленных результатов проект предусматривает привлечение высококвалифицированных международных экспертов. Консультанты должны обладать значительным опытом работы в области национальных счетов, повышения статистического потенциала и иметь хорошие знания о Глобальной Повестке в области устойчивого развития до 2030 года и Целях устойчивого развития, опыт работы в регионе СНГ и хорошие знания о соответствующей среде в Туркменистане, а также иметь отличное знание английского и русского языков (устный и письменный). В проект будут также вовлечены местные консультанты для оказания поддержки международным экспертам. Эти консультанты должны будут иметь опыт работы и хорошее понимание национальной статистической системы Туркменистана, включая нормативно-правовую и методологическую базу. Также будут организовываться учебные поездки с целью изучения международной практики в соответствующих областях.

### **Партнерские отношения**

В ходе реализации проекта, ПРООН и Туркменстат будут тесно сотрудничать с представителями Центрального банка, Министерства финансов и экономики и другими. Также деятельность проекта будет координироваться с работой других международных организаций, в том числе Статистический отдел ООН (DESA), Европейская экономическая комиссия ООН, Евростат, Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Статистический комитет СНГ, осуществляющие деятельность в области совершенствования и повышения статистического потенциала по национальным счетам.



#### IV. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Проект будет осуществляться с использованием Механизма национального исполнения. В качестве национального партнера по реализации, Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат) будет осуществлять надзор над всеми аспектами реализации проекта. Эта роль совместима с ролью Туркменстата по представлению официальной информации на основе статистических и социологических наблюдений. Туркменстат назначит старшего сотрудника в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет ведущим лицом, ответственным за осуществление надзора за выполнением проекта.

Общее управление проектом будет осуществляться Проектным Советом, в состав которого войдут Туркменстат и ПРООН. Национальный координатор проекта (НКП) будет Председателем Проектного Совета, и ПРООН будет оказывать поддержку в организации и управлении всеми встречами и другим обменом информации. Собрания Проектного Совета будут проводиться по крайней мере два раза в год для одобрения Годового рабочего плана на предстоящий год и отчетов предыдущего года. При необходимости, НКП может созвать дополнительные собрания. Проектный Совет осуществляет общее руководство Проекта и несет ответственность за инициирование, направление, обзор и окончательное закрытие. В рамках Проекта, Совет является высшим руководящим органом. Он обеспечивает выделение всех необходимых ресурсов, выступает судьей при любых конфликтах в рамках проекта или ведет переговоры по разрешению тех или иных проблем, возникших между проектом и любыми сторонами за пределами сферы действия проекта.

ПРООН присоединится к Туркменстату в управлении проектом и обеспечении качества, в соответствии с планами, одобренными Проектным Советом. Большая часть работ ПРООН по проекту будет осуществляться на базе Странового офиса в г.Ашхабаде, под руководством Заместителя Постоянного Представителя ПРООН и Постоянного Представителя ПРООН, при необходимости.

Повседневные операции проекта будут осуществляться менеджером проекта, который будет руководить работой международных и национальных технических экспертов и ассистентского персонала. Проектный персонал будет нести ответственность за осуществление деятельности по проекту, как предусмотрено в данном Проектном Документе и любых изменениях, одобренных Проектным Советом. На каждое собрание Проектного Совета, менеджер проекта подготовит отчет о ходе работ по проектной деятельности, включая последние достижения, риски, и предлагаемые меры по смягчению последствий. Проектный менеджер будет также нести ответственность за подготовку всех требуемых годовых отчетов для ПРООН и Правительства, согласно требованиям документов, подписанных по этому проекту.

Проект привлечет экспертов к реализации конкретных проектных работ, в том числе долгосрочного национального консультанта и краткосрочных международных экспертов. Специалисты из регионального центра ПРООН будут также вовлекаться в оказание поддержки по проектной деятельности. Проект покрывает затраты экспертов.

Персонал странового офиса ПРООН окажет содействие проекту в осуществлении всей административной работы по проекту, включая логистику и делопроизводство. Кроме того, страновой офис обеспечит административную поддержку Правительству в осуществлении различных определенных административных функций (например, тех, что включают закупку и финансовое управление). По затратам, связанным с этими последними функциями, будет выставляться счет по статье Прямые Проектные Затраты, согласно условиям, указанным в Приложении 1 «Особые положения».



## V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ

### Ожидаемый конечный результат, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы:

Итоговый результат 4 (РТПР/ПС ПРООН 1): Качественные данные, приведенные в соответствие с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РТПР ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ

### Индикаторы конечных результатов, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы, включая исходные данные и целевые показатели:

Индикатор 4.1: % рекомендаций реализовано согласно адаптированной Глобальной оценки национальных статистических систем (РТПР 1.1)

Исходные данные: Государственный комитет по статистике получил рекомендации и некоторые их них реализованы Цель: 40%

Наименование и номер проекта: Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам

Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Цели				МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
			Наименование	Год	Год 1	Год 2	Год 3	ВСЕГО	
Результат 1 Национальная программа внедрения СНС2008 согласована и институциональные механизмы определены	1.1 Количество специалистов министерств и ведомств, знакомых с рекомендациями СНС 2008	Туркменстат	0	2018	5	8	8	21	Отчеты проекта
	1.2 Количество совместных консультаций между Туркменстатом, Центральным банком, Министерством финансов и экономики и другими ведомствами	Туркменстат	0	2018	5	5	5	15	Отчеты проекта
	1.3 Соглашения с ключевыми учреждениями, составителями данных, обновлены и заключены	Туркменстат	Соглашения составлены СНС 1993						Отчеты проекта
Результат 2 Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены	2.1 Проекты экономических классификаций разработаны в соответствии с международными стандартами и представлены для утверждения и внедрения	Туркменстат	Нет	2018		да		да	Отчеты проекта

Результат 3 Бизнес-регистры адаптированы к требованиям СНС2008	3.1 Бизнес регистры приведены в соответствии с требованиями СНС 2008	Туркменстат	Нет	2018		да		да	Отчеты проекта
Результат 4: Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	4.1 Оценка ВВП и его основных компонентов осуществляется согласно СНС 2008	Туркменстат	частично	2018		да	да	да	Отчеты проекта
	4.2 Доля показателей, по которым разработаны и апробированы методологии	Туркменстат		2018	20%	40%	40%	100%	Отчеты проекта
	4.3 Количество обследований, адаптированных согласно рекомендации СНС 2008	Туркменстат	0	2018		1	1	2	Отчеты проекта
	4.4 Количество международных семинаров и конференций, на которых участвовали специалисты Туркменстата	Туркменстат	0	2018	3	3	3	9	Отчеты проекта
	4.5 Совместный квартальный отчет по СНС 2008 года составлен к третьему кварталу 2020 года	Туркменстат	0	2018	-	-	да	да	Отчеты Туркменстата
	4.6 Количество специалистов Туркменстан, прошедших обучение по СНС 2008	Туркменстат	0	2018	20	30	30	80	Отчеты проекта
Результат 5. ИКТ потенциал, относящийся к построению национальных счетов, усилен	5.1 Оборудование и программное обеспечение обеспечивает расчеты основных показателей СНС в соответствии с рекомендациями 2008 года	Туркменстат	частично	2018			да	да	Отчеты проекта

## VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Деятельность по мониторингу	Цель	Периодичность	Ожидаемое действие
Отслеживать прогресс в достижении результатов	Данные о ходе выполнения проекта на соответствие с индикаторами результатов в Структуре результатов и ресурсов (СРР) будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в отношении достижения согласованных итоговых результатов.	Ежеквартально, или с периодичностью, требуемой для каждого индикатора.	Если прогресс будет более медленным, чем предполагалось, то этот вопрос будет рассматриваться руководством проекта.
Осуществлять мониторинг и управление рисками	Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов. Определить и мониторить действия по управлению рисками, используя журнал рисков. Это включает меры и планы мониторинга, которые могут требоваться согласно Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с процедурами ПРООН по проведению аудитов с целью управления финансовым риском.	Ежеквартально	Риски определяются руководством проектом, и предпринимаются действия для управления рисками. Активно ведется журнал рисков для отслеживания выявленных рисков и предпринятых действий.
Изучать	Знания, передовой опыт и уроки будут охватываться регулярно. Кроме того, их будут перенимать и от других проектов и партнеров и включать в данный проект.	По крайней мере, ежегодно	Соответствующие уроки охватываются командой проекта, и используются для принятия продуманных решений руководством.
Ежегодное обеспечение качества работ по проекту	Качество проекта будет оцениваться на соответствие со стандартами качества ПРООН для определения сильных и слабых сторон проекта, и для вынесения продуманных решений на уровне руководства с целью улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны будут рассматриваться руководством проекта и использоваться для принятия продуманных решений в целях улучшения показателей осуществления проекта.
Пересмотреть и корректировать направления деятельности	Внутренний обзор данных и фактов по всем мониторинговым действиям для вынесения продуманных решений.	По крайней мере, ежегодно	Данные об исполнении проекта, риски, уроки и качество будут обсуждаться Проектным Советом и будут использованы для корректирования направлений деятельности
Отчет о выполнении проекта	Отчет о ходе работы будет представлен Проектному Совету и ключевым заинтересованным сторонам, и включит данные о ходе работы, отражающие достигнутые результаты на соответствие с предварительно определенными годовыми промежуточными целями на уровне итоговых результатов, краткий обзор годового рейтинга качества проекта.	Ежегодно, и в конце проекта (заключительный отчет)	

	обновленный журнал рисков с мерами по смягчению последствий, и все отчеты по оценке или обзору, подготовленные за этот период.		
Обзор Проекта (Правление Проекта)	Механизм управления проектом (то есть, Проектный Совет) будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки результатов осуществления проекта и рассмотрения Многолетнего Плана Работ в целях обеспечения реалистичного составления бюджета на протяжении всего периода осуществления проекта. В заключительном году проекта, Проектный Совет должен провести обзор по завершению проекта для охвата извлеченных уроков и обсуждения возможностей для расширения, и для национализации результатов проекта и извлеченных уроков с соответствующей аудиторией.	Два раза в год	Все вопросы, касающиеся качества, или более медленный, чем ожидалось, прогресс, должны обсуждаться Проектным Советом, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных проблем.



# **VII. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН**

**Год: 2018**

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Источник финансирования	Планируемый бюджет	
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 1 Национальная программа внедрения СНС 2008 согласована и институциональные механизмы определены	1.1. Семинар на тему "Внедрение СНС 2008 в международной практике" для сотрудников центрального аппарата Туркменстана					Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (1 день x 15 человек)	700
	1.2. Доработка национальной программы внедрения СНС2008					Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 2 месяца)	2000
							71200 Международные эксперты (1 эксперт x 10 дней)	5000
							71600 Транспортные расходы (5 дней x 1 эксперт)	2500
	1.3. Межведомственная встреча с целью координации работы по основным макроэкономическим показателям (ВВП, ВНД и др.)					Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (2 дня x 15 человек)	1000
							64300, 74500 Операционные расходы	1000
	1.4. Отработка предложений по совершенствованию механизма институционального взаимодействия					Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 1 месяц)	1000
	Итого Результат 1:							13200
	Административные расходы, 7%					Правительство Туркменистана	75100	924
	Всего, Результат 1, включая административные расходы:							14124
Результат 2 Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены	2.1 Подготовка предложений по переходу на новые классификации в соответствии с СНС2008					Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 10 дней)	5000
							71300 Национальные консультанты (1 эксперт x 1 месяц)	1000
							71600 Транспортные расходы (5 дней x 1 эксперт)	2500
	2.2. Согласование системы классификаций с компетентными ведомствами					Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 1 месяц)	1000
	2.3. Обучение сотрудников валютных подразделений новым классификациям					Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (всего 15 участников x 1.5 дня (2 участника x 5 велятов плюс Ашхабад) вода, распечатки)	380

						71300 Национальные эксперты (1 эксперт х 15 дней) 64300, 74500	Операционные расходы	500  1000
	Итого, Результат 2:							11380
	Административные расходы, 7%.					75100		796.60
Результат 3. Бизнес-регистры адаптированы	Всего, Результат 2, включая административные расходы:							12176.60
	3.1 Подготовка предложений по адаптации бизнес-регистра к СНС2008				Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт х 15 дней)		7500
						71300 Национальные эксперты (1 эксперт х 2 месяца)		2000
						71600 Транспортные расходы (5 дней x 1 эксперт)		2500
	3.2. Проведение практических мероприятий по адаптации регистров				Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 месяц x 1 эксперт)		1000
	3.3 Обучение сотрудников велаятских подразделений работе с обновленными регистрами				Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (15 участников x 1.5 дня x 5 велятов) 64300, 74500		1800 1000
	Итого, Результат 3:					Операционные расходы		15800
	Административные расходы, 7%.				Правительство Туркменистана	75100		1106.00
	Всего, Результат 3, включая административные расходы:							16906
Результат 4. Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	4.1 Провести обучение персонала по СНС 2008 на рабочем месте				Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (2 эксперта x 10 дней)		10000
						71600 Транспортные расходы (5 дней x 2 эксперта)		5000
					Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (1 поездка x 4 дня x 3 участника)	(1)	8000
	4.2 Организовать участие в международных семинарах, тренингах и практических курсах по специфическим вопросам СНС2008, в том числе визит экспертов Росстата по расчету жилой ренты				ПРООН	75700 Тренинги, семинары (3 участника x 200 долл. США - оплата за обучение)	(3)	600
						71600 Транспортные расходы (2 эксперта x 5 дней)	(2)	5000
					Правительство Туркменистана	64300, 74500		1000
						Операционные расходы		
	4.3. Подготовить методики и провести расчеты показателей СНС для приведения основных счетов в соответствие с версией 2008 года				Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 30 дней)	(1)	15000
						71600 Транспортные расходы (2 поездки x 1 эксперт x 5 дней)	(2)	5000
						71300 Местные эксперты (1 эксперт x 3 месяца)		3000
						71300 Перевод методик на туркменский язык		1000



Год: 2019

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Источник финансирования	Планируемый бюджет	
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		Описание бюджета	Сумма (в долл. США)
Результат 2 Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены	2.1 Обновить экономические классификации в соответствии с СНС 2008					Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 40 дней)	20000
							71300 Национальные консультанты (1 эксперт x 2 месяца)	2000
							71600 Транспортные расходы (1 эксперт x 5 дней)	2500
						Правительство Туркменистана	71300 Национальные консультанты (1 эксперт x 15 дней)	500
							75700 Тренинги, семинары (всего 15 участников x 1,5 дня (2 участника x 5 велатов плюс Ашхабад) - вода, распечатки)	380
	2.2 Провести обучение в велатских подразделениях по классификации						64300, 74500 Операционные расходы	1000
							Итого, Результат 2:	26380.00
						Правительство Туркменистана	75100	1846.60
							Административные расходы, 7%:	
							Всего, Результат 2, включая административные расходы:	28226.60
Результат 3. Бизнес-регистры адаптированы	3.1 Проведение практических мероприятий по адаптации регистров					Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней)	10000
							71300 Национальные эксперты (2 эксперта x 2 месяца)	4000
							71300 Национальные эксперты (2 эксперта x 10 дней)	600
							75700 Тренинги, семинары (15 участников x 1,5 день x 5 велатов)	1800
							64300, 74500 Операционные расходы	1000
	3.2 Обучение сотрудников велатских подразделений работе с обновленными регистрами						Итого, Результат 3:	17400
						Правительство Туркменистана	75100	1218
							Административные расходы, 7%:	
							Всего, Результат 3, включая административные расходы:	18618
						Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней)	10000
Результат 4. Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных	4.1 Провести обучение по СНС 2008 на рабочем месте					ПРООН	71600 Транспортные расходы (1 эксперт x 5 дней)	2500
							71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней)	10000

счетов Туркменистана усилены	4.2 Организовать участие в международных семинарах, тренингах и практических курсах по специфическим вопросам СНС2008				Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (2 поездки x 5 дней x 3 участников)	12900
						75700 Тренинги, семинары (Оплата за обучение 3 участника x 2 поездки)	1430
						64300, 74500 Операционные расходы	1000
					Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 40 дней)	20000
	4.3 Подготовить методики и провести расчеты показателей СНС для приведения основных счетов в соответствие с версией 2008 года					71600 Транспортные расходы (2 поездки x 1 эксперт x 5 дней)	5000
						71300 Местные эксперты (1 эксперт x 3 месяца)	3000
						71300 Перевод методик на туркменский язык	1000
	Итого, Результат 4:						66830
	- в т.ч. Правительство Туркменистана						56830
	Административные расходы, 7%:				Правительство Туркменистана	75100	3978,10
5. ИКТ потенциал, относящийся к построению национальных счетов, усилен	Всего, Результат 4, включая административные расходы:						70808,10
	- в т.ч. Правительство Туркменистана						60808,10
	5.1 Подготовить постановку задач и технические спецификации для разработки программного обеспечения и закупки компьютерного оборудования				Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 4 месяцев)	4000
						71200 Международные эксперты (1 эксперт x 30 дней)	15000
						71600 Транспортные расходы (2 поездки x 1 эксперт x 5 дней)	5000
						72100 Контрактные услуги	30000
	5.2 Доработать программное обеспечение для ведения базы данных по национальным счетам				Правительство Туркменистана	64300, 74500 Операционные расходы	1000
	Итого, Результат 5:						55000
	Административные расходы, 7%:				Правительство Туркменистана	75100	3850
	Всего, Результат 5, включая административные расходы:						58850
Управление проектом	Заработная плата персонала проекта				ПРООН	71400, 64300 Заработная плата	18000
	Расходы по содержанию офиса					72400 Связь и интернет	3000
						72500	1000
						Офисные принадлежности	
	Итого, Управление проектом:						22000

Итого	198502.70
Правительство Туркменистана	166502.70
ПРООН	32000



**Год: 2020**

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Источник финансирования	Планируемый бюджет		
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		Описание бюджета	Сумма (в долл. США)	
Результат 2 Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены	2.1. Согласование системы классификаций с компетентными ведомствами					Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 6 месяцев)	6000	
	2.2. Согласование системы классификаций с министерствами и ведомствами					Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (всего 15 участников x 1,5 дня (2 участника x 5 велатов плюс Ашхабад) - вода, распечатки)	380	
	Итого, Результат 2:						64300, 74500 Операционные расходы	1000	
	Административные расходы, 7%:					Правительство Туркменистана	75100	7380,00	
	Всего, Результат 2, включая административные расходы:							516,60	
	Результат 3. Бизнес-регистры адаптированы	3.1 Проведение практических мероприятий по адаптации регистров					Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт x 4 месяца)	7896,60
	3.2. Обучение сотрудников велатовских подразделений работе с обновленными регистрами					Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (15 участников x 1,5 день x 5 велатов) 64300, 74500 Операционные расходы	1800  1000	
	Итого, Результат 3:							6800	
	Административные расходы, 7%:					Правительство Туркменистана	75100	476	
	Всего, Результат 3, включая административные расходы:							7276	
	Результат 4. Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	4.1 Провести обучение персонала по СНС 2008 на рабочем месте					Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 20 дней) 71600 Транспортные расходы (2 визита x 1 эксперт x 5 дней) 75700 Тренинги, семинары (Оплата за обучение 3 участника x 2 поездки x 200) 71600 Транспортные расходы (2 поездки x 4 дня x 3 участника)	10000 5000  1200
	4.2 Организовать участие в международных семинарах, тренингах и практических курсах по специфическим вопросам СНС2008					Правительство Туркменистана	71600 Международные поездки (1 эксперт x 50 дней) 71600 Транспортные расходы (2 поездки x 1 эксперт x 5 дней)	16125 25000 5000	
	4.3 Подготовить методики и провести расчеты показателей СНС для приведения основных счетов в соответствие с версией 2008 года					Правительство Туркменистана			

5. ИКТ потенциал, относящийся к построению национальных счетов, усилен	4.4 Обучение сотрудников велаятских подразделений основам СНС2008						Правительство Туркменистана	71300 Местные эксперты (1 эксперт х 4 месяца)	4000
								71300 Перевод методик на туркменский язык	1000
								64300, 74500	1000
								Операционные расходы	
								71300 Местные эксперты (1 эксперт х 15 дней)	500
								75700 Тренинги, семинары (всего 15 участников х 1,5 дня (2 участника х 5 велаятов плюс Ашхабад) - вода, распечатки)	380
	4.5 Провести обследования согласно СНС 2008 (ненаблюдаемая экономика, услуги и т.д.)						Правительство Туркменистана	71200 Международный эксперт (1 эксперт х 40 дней)	20000
								71300 Национальные эксперты (1 эксперт х 3 месяца)	3000
								71600 Транспортные расходы (2 поездки х 1 эксперт х 5 дней)	5000
								**72100	56043
Итого, Результат 4:	Итого, Результат 4:							Контрактные услуги	
	Административные расходы, 7%:						Правительство Туркменистана	75100	153248
	Всего, Результат 4, включая административные расходы:								10727.36
5.1 Обслуживание программного обеспечения	5.1 Обслуживание программного обеспечения						Правительство Туркменистана	71300 Национальные эксперты (1 эксперт х 6 месяцев)	163975.36
								64300, 74500	6000
								Операционные расходы	1000
	Итого, Результат 5:								7000
	Административные расходы, 7%:						Правительство Туркменистана	75100	490
	Всего, Результат 5, включая административные расходы:								7490
Управление проектом	Заработная плата персонала проекта						ПРООН	71400	18000
								Заработная плата	3000
								72400	1000
								Связь и интернет	
								72500	
								Офисные принадлежности	
	Расходы по содержанию офиса								22000
	Итого, Управление проектом:								
	Итого								208637.96
	Правительство Туркменистана								186637.96
	ПРООН								22000

\* Расчет бюджета сделан на основании средних расценок 2017г. на услуги и мероприятия, используемые ПРООН для планирования проектных бюджетов (Приложение №1).

\*\* Расчет стоимости операционных расходов по проведению обследования согласно СНС 2008 (Приложение #2)

## VIII. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Данный проектный документ должен быть инструментом, как указано в Статье 1 Стандартного базового соглашения об оказании помощи (СБСОП), подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября, 1993 года. Все ссылки в СБСОП на «Исполнительное агентство» будут считаться ссылками на «Партнера-исполнителя».

Данный проект будет осуществляться Государственным комитетом Туркменистана по статистике «Партнером-исполнителем» при поддержке ПРООН в соответствии с финансовыми положениями и правилами ПРООН в целях обеспечения оптимального соотношения цены, справедливости, добросовестности, прозрачности, и эффективной международной конкуренции.

### Стандарты управления рисками

1. Согласно Статье III СБСОП и Части X Плана действий программы по стране на 2016-2020 годы, подписанном между Правительством Туркменистана и ПРООН 22 июня 2016 года, ответственность за охрану и безопасность Партнера-исполнителя, его персонала и собственность, а также за находящуюся в его распоряжении собственность ПРООН, лежит на Партнере-исполнителе. В связи с этим, Партнер-исполнитель обязан:

а) разработать и соблюдать соответствующий план по безопасности, принимая во внимание ситуацию по безопасности в стране, где выполняется проект;

б) принять на себя все риски и обязательства в части безопасности Партнера-исполнителя, и полностью осуществлять план по безопасности.

2. ПРООН оставляет за собой право проверять – имеется ли таковой план в наличии, и при необходимости, предлагать изменения в план. Отсутствие или невыполнение надлежащего плана обеспечения безопасности, в соответствии с предусмотренными здесь требованиями, будет рассматривать как нарушение обязательств Партнера-исполнителя в рамках данного Проектного Документа.

3. Партнер-исполнитель соглашается приложить все разумные усилия для гарантирования того, чтобы никакая часть средств, получаемых в соответствии с Проектным Документом, не была использована для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с терроризмом; и что получатели любых сумм, предоставляемых ПРООН по данному соглашению, не включены в список Комитета Совета Безопасности, созданный в соответствии с резолюцией 1267 (1999). К списку можно получить доступ на: [http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml). Данное положение должно включаться во все субподряды или соглашения, заключаемые по настоящему Проектному Документу.

4. Согласно Программным и Операционным Принципам и Процедурам ПРООН, социальная и экологическая устойчивость будет улучшена путем применения Социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и соответствующего Механизма Подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).

5. Партнер-исполнитель должен: (а) выполнять мероприятия в рамках проекта и программ в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН, (б) осуществлять план управления рисками и смягчения их последствий, подготовленный для проекта или программы с целью соблюдения таких стандартов, и (в) конструктивно и своевременно рассматривать и решать все проблемы и жалобы, поступившие через Механизм Подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы все сообщества и другие заинтересованные стороны проекта получали информацию о Механизме Подотчетности и имели к нему доступ.

6. Все стороны, подписавшие Проектный Документ должны добросовестно сотрудничать при осуществлении любых мер по оценке выполнения тех или иных обязательств в рамках программы или проекта, или по оценке соблюдения Социальных и Экологических Стандартов ПРООН. Это включает предоставление доступа на места осуществления проекта, а также доступа к соответствующему персоналу, информации, и документации.

## IX. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат), в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о софинансировании от 22 июня 2016 года предоставит взнос для реализации настоящего проекта в сумме 468679.26 (четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят девять долларов 26 центов) долларов США, которая будет перечислена на счет ПРООН в манатном эквиваленте.
2. Туркменстат, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит Взноса на манатный счет Представительства ПРООН в Туркменистане в Туркмено-Турецком Коммерческом Банке, р/с 23203934273168502583000:

График платежей	Сумма
01.08.2018	115538.60 долл. США
31.01.2019	166502.70 долл. США
31.01.2020	186637.96 долл. США

3. Стоимость Взноса при его внесении в валюте отличной от долларов США должна быть определена путем использования обменного курса ООН<sup>3</sup>, действующего на дату принятия внесения средств. При изменении обменного курса ООН до полного освоения ПРООН Взноса, стоимость оставшихся средств будет, соответственно, переоценена. При определении в подобном случае потерь в балансе оставшихся средств, ПРООН информирует Правительство на предмет возможности дополнительного финансирования со стороны Правительства. При невозможности дополнительного финансирования, поддержка Плана Действий в рамках данного проектного документа может быть сокращена, отложена или прекращена со стороны ПРООН.
4. Приведенный выше график платежей составлен с учетом требования о том, что Взнос должен быть осуществлен до начала запланированных мероприятий. В этот график могут вноситься изменения в соответствии с ходом реализации проекта.
5. ПРООН получает, управляет и использует Взнос, направленный на цели реализации проекта, в соответствии со своими действующими нормами, правилами, политикой, процедурами и директивами ПРООН, в том числе, в частности, Финансовыми правилами, изданными Исполнительным Советом ПРООН.
6. ПРООН обязуется предоставлять в Государственный комитет Туркменистана по статистике отчетность о реализации мероприятий и использовании финансовых средств проекта в соответствии с Статьей 4 вышеуказанного Соглашения о софинансировании от 22 июня 2016 года. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.
7. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.
8. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках этого проектного документа.
9. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.

В соответствии с решениями и директивами Исполнительного совета ПРООН:

На взнос необходимо отнести следующие затраты:

---

<sup>3</sup> Обменный курс ООН по Туркменистану определяется на основе официального обменного курса Центрального банка Туркменистана.

(а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса

(б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН и партнером по реализации.

10. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Государственному комитету Туркменистана по статистике по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.
