



Au service
des peuples
et des nations

PROJET TAMKEEN POUR LA PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ, LE RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE



Les femmes artisanes pour la paix de Ben Guerdane exposent et vendent leurs produits lors d'une foire organisée par l'association Ain de Développement

Rapport de Progrès Trimestriel Avril – Juin 2019

RÉALISÉ AVEC L'APPUI DE

تم تنفيذ هذا النشاط بدعم من



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Table des matières

Présentation du projet	3
Brève description du projet.....	4
Liste des acronymes.....	5
I- Résumé exécutif	6
II- Résultats détaillés	6
❖ Output 2.1 : Les capacités de construction du consensus sont renforcées dans le cadre d'une stratégie de prévention de la violence.....	6
❖ Output 2.2 Les initiatives de la société civile en matière de prévention de la violence et de promotion du dialogue sont appuyées.....	12
III- Défis de mise en œuvre et suivi des risques	17
IV- Leçons apprises et défis de mise en œuvre	19
V- Suivi-évaluation	19
VI- Evidences	20
VII- Rapport financier	20
VIII- Signatures	21
IX - Annexes	21

Présentation du projet

Titre du projet :	TAMKEEN Pour la promotion de la citoyenneté, le renforcement de la cohésion sociale et de la société civile
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	ODD 16 : Paix, justice, institutions efficaces
Effets et produits attendus du plan stratégique global du PNUD 2018-2021 :	<p>Outcome 3: Build resilience to shocks and crises Signature solution 3: Enhance national prevention and recovery capacities for resilient societies 3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, peaceful management of conflict and prevention of violent extremism in response to national policies and priorities 3.2.2 National and local systems enabled and communities empowered to ensure the restoration of justice institutions, redress mechanisms and community security 3.4.1 innovative nature based and gender responsive solutions developed, financed and applied for sustainable recovery 3.6.1 women's leadership and participation ensured in crisis prevention and recovery planning and action</p>
Effets et produits attendus du programme pays 2015-2020 :	<p>Outcome UNDAF/CPD #1 : D'ici à 2019, les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre. Produit CPD 1.2 : La participation citoyenne et les capacités des institutions et des contre-pouvoirs sont renforcés, permettant une meilleure reddition des comptes aux populations. Produits CPAP : Produit 1.2.4 : Un cadre de concertation et d'autorégulation de la société civile est mis en place et facilite sa participation au dialogue sur les priorités de développement dans les régions cibles. Produit 1.2.5 : Les capacités des acteurs de la société civile dans les zones cibles sont renforcées en vue de leur professionnalisation.</p>
Effets attendus du projet :	<ol style="list-style-type: none"> 1. La participation citoyenne aux affaires publiques, la gouvernance locale et les mécanismes de redevabilité sociale et de contrôle citoyen sont promus (Output relatif aux fonds italiens expirés le 31/12/2106) 2. La cohésion sociale est renforcée par le biais de la promotion du dialogue. 3. La société civile est renforcée pour se professionnaliser.
Partenaires d'exécution :	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ministère en charge des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'Homme Organisations de la société civile
Parties responsables :	Programme des Nations Unies pour le Développement

Brève description du projet

Le projet vise à soutenir l'instauration et la préservation des conditions favorables à une consolidation démocratique pérenne, par le renforcement de la cohésion sociale.

Plus spécifiquement, le projet vise à contenir les risques d'exacerbation de la violence par le renforcement de la résilience des acteurs stratégiques et la consolidation du rôle de la société civile dans la prévention de l'exclusion et la promotion de dialogue.

Ceci à travers :

- Le renforcement des capacités de construction du consensus dans le cadre d'une stratégie de prévention de la violence politique ;
- L'appui aux initiatives de la société civile en matière de prévention de la violence et de promotion du dialogue.

Dans cette phase finale du projet, les priorités stratégiques se situent au niveau de la valorisation des résultats atteints dans une perspective de dissémination des leçons apprises et de capitalisation pour initier de nouveaux partenariats.

- Le renforcement des capacités de construction de consensus et de facilitation du dialogue en milieu universitaire, dans le cadre d'une vision pour le renforcement de la cohésion sociale en milieu universitaire.

Liste des acronymes

ARP	Assemblée des représentants du peuple
ISIE	Instance supérieure indépendante pour les élections
MESRS	Ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique
ODD	Objectifs de développement durable
ONG	Organisation non gouvernementale
OSC	Organisations de la société civile
OTCS	Organisation tunisienne pour la cohésion sociale
PNUD	Programme des Nations unies pour le Développement
PEV	Prévention de l'extrémisme violent
PTA	Plan de travail annuel
SNU	Système des Nations unies
TDR	Termes de référence
UNDAF	Plan cadre des Nations unies pour l'aide au développement

I- Résumé exécutif

Lors du deuxième trimestre, les activités du projet ont été consacrées à l'avancement des instances phares, notamment celles relatives au renforcement de la cohésion sociale dans l'espace universitaire.

A ce titre, **l'étude et cartographie des dynamiques de conflits dans l'espace universitaire** a été affinée et enrichie par des données empiriques grâce à l'organisation les 25 et 26 mai à Hammamet **d'un Focus group** réunissant 19 jeunes étudiants provenant de dix gouvernorats différents et sélectionnés parmi les étudiants engagés dans la vie étudiante de leurs universités respectives. Ceci dans la continuité des premiers ateliers organisés les 26 et 27 janvier, puis le 5 mars 2019. Ce dernier atelier a été mis en œuvre dans une logique inclusive et en adoptant une méthodologie sensible au genre. Il a permis de recueillir des données qualitatives sur les dynamiques de conflits propres à chaque région ainsi que les mécanismes existant et potentiels pour les gérer **#evidence1**.

D'autre part, dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale dans l'espace universitaire, **la vision stratégique du MESRS** a été déclinée en **plan d'action** en vue de son opérationnalisation. **Une matrice opérationnelle sur deux ans** a été élaborée en concertation avec le MESRS ainsi que **neuf fiches projets** en vue de soutenir le ministère dans ses efforts de concrétisation de ce projet ambitieux **#evidence2**.

Dans le cadre de **l'appui aux initiatives de la société civile pour le renforcement de la cohésion sociale**, le deuxième trimestre a été marqué par la clôture des projets associatifs entrepris par 20 OSC en vue de la promotion du rôle des femmes dans le renforcement de la résilience Communautaire face à l'extrémisme violent en milieu rural. La **revue finale des projets** s'est ainsi tenue le 12 avril en présence des représentants des OSC partenaires. Elle a permis de présenter les résultats atteints ainsi que les leçons apprises et les perspectives de pérennisation. **#evidence4** La revue a aussi servi à recueillir les feedback des associations partenaires et à documenter leur retour sur expérience afin d'alimenter le recueil de bonnes pratiques et de leçons apprises pour la contribution de la société civile à la PEV.


II- Résultats détaillés

- ❖ **Output 2.1 : Les capacités de construction du consensus sont renforcées dans le cadre d'une stratégie de prévention de la violence**

Indicateurs de résultats	Données de référence à fin 2018	Cibles 2019 (cumulatives)	Résultat à la date du rapport
2.1.4 Produits de connaissance élaborés	2.1.4 - 3	2.1.4 - 7	2.1.4 - 4 - L'étude sur les dynamiques de conflits dans l'espace universitaire est en cours d'élaboration - L'étude sur les dynamiques d'instabilité dans les localités d'implantation des CLS est en cours de finalisation - Le plan d'action pour l'opérationnalisation de la vision stratégique du MESRS a été élaboré
2.1.6 Disponibilité de données qualitatives sur les potentialités de résilience des communautés face à l'EV	2.1.6- Non disponible	2.1.6 - 4 Ressources sont disponibles (cartographie générale des potentialités de résilience à l'extrémisme violent dans le contexte tunisien, un rapport avec un focus sur les jeunes et un rapport spécial femmes rurales)	2.1.6 - - L'étude de documentation de la contribution des femmes à la PEV en milieu rural a été consolidée elle est en phase de finition - L'étude empirique sur l'EV vu et appréhendé par les jeunes à été consolidée sa finalisation est en cours - L'étude et cartographie des potentialité de resilience communautaire et territoriale face à l'EV est en cours d'élaboration
2.1.7 Le nombre de réseaux de facilitateurs locaux mis en place	2.1.7 - 0	2.1.7 - 2	2.1.7 - 0

2.1.4. Dans la continuité du soutien apporté au MESRS par le PNUD pour l'élaboration participative d'une vision stratégique valorisant l'université comme espace de dialogue au service de la cohésion sociale, en consultation avec l'ensemble des acteurs du secteur, cette vision a été déclinée en plan d'action qui définit les objectifs stratégiques

et approches préconisées afin de promouvoir l'Université comme un espace de dialogue et d'échange. Il permettra l'élaboration de fiches projets, de budgétiser et opérationnaliser les activités prévues. #evidencez

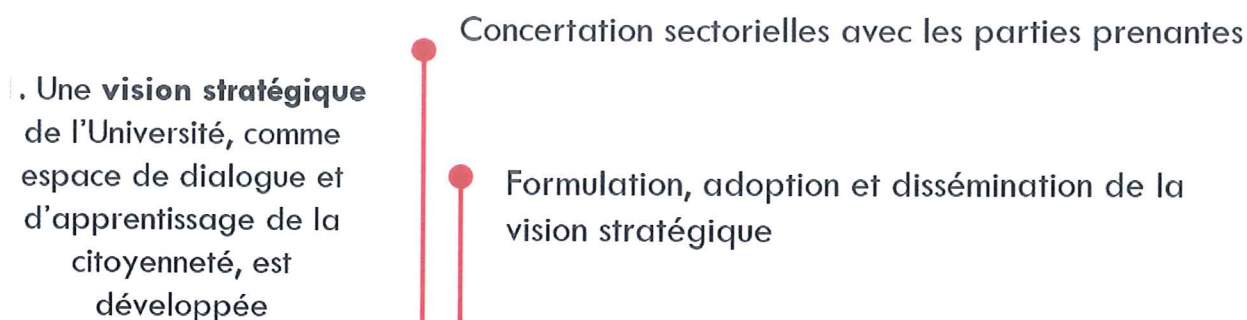

Dans le cadre de la stratégie de mobilisation des ressources, le projet d'appui PNUD pour le renforcement de la cohésion sociale dans l'espace universitaire a été présenté aux partenaires techniques et financiers lors de la réunion, sous forme de dîner, le 30 mai 2019 afin de réaffirmer la pertinence du projet pour renforcer rôle de l'université dans le renforcement de la cohésion sociale, et d'identifier des opportunités de partenariats. Les institutions suivantes étaient présentes : L'ambassade italienne (en présence de l'ambassadeur), Konrad Adenauer Stiftung, Ambassade du Canada, Ambassade du Royaume-Uni, Ambassade de Suisse, la Coopération du Danemark, le Consulat Général Honoraire du Danemark, le Consulat Général Royal de Norvège. #evidence3




Le représentant résident du PNUD, le Ministre de l'enseignement supérieur, le représentant résident adjoint du PNUD et le CTP du projet Tamkeen lors de la rencontre dîner avec les bailleurs de fonds



Les représentants des partenaires techniques et financiers potentiels ont eu un échange avec le ministère pour mieux s'approprier le projet

L'étude et la cartographie des dynamiques de conflits dans les universités est en cours de finalisation. Elle vise à améliorer la connaissance sur les facteurs et dynamiques de conflits propres à l'espace universitaire, et identifier les potentialités de résilience de l'université afin de concevoir des mécanismes de prévention, de régulation et de résolution des conflits. Elle permettra, notamment, d'informer le processus de conceptualisation et opérationnalisation du dispositif de veille et de gestion des conflits dans l'espace universitaire.

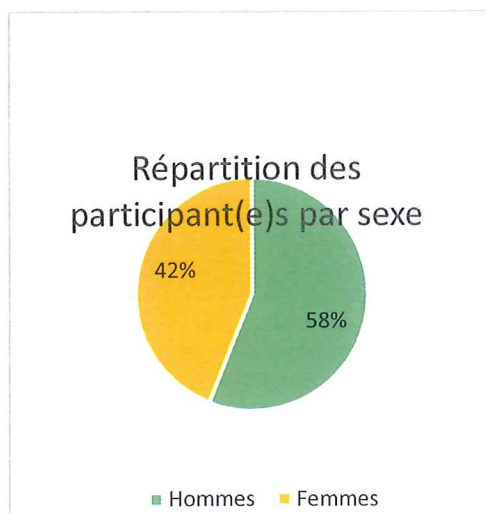

Dans le cadre de l'élaboration de cette étude et cartographie, un atelier de réflexion sur les dynamiques de conflits dans l'espace universitaire a été réalisé, en présence de 16 étudiants et trois diplômés récents (dont 8 femmes et 11 hommes). Un participant, en sa qualité de doctorant, enseigne déjà à l'université. Plusieurs participants exercent en parallèle de leurs études des activités professionnelles en freelance ou en tant que salariés, soit dans leur domaine de spécialité ou en dehors.

Répartition des participants selon les régions	
Profils	Nombre
Sousse	5
Jendouba	3

Répartition des participants selon les diplômes/formations

Tunis	3	Profils	Nombre
Bizerte	2	Licence	6
Sfax	1	Master	4
Mahdia	1	Doctorat	2
Monastir	1	Formation professionnelle	1
Kef	1	Formation privée	1
Kairouan	1	Diplômés	3
Nabeul	1		
Total	19		




Un échantillon représentatif des profils étudiants participant au Focus Group sur les dynamiques de conflits dans l'espace universitaire

Cet atelier, réalisé sous forme de *focus group discussions*, s'est inscrit dans la continuité de la réflexion engagée lors des premiers ateliers du mois de janvier et de mars, et avait pour objectif d'identifier et analyser les conflits minant la cohésion sociale au sein de l'Université, en tenant compte des typologies, sources, acteurs, etc., et d'identifier les facteurs de résilience de l'espace universitaire. L'atelier de réflexion visait également à engager une réflexion inclusive et participative, afin de recueillir les besoins et les attentes des jeunes étudiants pour le renforcement de la cohésion sociale à l'Université, et de fournir des données empiriques à l'étude sur les dynamiques de conflits au sein de l'espace universitaire.



Diagnostic participatif avec les représentants des étudiants pour alimenter l'étude sur les dynamiques de conflits dans l'espace universitaire

Engager une réflexion avec des jeunes et principalement des étudiants constitue un élément fondamental de l'approche inclusive et participative qu'intègre le projet d'appui à la cohésion sociale en l'espace universitaire. Les résultats de l'atelier a permis d'alimenter l'étude et la cartographie des dynamiques de conflits dans l'espace universitaire en cours de finalisation.

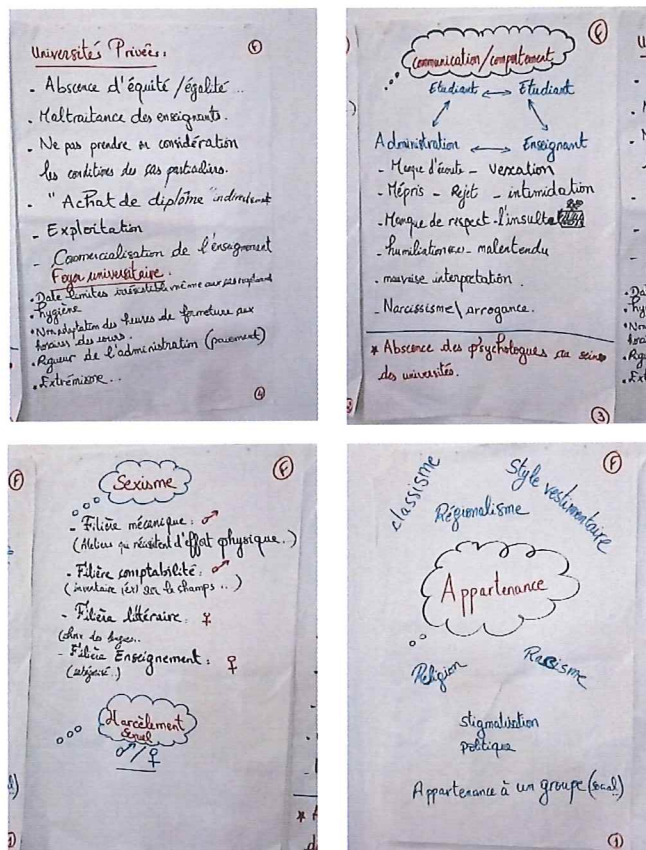

Exemples des travaux du Focus group des étudiants pour le diagnostic des dynamiques de conflits dans l'espace universitaire

❖ **Output 2.2 Les initiatives de la société civile en matière de prévention de la violence et de promotion du dialogue sont appuyées.**


Indicateurs	Données de référence	Cibles annuelles	Résultat à la date du rapport
2.2.1 # D'initiatives de la SC appuyées	2.2.1-83	2.2.1- 83	2.2.1 – 20 OSC bénéficient d'un appui technique et financier pour la mise en œuvre d'initiatives locales visant la contribution des femmes au renforcement de la résilience communautaire face à l'extrémisme violent
2.2.2 # de produits de capitalisation et de plateformes de gestion des connaissances et des bonnes pratiques générés par le projet	2.2.2-22	2.2.2- 26	2.2.2- 22

2.2.1 Les initiatives de la société civile visant l'appui à la contribution des femmes à la résilience communautaire face à l'extrémisme violent en milieu rural ont été clôturées lors d'une revue finale qui s'est tenue du 12 au 14 avril.

La revue a été l'occasion de réunir le **38 representants** des associations partenaires qui étaient venus présenter leurs résultats atteints et partager leurs expériences dans la mise en œuvre de ces projets. Les projets en question s'étaient déployés dans 4 gouvernorats prioritaires et avaient ciblé des zones retranchées du milieu rural particulièrement vulnérable à l'extrémisme violent. Au total **568** femmes leaders avaient été identifiées par les OSC pour leur engagement auprès de leur communauté et leur prédisposition à jouer un rôle positif dans le renforcement de la cohésion sociale et la PEV par la promotion du dialogue et l'inclusion des jeunes. Les initiatives mises en œuvre se sont articulées autour de ces femmes leaders afin de leur fournir un renforcement de capacité transversal, sous forme de formation en communication et technique de dialogue et de gestion de conflit, mais aussi en montage de projet et en matière de production artisanale et agricole selon leurs domaines de prédilection. Les femmes leaders ont de même été impliquées tout au long des six mois des projets dans diverses activités communautaires de débats, de projection de films et de discussions sur les enjeux de la PEV. Les OSC se sont de même employés à accompagner les femmes leaders dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus en parallèle avec leur mise en réseau avec les différents acteurs de la communauté (autorités locales, société civile, comités locaux de sécurité) afin de renforcer le rôle pivot des femmes dans leur communauté tout en garantissant leur autonomisation économiques.

Retrospective de l'appel en chiffres

- Date de publication de l'annonce : 29 juin 2018 ;
- Clôture de l'appel : 31 août 2018 ;
- 06 journées d'information organisées pour diffuser l'appel à propositions ;
- 81 dossiers ont été soumis ;
- 02 experts ont procédé à l'évaluation préalable des propositions, sur la base d'une grille de notation avec un score maximal de 100 points. La note minimale requise a été fixée à 60 points ;
- 40 projets présélectionnés ;
- 20 projets sélectionnés par le panel de sélection ;
- 05 régions cibles couvertes : 8 à Jendouba, 6 à Médenine, 2 à Tataouine, 2 à Bizerte et 1 à Kairouan. Le projet de l'OTCS est horizontal ;
- 394 730 TND octroyés ;
- 19 projets sur 06 mois et 01 projet sur 09 mois ;
- Date de signature des MoU : 30 septembre 2018 ;
- Cloture officielle des projets 31 mars 2019

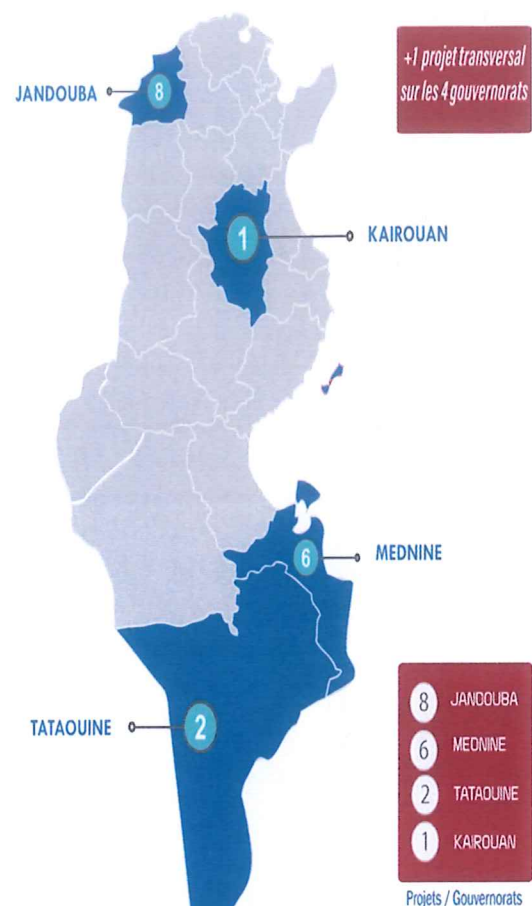

Revue finale des projets associatifs

Acronyme	N° femmes ciblées Directement	Dont jeunes (35 ans)	N° cercles de dialogue	N° participants aux cercles	Dont jeunes (35 ans)	N° formations PEV	N° participants formations PEV	Dont jeunes (35 ans)	N° Formations habilitation économique	N° participants formations habilitation économique	Dont jeunes (-) 35 ans	N° femmes ciblées Indirectement
ACL Djerba	25	12	3	80	40	4	100	45	3	70	35	200
AJEM	26	17	4	104	70	1	26	17	2	52	34	100
AAD BG	80	50	3	50	30	2	100	70	2	50	35	300
ADEJ	27	27	4	90	70	4	70	60	5	75	70	150
AEDM	20	15	2	40	30	2	40	30	1	20	15	50
AFRJ	20	12	4	150	120	4	90	108	5	180	130	250
ADAAS	10	9	5	50	15	5	50	15	5	90	80	270
AJPCA	67	50	4	40	30	2	36	20	2	40	35	100
Nama	13	10	11	100	70	2	76	56	2	26	20	100
ADESM	30	30	0	0	0	1	40	40	1	42	42	120
ATSR	20	8	5	300	100	1	25	10	0	0	0	120
ADRS	18	9	1	90	40	2	18	9	3	18	9	80
AFCD	30	15	5	60	35	0	0	0	2	82	35	126
AKED	24	16	3	90	70	1	24	16	3	24	16	468
ADCJ	30	22	3	42	30	2	40	32	1	30	22	90
ACDNO	10	8	10	112	60	1	30	16	2	10	8	120
TNT	20	10	7	30	15	2	20	10	1	20	10	60
CUAM	30	18	3	55	43	2	30	15	1	30	18	90
ASBL	30	30	3	65	40	2	30	15	1	30	30	100
OTCS	38	29	0	0	0	2	38	29	0	0	0	0
Total	568	397	80	1 548	908	42	883	613	42	889	644	2 894
		70			59			69			72	

*Les résultats en chiffres des initiatives associatives appuyées
Bénéficiaires, activités phares, jeunes et femmes mobilisés*



Les femmes leaders de Jlij-Djerba participent à un atelier de renforcement des softs skills et competences de vie



Les artisanes de Sejnane exposant leur poterie lors du Forum de Tunis pour l'égalité de genre

**FORUM DE TUNIS
SUR L'ÉGALITÉ DE GENRE
24,25,26 AVRIL 2019**

Le PNUD organise:

LE SOUK DU FORUM: EXPO-VENTE ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR
du 24 au 26 avril 2019, à la cité de la culture



Affiche de l'expo vente des artisanes bénéficiaires d'appui lors du forum de Tunis pour l'égalité de genre



Expo-vente collective des associations féminines de Djerba des produits de terroir à l'issue du projet d'appui à la contribution des femmes à la résilience communautaire face à l'extrémisme violent

III- Défis de mise en œuvre et suivi des risques

Risque	Nature	Impact et Probabilité d'occurrence	Evolution du risque	Mesure de mitigation et niveau de mise en œuvre
Risque # 1: La situation sécuritaire a conduit au ralentissement de la mise-en-œuvre des activités du projet, notamment l'organisation de missions de terrain dans le cadre de l'accompagnement et du suivi des associations partenaires.	Sécuritaire	I= 4 P= 1	Le risque s'est nettement amoindri vu l'amélioration de situation sécuritaire lors des derniers mois.	L'équipe du projet surveille avec attention l'évolution de la situation sécuritaire
Risque #3: La faiblesse des capacités des OSC est de nature à entraver la mise en œuvre de leurs initiatives.	Operationnel	I=2 P=3		Le dispositif de suivi des OSC a été renforcé, afin de permettre un accompagnement plus rapproché et plus personnalisé. Des réunions bilatérales de cadrage entre l'équipe du projet et les OSC partenaires ont permis d'affiner les plans d'action, de revoir le budget et de définir des approches plus innovantes .
Risque #4 : La thématique de l'extrémisme violent est nouvelle et les organisations de la société civile manquent d'expertise dans ce domaine.	Opérationnel	I= 2 P= 3	Le risque est toujours présent compte tenu de la nouveauté de la thématique.	L'équipe du projet met en place des mesures d'accompagnement techniques spécifiques permettant le renforcement des capacités et un suivi rapproché auprès des OSC. Ces mesures permettent un apprentissage progressif de la part des OSC et leur familiarisation progressive avec ce domaine d'intervention.

Risque	Nature	Impact et Probabilité d'occurrence	Evolution du risque	Mesure de mitigation et niveau de mise en œuvre
Risque #5 : Le caractère délicat et sensible de la thématique de l'extrémisme violent est susceptible de recevoir un mauvais accueil et de générer des interprétations incorrectes de la part des parties-prenantes du projet.	Opérationnel	I = 3 P = 1	Le risque est toujours présent mais devient peu probable car les population cible sont à présent familiarisées avec le projet.	L'équipe du projet veille à la qualité de la communication autour des activités, et notamment à la clarté de l'exposé de l'objet et des objectifs poursuivis par les actions. Les projet sont portés par des OSC locales et s'appuient sur des personnes ressources qui bénéficient de la reconnaissance et de la confiance des populations.
Risque #6 Remaniements au niveau de la partie nationale pouvant causer une discontinuité ou des retards	politique	P Elevé I Faible	—	Le projet veillera à impliquer les responsables des structures permanentes du MESRS dans la conduite des activités et la formation d'une équipe chargée du suivi périodique de l'état d'avancement du projet.
Risque #7 : Faible mobilisation des ressources	stratégique	P Moyen I Elevé	—	Mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources Impliquer le MESRS de manière active dans la mobilisation et le plaidoyer Mobiliser des ressources additionnelles auprès d'autres donateurs potentiels Réduire les activités en cas d'une insuffisance de ressources financières.
Risque #8 : Persistance et exacerbations des mouvements contestataires de manière à compromettre la mise en œuvre des activités	Politique /Opérationnel	P Elevé I Moyen	—	Recruter un consultant pour assurer l'appui au ministère et la communication avec le PNUD et qui permet de désamorcer les blocages. Rendre compte de certaines activités en

Risque	Nature	Impact et Probabilité d'occurrence	Evolution du risque	Mesure de mitigation et niveau de mise en œuvre
				attendant que la situation s'apaise Apporter des ajustements aux activités prévues
Risque #9 : Tensions dues aux élections législatives et présidentielles	Politique	I=2 P=2	L'approche des élections augmente les tensions.	Assurer la mise en œuvre du dispositif de médiation dès la rentrée scolaire.

IV- Leçons apprises et défis de mise en œuvre

- Un appui institutionnel a été fourni au MESRS afin de garantir une bonne mise en œuvre des activités prévues selon le chronogramme planifié et de mitiger les risques de retrad induits par la recurrence des mouvements contestataires qui ont affecté cette année la marche de l'année universitaire ;
- L'implication active du partenaire national (MESRS) dans le plaidoyer, la prospection et la mobilisation des fonds est un gage d'appropriation particulièrement important pour susciter l'interet des partenaires techniques et financiers ;
- Le réseautage des femmes leadres beneficiaires permet de démultiplier leurs capacités d'action et de garantir la perennité de l'intervention par la mise en place de canaux informel de solidarité.

V- Suivi-évaluation

Le présent rapport représente le deuxième rapport de progrès trimestriel pour l'année 2019. Un autre rapport de progrès pour le troisième trimestre est prévu en 2019 ainsi qu'un rapport annuel.

. Une évaluation à mi-parcours du projet a été lancée lors du troisième trimestre 2018.

VI- Evidences

Evidence #	Type	Titre	Date de publication	Auteur
1	Rapport	Compte-rendu de l'atelier de réflexion sur les dynamiques de conflits dans l'espace Universitaire	Mai 2019	PNUD
2	Document stratégique	Plan d'action de la vision du MESRS pour la cohésion sociale en milieu universitaire	Avril 2019	PNUD MESRS Bureau d'études
3	Rapport	Compte-rendu de la réunion de mobilisation de ressources en présence des partenaires techniques et financiers du 30 mai 2019.	Mai 2019	PNUD
4	Rapport	Compte-rendu de la revue finale des projets associatifs sur la contribution des femmes à la résilience communautaire face à l'extrémisme violent en milieu rural	Avril 2019	PNUD

VII- Rapport financier

L'utilisation des ressources et le niveau de décaissements par activité, au 30/06/2019, sont détaillés comme suit (en USD) :

Tableau 1 - Dépenses cumulées au 30 Juin 2019 – Sommaire par Activité Atlas (en USD)

Bailleur	Contribution s reçues	Dépenses		Total	%
		A5	A6		
Norvège	2 023 499	845 034	877 115	1 722 149	85%
Suisse	194 388	194 388	-	194 388	100%
TOTAL	2 217 887	1 039 422	877 115	1 916 537	86%

Tableau 2 - Dépenses cumulées au 30 juin 2019– Sommaire par donateur (en USD)

Bailleur	Contribution engagée	Contribution reçue	Dépenses						%	Solde
			2016	2017	2018	T1/2019	T2/2019	Total cumulé		
Norvège	2 000 000	2 023 499	534 721	504 795	554 795	78 134	49 704	1 722 149	85%	301 350
Suisse	194 388	194 388	0	0	194 388	0	0	194 388	100%	0
TOTAL	2 000 000	2 023 499	534 721	504 795	554 795	78 134	49 704	1 916 535	86%	301 350

VIII- Signatures

Pour le partenaire de mise en œuvre

Nom : Mohamed El Mounir

Titre : Conseiller Technique Principal

Signature :

Date :

Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Nom : Alissar Chaker

Titre : Représentante Résidente Adjointe

Signature :

Date :

05/11/2019

IX - Annexes

- Plan de travail annuel
- Document de projet
- Evidences mentionnées dans la section "VI-Evidences"
- Rapport d'assurance qualité du projet (si applicable)
- Rapport de visite de terrain
- Revue de presse
- Divers
