DocuSign Envelope ID: 385B142A-49D9-464C-96F1-FAFA4BD86E71

DocuSign Envelope ID: 41F75FB5-2F0E-4A3E-B152-D98BE3C4A7BA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

MINUTA

Reunión Junta de Proyecto

00115497 "Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas (SINERGIA+)"

Fecha: 30 de mayo 2022

Hora: 17:00 hrs.

Modalidad: Sesión virtual

Objetivo de la reunión

Presentar ante la Junta de Proyecto la propuesta de revisión sustantiva del proyecto "Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas (SINERGIA+)", con el objetivo de ampliar su vigencia al 31 de diciembre 2024, para cumplir con las nuevas metas y prioridades institucionales de la CONANP, así como reflejar el aumento presupuestal asociado a esta extensión de tareas y tiempo de implementación.

Asistentes

Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- María Teresa Cerón Vélez. Coordinadora de Proyección de Cooperación Internacional. Dirección General de Operación de Proyectos en México. AMEXCID.
- Patricia Lizeth Bustamante Hernández. Especialista para la Pólítica de Cooperación con países europeos. Dirección General de Operación de Proyectos en México. AMEXCID.

Personal de la CONANP

- Humberto Adán Peña Fuentes. Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
- José Feliciano González Jiménez. Director General de Desarrollo Institucional y Promoción.
- César Augusto Corzo Velasco. Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional.

Personal PNUD

- Edgar González González. Oficial de Programas de Medio Ambiente, Energía y Resiliencia.

Personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto Sinergia+

- Jorge Bustillos Roqueñí. Coordinador General del Proyecto.
- Rosalba Obregón Viloria. Especialista en M&E y Apoyo Administrativo.

DocuSign Envelope ID: 385B142A-49D9-464C-96F1-FAFA4BD86E71

DocuSign Envelope ID: 41F75FB5-2F0E-4A3E-B152-D98BE3C4A7BA

Orden del día

1. Bienvenida por parte del equipo PNUD
2. Breve presentación de los participantes
3. Presentación de la dinámica de la Junta de Proyecto
4. Presentación del proyecto y sus modificaciones 2022-2024
5. Sesión de comentarios, preguntas y respuestas
6. Acuerdos y comentarios finales
7. Cierre de Sesión

1. Bienvenida por parte del equipo PNUD

La sesión virtual inició con las palabras de bienvenida de Jorge Bustillos, Coordinador General del Proyecto Sinergia+, quien agradeció la presencia de las y los asistentes y explicó que la reunión tenía como objetivo aprobar la extensión del proyecto Sinergia + al 31 de diciembre de 2024.

2. Breve presentación de los participantes

Edgar González, Oficial de Programas de Medio Ambiente, Energía y Resiliencia del PNUD México, invitó a los participantes a presentarse, indicando su nombre, cargo e institución que representan, así como explicó los objetivos de la reunión y agradeció la disponibilidad de los asistentes para la valoración de los ajustes propuestos.

Humberto Adán Peña Fuentes, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hizo mención de la importancia de la alianza PNUD-CONANP a través del proyecto Sinergia+, en especial en esta nueva etapa en la cual se acompañará y fortalecerá a la CONANP en el cumplimiento de sus objetivos prioritarios y estratégicos en el cierre de este sexenio.

También destacó la relevancia de llegar a tener 200 áreas naturales protegidas con nuevos decretos y desarrollar sus programas de manejo, así como continuar los que están pendientes o necesitan actualización. Estas metas requieren de un acompañamiento estratégico del proyecto y es lo que se espera lograr con su ampliación y los ajustes programáticos.

3. Presentación de la dinámica de la Junta de Proyecto

Jorge Bustillos y Edgar González compartieron con los asistentes la dinámica de la sesión, la cual consistió en revisar los ajustes, la justificación y la pertinencia, a fin de que la junta de Proyecto pudiera hacer la valoración de la propuesta.

Jorge Bustillos describió los principales propósitos de la revisión sustantiva del proyecto:

- Aportar las capacidades necesarias para atender el crecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el fortalecimiento del manejo efectivo de las mismas, con acciones que impliquen un valor agregado en su operación.

DocuSign Envelope ID: 385B142A-49D9-464C-96F1-FAFA4BD86E71

DocuSign Envelope ID: 41F75FB5-2F0E-4A3E-B152-D98BE3C4A7BA


- Incrementar o mantener el índice de i-efectividad para que las ANP permanezcan o ingresen en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN);
- Continuar fortaleciendo la elaboración o actualización de los Programas de Manejo de las ANP;
- Iniciar con un proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales en el tema de perspectiva de género;
- Reforzar el incremento de la recaudación en las ANP por el mecanismo de cobro de derechos;
- Fortalecer la gobernanza de las ANP a través de sus Consejos Asesores, incluyendo la perspectiva de género en la toma de decisiones;
- Ampliar la superficie protegida, ya sea a través de nuevos decretos de ANP o de certificados voluntarios para la conservación;
- Apoyar proyectos institucionales estratégicos para la conservación de las ANP.

Edgar González, puntualizó que se trata de una revisión sustantiva al proyecto y no un nuevo proyecto a desarrollar.

4. Presentación del proyecto y sus modificaciones 2022-2024

Jorge Bustillos y Rosalba Obregón realizaron la presentación de las modificaciones del proyecto para considerar su extensión. En síntesis, se destaca lo siguiente:

- El monto comprometido total al 2024 es de $415,200,000.00 pesos.
- La extensión del proyecto busca continuar con el fortalecimiento de la gestión y manejo de las ANP, principalmente en las siguientes áreas:

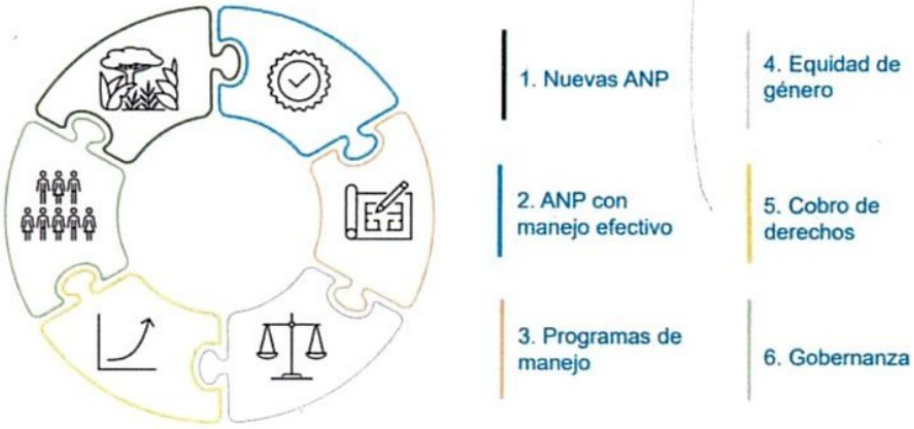

- El marcador de género cambia de GEN1 (contribución limitada a la igualdad) al GEN2 (Igualdad de género como objetivo significativo).

DocuSign Envelope ID: 385B142A-49D9-464C-96F1-FAFA4BD86E71
DocuSign Envelope ID: 41F75FB5-2F0E-4A3E-B152-D98BE3C4A7BA

- La Matriz de Riesgo y el Informe de Calidad del Proyecto (PQA por sus siglas en inglés) se actualizan, así como su árbol de problemas y su teoría de cambio.
- El Marco de Resultados se modifica incorporando Sub-Resultados, nuevos indicadores y metas.
- Los apartados de Resultados y Alianzas, Gestión del Proyecto y Monitoreo y Evaluación se actualizan.
- El apartado Seguridad se agrega con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad durante la operación del Proyecto.

También se señaló que el espacio de intervención del proyecto, al mes de mayo de 2022, es en 62 áreas naturales protegidas y regiones prioritarias para la conservación.

El cronograma de actividades y programa de trabajo se presentaron destacando que la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) llevará a cabo un seguimiento y monitoreo puntual para revisar los avances y las dificultades que se presenten en su desarrollo, e informarlo en el Comité Técnico y la Junta del Proyecto para su análisis y tomas de decisiones al respecto.

En los anexos de la minuta se anexa la presentación, el presupuesto por resultados, la revisión presupuestal asociada y los documentos necesarios que respaldan los ajustes al documento de proyecto conforme a la normativa del PNUD.

5. Sesión de comentarios, preguntas y respuestas

- Humberto Adán Peña, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, después de la presentación, subrayó la importancia de que, en esta nueva etapa el proyecto, se fortalezca el cobro de derechos por las visitas a las áreas protegidas. Este cobro es el mecanismo por el cual las áreas naturales protegidas autogeneran ingresos que complementan su operación y mejoran su impacto. Dichos montos cobrados, son canalizados periódicamente por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público a la CONANP y son insumos complementarios a los del presupuesto anual recibido para la institución del presupuesto de egresos, por lo que se convierten muy estratégicos para seguir fortaleciendo las acciones en las áreas protegidas.
- José Feliciano González Jiménez, Director General de Desarrollo Institucional y Promoción, hizo un reconocimiento al trabajo realizado tanto por la UCP y los directores generales de la CONANP para lograr modificar el Marco de Resultados con indicadores y metas puntuales que reflejan las prioridades institucionales.
- María Teresa Cerón Vélez, Coordinadora de Proyección de Cooperación Internacional de la Dirección de Operación de Proyectos en México de la AMEXCID, manifestó que la presentación fue muy clara y destacó la importancia de la colaboración del PNUD con la CONANP a través del Proyecto.
- Patricia Lizeth Bustamante Hernández, Especialista para la Política de Cooperación con países europeos de la Dirección de Operación de Proyectos en México de la AMEXCID, señaló que todo fue claro y no tenía comentarios sobre la presentación.

DocuSign Envelope ID: 385B142A-49D9-464C-96F1-FAFA4BD86E71

uSign Envelope ID: 41F75FB5-2F0E-4A3E-B152-D98BE3C4A7BA

- Edgar González, Oficial de Programas de Medio Ambiente, Energía y Resiliencia, agradeció las participaciones y pidió su visto bueno a los participantes para la extensión del proyecto.

6. Acuerdos y comentarios finales

- Los participantes a la Junta de Proyecto externaron su Visto Bueno y acordaron la Revisión sustantiva a los ajustes presentados, por lo que se instruyó dar el seguimiento necesario bajo la normativa del PNUD, para avanzar con la implementación en los términos previstos en el proyecto ajustado.

7. Cierre de la sesión

Se agradeció a todos los asistentes por su participación y se finalizó la sesión a las 18:15 horas.

Sección de firmas

Nombre y cargo	Firma
María Teresa Cerón Vélez. Coordinadora de Proyección de Cooperación Internacional. Dirección General de Operación de Proyectos en México. AMEXCID.	
Humberto Adán Peña Fuentes. Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la CONANP.	
José Feliciano González Jiménez. Director General de Desarrollo Institucional y Promoción, de la CONANP.	
César Augusto Corzo Velasco. Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP.	César Corzo
Edgar González González. Oficial de Programas de Medio Ambiente, Energía y Resiliencia del PNUD México.	DocuSigned by: Edgar Rafael Gonzalez Gonzalez 8288197E4906420...
Jorge Bustillos Roqueñí. Coordinador General del Proyecto Sinergia+.	DocuSigned by: AE6E0EBDE5F64E9...
Rosalba Obregón Viloria. Especialista en M&E y Apoyo Administrativo del proyecto Sinergia+.	DocuSigned by: 670A5025E25D4FE...
