

Tercera reunión de Junta de Proyecto

“Elaboración del primer informe bienal de transparencia de Honduras y la cuarta comunicación nacional y segundo informe bienal de transparencia como informe combinado bajo la CMNUCC (1BTR-4NC/2BTR)”

Informe anual 2025

- Avance en el cumplimiento de indicadores
- Porcentaje de ejecución financiera
- Principales actividades realizadas
- Principales logros y retos en el periodo
- Línea de tiempo
- POA 2026
- Actividades para avanzar en la ejecución 2026
- Anexos

Cumplimiento de indicadores

Indicador 1: # de beneficiarios directos desglosados por género	
80 personas (50% mujeres)	40 personas (17 mujeres, 43%)

Indicador 2: informe del Inventario Nacional , incluyendo el documento del inventario como las CRT.	
GEI 1990-2022 de conformidad con las MPG.	Completo, 100%

Indicador 3: capítulo BTR seguimiento a NDC, impactos y adaptación al cambio climático, , información de flexibilidades, apoyo recibido y necesitado, de acuerdo con las MPG.	
Capítulos compilados del BTR de acuerdo a las MPG.	Completo, 100%

Cumplimiento de indicadores

Indicador 4: informe del Inventario Nacional , incluyendo el documento del inventario como las CRT.	
GEI 1990-2024 de conformidad con las MPG.	20%, a completarse en tercer trimestre 2026

Indicador 5: 4CN/2BTR, seguimiento a NDC, impactos y adaptación al cambio climático, información de flexibilidades, apoyo recibido y necesitado, de acuerdo con las MPG.	
Capítulo 4NC/2BTR compilado de acuerdo con los requisitos de las MPG	20%, a completarse en el tercer trimestre 2026

Indicador 6: 4NC/2BTR capítulo sobre investigación, observación sistémica, educación, formación, concienciación pública y género proporcionado.	
Capítulo 4NC/2BTR compilado de acuerdo con los requisitos de las MPG	0%, a completarse en el tercer trimestre 2026

Cumplimiento de indicadores

Indicador 7:1BTR compilado, y presentado a la CMNUCC.	
Presentación del informe 1BTR a la CMNUCC antes de diciembre de 2024.	100%

Indicador 8:4NC/2BTR compilado, y presentado a la CMNUCC.	
Presentación del informe 4NC/2BTR a la CMNUCC antes de diciembre de 2026.	0%, a completarse a diciembre 2026

Indicador 9: # de informes de monitoreo compilados.	
6 informes (1 Informe del taller inicial, 4 Estudio de situación anual, 1 Informe de fin de proyecto).	50%

Porcentaje de ejecución del POA 2025

Presupuesto aprobado $	Proyección a diciembre 2025
$612,852.37	$245,209.11
Porcentaje	**40%**

Porcentaje de ejecución del proyecto 2024- 2025

Presupuesto aprobado $	Proyección a diciembre 2025
$1,233,000.00	$447,111.55
Porcentaje	**36%**

Principales actividades realizadas



34 reuniones de coordinación con actores.

3 sesiones virtuales y 5 sesiones presenciales para el fortalecimiento de capacidades técnicas (204 participantes, 59% mujeres).

Lanzamiento del 1BTR presentado por el país (62 personas, 43% mujeres).

12 giras/visitas a nivel nacional para la socialización del 1BTR y la coordinación con otros actores; visitando 19 municipios, 5 empresas, y alcanzando 173 personas (43 mujeres, 25%).

Principales actividades realizadas

Planes de mejora de cada sector del Inventario.

Coordinación con otras instituciones y proyectos.

Revisión de la estructura de la 4 CN, identificación de brechas de información e identificación de actualización de la información.

Evaluación del Plan Nacional de Adaptación.

Actualización del PNA.
Participación en actividades relativas a la actualización de La NDC 3.0

Incorporación de pérdidas y daños en la NDC 3.0

Reuniones semanales de equipo técnico.

Participación en Webinars y espacios de intercambio de experiencias a nivel nacional y regional sobre todo de espacios generados por CBIT GSP y ReCAT Hub(CCAD).

Generación de informes y memorias de actividades.

Logros alcanzados

Consolidación del equipo técnico, 1 BTR revisado y socializado, Inventario 1990-2022 actualizado, fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, estructuración de la 4CN y fundamentos del 2BTR.

Construcción de un plan de control de calidad y aseguramiento de la calidad tanto para el Inventario como para la construcción de los informes (BTRs), procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales de los equipos técnicos, implementación del plan de mejora de los sectores el Inventario.

Evaluación del PNA y actualización del mismo, fortalecimiento del componente de pérdidas y daños, proceso de actualización de la NDC 3.0.

Retos identificados



Funcionamiento del SINGEI



Sostenibilidad de los equipos técnicos

Funcionamiento del SNMCC para la gestión de información para informes a la CMNUCC

Apoyo a los sectores para la mejora de categorías clave



Construcción y manejo del sistema del inventario






Línea tiempo 2026

Contratación de Empresas consultoras INGEI, BTR, SNMCC.

Implementación del sistema del Inventario.

Construcción de capítulos del 2BTR
Acompañamiento de la construcción de la 4CN

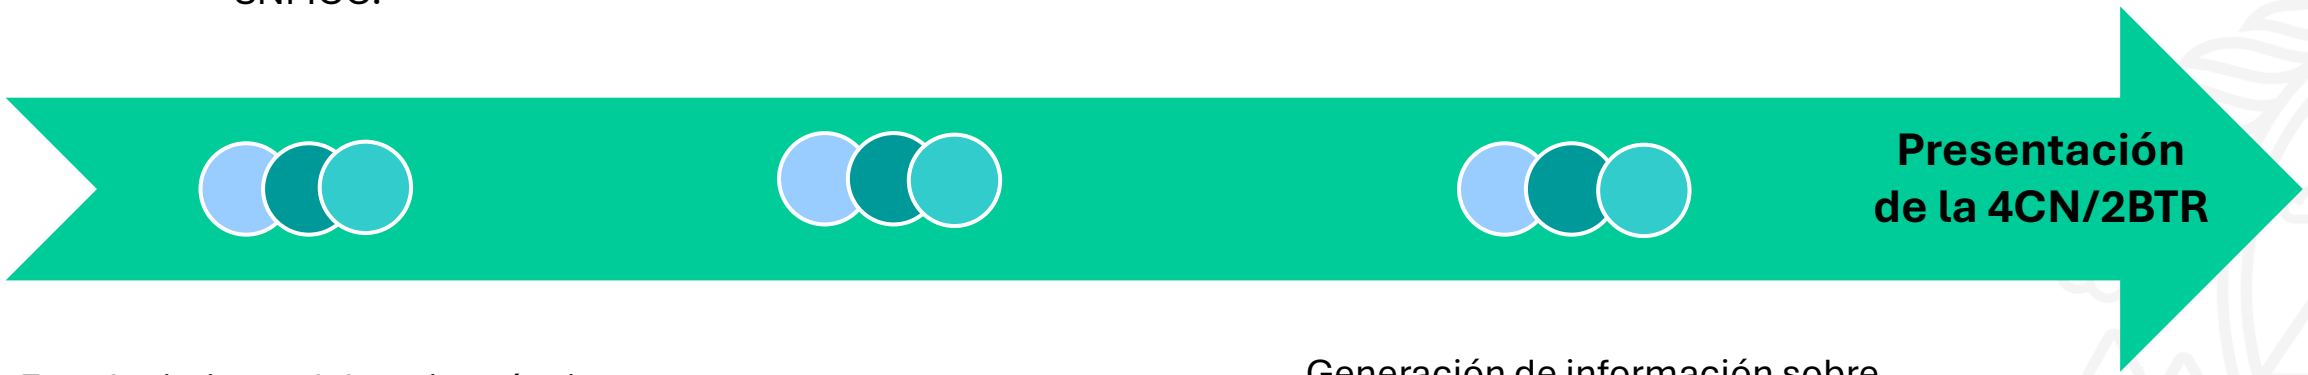

Fortalecimiento del equipo técnico
Contratación de apoyos en temas puntuales.

Desarrollo de procesos de capacitación.

Generación de información sobre cambio climático, sistematización y comunicación de la misma.

POA 2026

GEF Componente	GEF Resultado	GEF Producto	Parte Responsable	Código de Cuenta Presupuestaria Quantum	Descripción de la Cuenta Presupuestaria	Año 2026 (USD)	T1	T2	T3	T4	Total (USD)
Componente 1. Desarrollo del primer informe bienal de transparencia (1BTR) de Honduras	*Resultado 1.1 Honduras desarrolla su 1BTR como reporte independiente*	*1.1.1 Nuevo informe del inventario nacional de emisiones antropógenos por las fuentes y de absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero (1990-2022) para todos los sectores, en consonancia con los requisitos del Acuerdo de París*	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ -					$ -
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$154,418.83	$ 49,616.48	$104,802.35			$154,418.83
				71600	*Viáticos*	$ -					$ -
				Sub-Total del Producto		**$154,418.83**	**$ 49,616.48**	**$104,802.35**	**$ -**	**$ -**	**$154,418.83**
		Total Producto 1.1.1				**$154,418.83**	**$ 49,616.48**	**$104,802.35**	**$ -**	**$ -**	**$154,418.83**
		1.1.2 Información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación y el logro de la NDC hasta 2022 proporcionada, incluidas las estimaciones de las emisiones evitadas	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ -					$ -
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$100,357.73		$ 10,969.44	$ 82,694.14	$ 6,694.15	$100,357.73
				74200	*Costes audiovisuales y de impresión*	$ -					$ -
				71300	*Consultores Locales*	$ -					$ -
				75700	*Taller de formación y conferencia*	$ 13,294.02	$ 10,000.00	$ 3,294.02			$ 13,294.02
				Sub-Total del Producto		**$113,651.75**	**$ 10,000.00**	**$ 14,263.46**	**$ 82,694.14**	**$ 6,694.15**	**$113,651.75**
		Total Producto 1.1.2				**$113,651.75**	$ 10,000.00	$ 14,263.46	$ 82,694.14	$ 6,694.15	**$113,651.75**

		1.1.3 Información relacionada con los impactos del cambio climático y la adaptación hasta 2022 facilitada	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ 6,044.03	$6,044.03				$ 6,044.03
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$ -					$ -
				Sub-Total del Producto		**$ 6,044.03**	$ 6,044.03	$ -	$ -	$ -	**$ 6,044.03**
		***Total* Producto 1.1.3**				**$ 6,044.03**	$ 6,044.03	$ -	$ -	$ -	**$ 6,044.03**
		1.1.4 Información sobre el apoyo financiero, de desarrollo y transferencia de tecnología y de fomento de la capacidad necesario y recibido hasta 2022 facilitada	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ 14,287.70	$14,287.70				$ 14,287.70
				72100	*Servicios contractuales – Empresas*	$ -					$ -
				71300	*Consultores Locales*	$ 35,000.00		$ 11,666.68	$ 17,499.99	$ 5,833.33	$ 35,000.00
				Sub-Total del Producto		**$ 49,287.70**	$ 14,287.70	$ 11,666.68	$ 17,499.99	$ 5,833.33	**$ 49,287.70**
		***Total* Producto 1.1.4**				**$ 49,287.70**	$ 14,287.70	$ 11,666.68	$ 17,499.99	$ 5,833.33	**$ 49,287.70**
		1.1.5 Información sobre flexibilidad, áreas de mejora y otra información relevante, incluyendo género	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ 20,510.86	$1,716.45	$ 18,794.41			$ 20,510.86
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$ -					$ -
				Sub-Total del Producto		**$ 20,510.86**	$ 1,716.45	$ 18,794.41	$ -	$ -	$ 20,510.86
		***Total* Producto 1.1.5**				**$ 20,510.86**	$ 1,716.45	$ 18,794.41	$ -	$ -	**$ 20,510.86**
	***Total* Resultado 1.1**					**$343,913.17**	$ 81,664.66	$149,526.90	$100,194.13	$ 12,527.48	**$343,913.17**
***Total* Componente 1**						**$343,913.17**	$ 81,664.66	$149,526.90	$100,194.13	$ 12,527.48	**$343,913.17**
Componente 2. Elaboración de la Cuarta Comunicación Nacional y Segundo	*Resultado 2.1 Honduras 4NC/2BTR elaborado como*	*2.1.1 Informe actualizado del inventario nacional de emisiones antropógenos por las fuentes y de absorción por los*	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ -					$ -
				72100	*Servicios contractuales – Empresas*	$ 61,000.00				$ 61,000.00	$ 61,000.00
				71300	*Consultores Locales*	$ -					$ -

Informe Bienal de Transparencia (4NC/2BTR) de Honduras	*informe combinado*	*sumideros de gases de efecto invernadero (1990-2024) para todos los sectores, de conformidad con los requisitos del Acuerdo de París.*		*71600*	*Viáticos*	$ 15,072.91	$ 3,542.24	$ 3,542.24	$ 4,446.19	$ 3,542.24	$ 15,072.91
				Sub-Total del Producto		**$ 76,072.91**	$ 3,542.24	$ 3,542.24	$ 4,446.19	$ 64,542.24	**$ 76,072.91**
		***Total* Producto 2.1.1**				**$ 76,072.91**	$ 3,542.24	$ 3,542.24	$ 4,446.19	$ 64,542.24	**$ 76,072.91**
		2.1.2 Información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación y el logro de la NDC hasta 2024 proporcionada, incluidas las estimaciones de las emisiones evitadas	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ 18,941.45		$ 3,585.21	$ 15,356.24		$ 18,941.45
				72100	*Servicios contractuales – Empresas*	$ 15,000.00				$ 15,000.00	$ 15,000.00
				71300	*Consultores Locales*	$ -					$ -
				74200	*Costes audiovisuales y de impresión*	$ 7,391.96	$ 5,400.00		$ 1,991.96		$ 7,391.96
				75700	*Taller de formación y conferencia*	$ 25,454.41		$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 5,454.41	$ 25,454.41
				Sub-Total del Producto		**$ 66,787.82**	**$ 5,400.00**	**$ 13,585.21**	**$ 27,348.20**	**$20,454.41**	**$ 66,787.82**
		***Total* Producto 2.1.2**				**$ 66,787.82**	$ 5,400.00	$ 13,585.21	$27,348.20	$ 20,454.41	**$ 66,787.82**
		2.1.3 Información relacionada con los impactos del cambio climático y la adaptación hasta 2024 proporcionada	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$ 16,938.92	$5,187.81	$4,539.33	$3,890.86	$3,320.92	$ 16,938.92
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$59,250.00		$27,212.50	$27,212.50	$4,825.00	$59,250.00
				Sub-Total del Producto		**$76,188.92**	$5,187.81	$31,751.83	$31,103.36	$8,145.92	**$76,188.92**
		***Total* Producto 2.1.3**				**$76,188.92**	$ 5,187.81	$31,751.83	$31,103.36	$8,145.92	**$76,188.92**
		2.1.4 Información sobre el apoyo financiero, de desarrollo y transferencia de tecnología y de fomento de la	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$17,327.09	$5,187.81	$4,539.33	$3,890.86	$3,709.09	$17,327.09
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$18,500.00	$11,662.50	$6,837.50			$18,500.00
				71300	*Consultores Locales*	$ -					$ -

		capacidad necesario y recibido hasta 2024 facilitada		***Sub-Total del Producto***		**$35,827.09**	$16,850.31	$11,376.83	$3,890.86	$3,709.09	**$35,827.09**
		Total Producto 2.1.4				**$35,827.09**	$16,850.31	$11,376.83	$3,890.86	$3,709.09	**$35,827.09**
		2.1.5 Información sobre investigación, observación sistémica, educación, formación, sensibilización del público y género facilitada, de conformidad con las directrices aplicables de 17/CP.8 y 6/CP.25.	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$37,381.14			$4,098.04	$33,283.10	$37,381.14
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$ 5,518.86		$2,759.43	$2,759.43		$5,518.86
				Sub-Total del Producto		**$42,900.00**	$ -	$2,759.43	$6,857.47	$33,283.10	**$42,900.00**
		Total Producto 2.1.5				**$42,900.00**	$ -	$2,759.43	$ 6,857.47	$ 33,283.10	**$42,900.00**
		2.1.6 Información sobre flexibilidad, áreas de mejora y otra información pertinente, incluido el género	*SERNA*	*71800*	*Servicios contractuales - Socio Implementador*	$22,102.63	$4,479.68	$3,919.72	$3,359.76	$10,343.47	$ 22,102.63
				72100	*Servicios contractuales - Empresas*	$ -					$ -
				71600	*Viáticos*	$ 2,638.21			$2,638.20		$2,638.20
				Sub-Total del Producto		**$24,740.84**	$ 4,479.68	$ 3,919.72	$5,997.96	$10,343.47	**$24,740.83**
		Total Producto 2.1.6				**$24,740.84**	$ 4,479.68	$3,919.72	$5,997.96	$10,343.47	**$24,740.83**
	Total Resultado 2.1					**$322,517.58**	**$35,460.04**	**$ 66,935.26**	**$79,644.04**	**$140,478.23**	**$322,517.57**
Total Componente 2						**$322,517.58**	**$35,460.04**	**$66,935.26**	**$79,644.04**	**$140,478.23**	**$322,517.57**
	Resultado 3.1 1BTR recopilada, adoptada en un	*3.1.1 1BTR recopilada, adoptada en un proceso transparente y*	*SERNA*	*71300*	*Consultores Locales*	$10,000.00	$ 4,479.68	$3,919.72	$ 1,600.60		$10,000.00
				74200	*Costes audiovisuales y de impresión*	$4,000.00			$4,000.00		$4,000.00

	proceso transparente y participativo, y presentada a la CMNUCC antes de diciembre de 2024	*participativo, y presentada a la CMNUCC antes de diciembre de 2024*		*75700*	*Taller de formación y conferencia*	$5,000.00		$ 5,000.00			$ 5,000.00
				Sub-Total del Producto		$19,000.00	$4,479.68	$ 8,919.72	$ 5,600.60	$ -	**$19,000.00**
		***Total* Output 3.1**				**$19,000.00**	$4,479.68	$ 8,919.72	$ 5,600.60	$ -	**$19,000.00**
	Resultado 3.2 Honduras 4NC/2BTR recopilada, adoptada por el Gobierno y presentada a la CMNUCC	*3.2.1 4NC/2BTR recopilados, adoptados en un proceso transparente y participativo, y presentados a la CMNUCC antes de diciembre de 2026*		*71300*	*Consultores Locales*	$6,981.14			$1,759.16	$5,221.98	$6,981.14
				74200	*Costes audiovisuales y de impresión*	$7,018.86			$3,509.43	$3,509.43	$7,018.86
				75700	*Taller de formación y conferencia*	$ 5,000.00		$2,500.00		$2,500.00	$5,000.00
				Sub-Total del Producto		$19,000.00	$ -	$2,500.00	$5,268.59	$11,231.41	**$19,000.00**
		***Total* Output 3.2**				**$ 19,000.00**	**$ -**	**$ 2,500.00**	**$5,268.59**	**$ 11,231.41**	**$19,000.00**
***Total* Componente 3**						**$38,000.00**	**$4,479.68**	**$11,419.72**	**$10,869.19**	**$11,231.41**	**$38,000.00**
Componente 4. Monitoreo y Evaluación	*M&E*	*M&E*	*SERNA*	*75700*	*Talleres de entrenamiento y conferencia*	$2,887.65		$1,443.83		$ 1,443.83	$2,887.65
				Sub-Total del Producto		$2,887.65	$ -	$ 1,443.83	$ -	$1,443.83	$2,887.65
		***Total* M&E**				**$2,887.65**	$ -	$1,443.83	$ -	$1,443.83	**$2,887.66**
	***Total* Resultado M&E**					**$2,887.65**	$ -	$ 1,443.83	$ -	$1,443.83	**$2,887.66**
***Total* Componente 4**						**$ 2,887.65**	$ -	$1,443.83	$ -	$1,443.83	**$ 2,887.66**
Coste de gestión del proyecto	*CGP*	*CGP*	*PNUD*	*74100*	*Servicios profesionales*	$12,500.00		$ 6,000.00		$ 6,500.00	$12,500.00
			SERNA	***Sub-Total PNUD***		**$12,500.00**	$ -	$ 6,000.00	$ -	$6,500.00	**$12,500.00**
				71800	*Servicios contractuales socio implementador*	$46,010.02	$13,069.58	$11,435.88	$9,802.19	$11,702.37	$46,010.02

				72400	*Equipo de comunicación y audiovisual*	$4,212.93	$ 4,212.93				$4,212.93
				72500	*Supplies*	$1,223.13		$1,223.13			$1,223.13
				Sub-Total del Producto		**$ 51,446.08**	$17,282.51	$12,659.01	$9,802.19	$11,702.37	**$51,446.08**
***Total* Coste de gestión del proyecto**						**$63,946.08**	**$17,282.51**	**$18,659.01**	**$ 9,802.19**	**$18,202.37**	**$63,946.08**
Total de la Subvención						**$771,264.48**	**$138,886.89**	**$247,984.72**	**$200,509.55**	**$183,883.32**	**$771,264.48**

Resumen POA 2026

Actividad	Objetivo	Monto
Contratación empresas consultoras	Tener un SNMCC funcionando de manera óptima. Presentar el 2BTR/4CN Actualizar el Inventario de gases de efecto invernadero 1990-2024 Informar sobre el seguimiento al progreso de las NDC Reportar los apoyos recibidos y necesitados en materia de cambio climático Informar sobre los impactos del cambio climático y las medidas de adaptación implementadas. Reportar temas transversales en los informes a la CMNUCC. Darle sostenibilidad a los procesos de la DNCC. Visibilizar los esfuerzos del país en materia de cambio climático. Fortalecer los mecanismos de transparencia climática del país. Aportar a la transparencia global y metas globales, compromisos adquiridos por el país.	$414,045.42
Contrataciones de consultorías puntuales		$51,981.14
Personal técnico		$199,543.84
Fortalecimiento de capacidades	Generar capacidades técnicas en el personal de la DNCC para actualizar el Inventario GEI Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la SERNA y otras instituciones para realizar diferentes procesos vinculados al Cambio Climático.	$51,636.08

Actividades para avanzar en la ejecución 2026

Iniciar el proceso de publicación de TDR para la selección de las empresas que llevarán los procesos de:

Elaboración de 2BTR/4CN

Consolidación del SNMCC

Avanzar los trámites administrativos para que las nuevas autoridades decidan sobre estas contrataciones.

Noviembre -diciembre 2025

Elaborar los TDR de los puestos que se requieren para fortalecer el equipo técnico del proyecto y de las consultorías puntuales.

Sentar las bases de las próximas contrataciones.

Diciembre 2025

Realizar una planificación mas detallada de los procesos capacitaciones, reuniones, y consultas.

Mejorar la estimación del tiempo, temática e inversión para el fortalecimiento de capacidades y recolección/análisis de datos.

Enero 2026




Fotografías


BTR·CN
HONDURAS
HONDURAS


SERNA

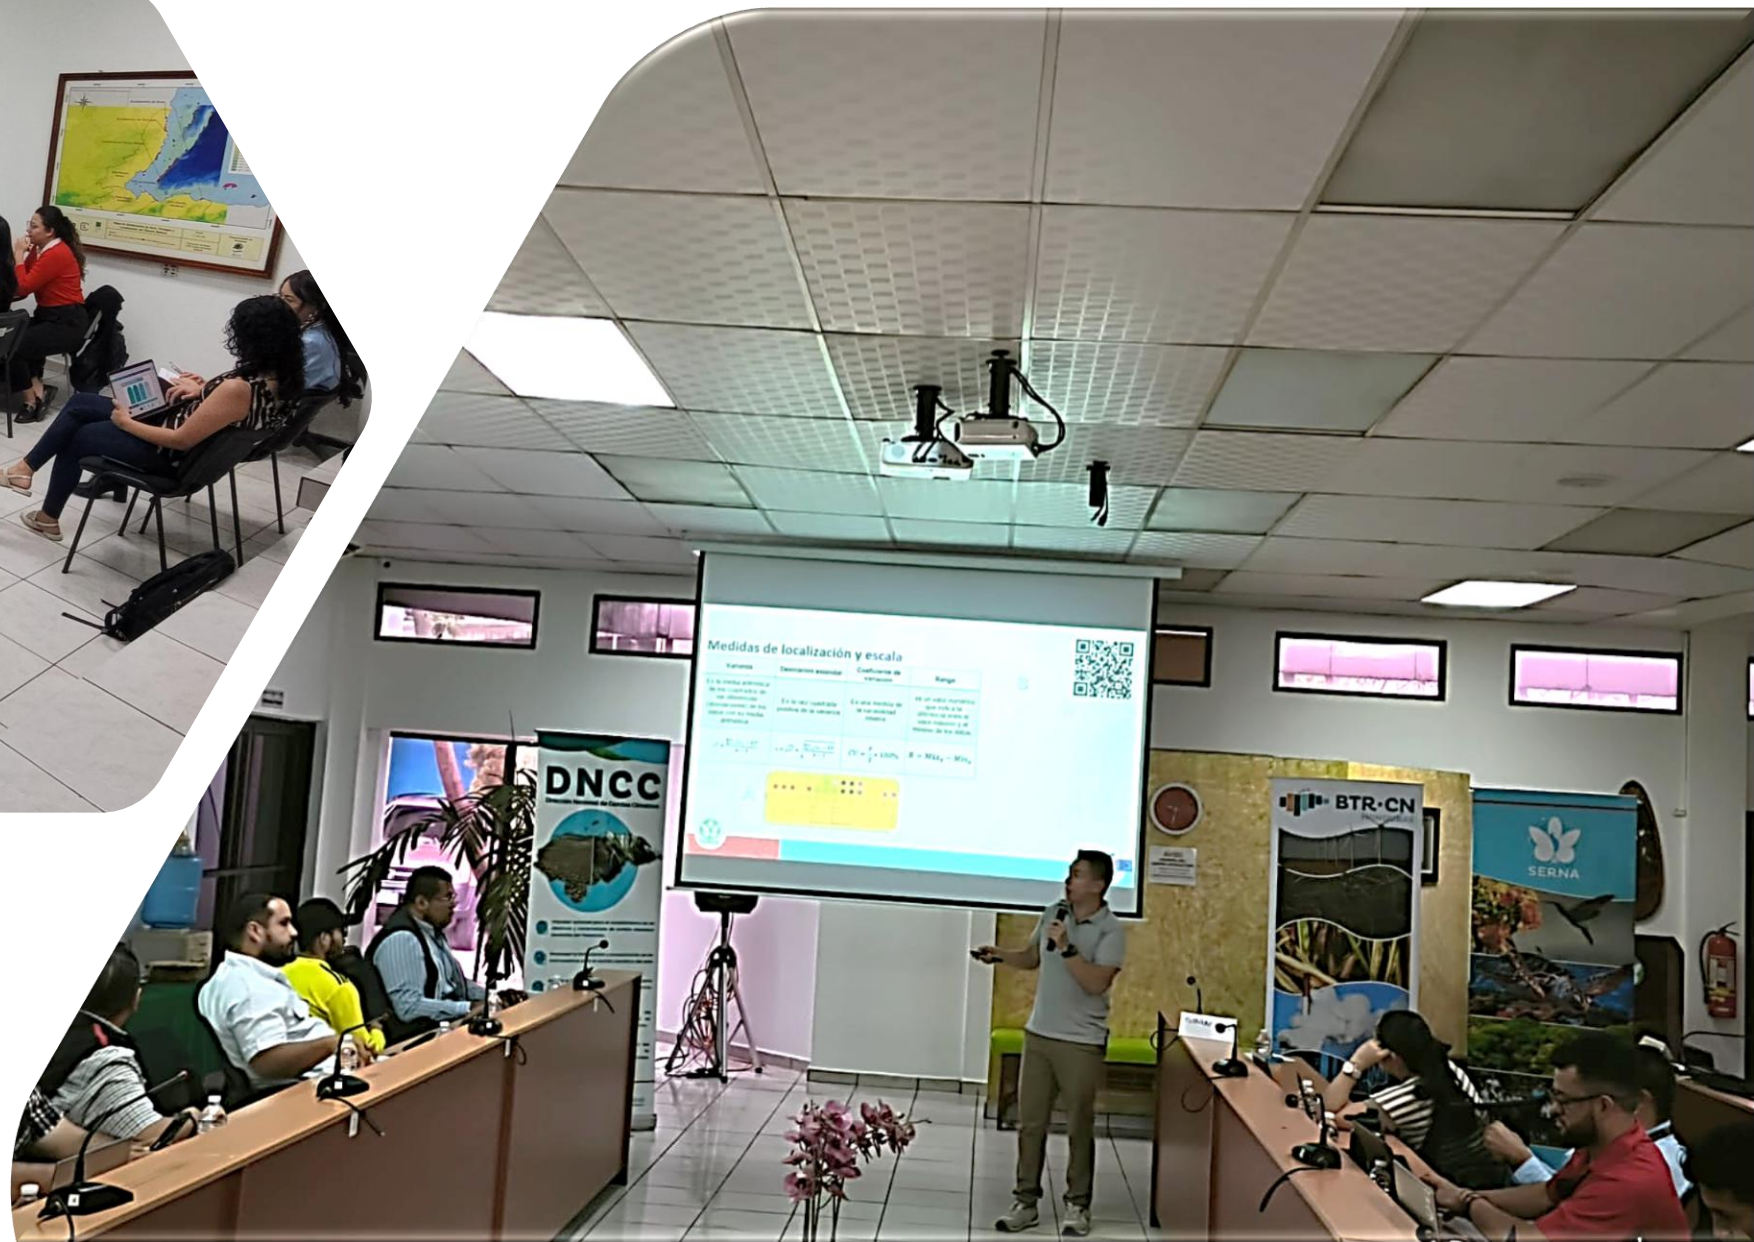


Medidas de localización y escala
DNCC
BTR·CN
SERNA


Paraíso Verde
Descarbonización de la Economía
Reportes Nacionales ante la CMNUCC




CERVECERÍA
HONDUREÑA



SERNA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Nacional de Cambio Climático

BTR·CN HONDURAS

gef

UNDP



¡Gracias!
