Projet : Appui à l'élaboration du Premier Rapport Biennal de Transparence (BTR1) et de la Quatrième Communication Nationale combinée au Second Rapport Biennal de Transparence (NC4&BTR2) de l'Algérie auprès de la CCNUCC

Rapport
Etat d'avancement (2024 – 2026)

Avril 2026

Pays : ALGERIE	Partenaire d'exécution Ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie	Arrangements de gestion : Modalité Nationale d'Exécution (NIM)
Catégorie de l'Examen Social et environnemental préalable du PNUD : Faible Risque		Marqueur du Genre du PNUD : *1*
Quantum Award ID: 1229631		Quantum Project ID: 01001439
UNDP PIMS ID number: 9666		GEF Project ID number: 11485
Date de démarrage : 15 avril 2024		Date d'achèvement : 15 avril 2028

PLAN DE FINANCEMENT

Fonds d'affectation spéciale du FEM	USD 1,233,000
Budget Total administré par le PNUD	USD 1,233, 000

Résumé exécutif

Le présent rapport résume et évalue l'état d'avancement des activités du Projet « Appui à l'élaboration du Premier Rapport Biennal de Transparence (BTR1) et de la Quatrième Communication Nationale combinée au Second Rapport Biennal de Transparence (NC4&BTR2) de l'Algérie auprès de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) », à fin avril 2026 et présente un état de l'exercice budgétaire pour la même période.

Ce rapport annuel du Projet, élaboré par l'Unité de Gestion du Projet (UGP), récapitule les progrès enregistrés depuis la création du projet. Il est structuré en deux grandes parties :

- La première reprend le contexte du projet, l'approche adoptée pour le réaliser, les parties prenantes identifiées, le dispositif opérationnel adopté ainsi que les structures de gouvernance et de gestion mises en place.
- La seconde énumère l'ensemble des réalisations opérationnelles et des consommations budgétaires planifié en 2026. Les ressources allouées aux activités durant la période allant du 2 avril 2024 au 31 décembre 2025, sont de l'ordre de 580 002 USD. Le budget total consommé jusqu'au 30 avril 2026 est de l'ordre de (580 002 + 33 740) USD soit 613 742 USD.

Liste des abréviations

ADE	Algérienne des eaux
AFAT	Agriculture, Foresterie et autre Affectation des Terres
AGIRE	Agence de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
ALNAFT	Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
ANAM	Agence Nationale des Activités Minières
ANBT	Agence Nationale des Barrages et Transferts
ANCC	Agence Nationale des Changements Climatiques
AND	Agence Nationale des Déchets
ANDRS	Agence Nationale de Recherche en Santé
ANRH	Agence Nationale des Ressources Hydriques
APRUE	Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie
ARH	Autorité Nationale de Régulations des Hydrocarbures
ASAL	Agence Spatiale Algérienne
BNEDER	Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural
BTR1	Premier rapport biennal de transparence
BTR2	Deuxième rapport biennal de transparence
BUR1	Premier rapport biennal actualisé
CC	Changement climatique
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CDER	Centre de Développement des Energies Renouvelables
CDN	Contributions Déterminées au niveau National
CERIST	Centre de Recherche en Information Scientifique et Technique
CN	Communications Nationales
CNC	Comité National Climat
CNESE	Conseil National Economique, Social et Environnemental
CNI	Communication nationale initiale
CNL	Commissariat national du Littoral
Condor	Condor Electronics
CoPil	Comité de pilotage
COT	Comité Opérationnel Technique
CREAD	Centre de Recherche en Economie Appliquée au Développement
CREG	Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
CRSTRA	Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides
DCC	Direction des changements climatiques
DGF	Direction générale des forêts
DIVINDUS	Groupe sectoriel local
DNP	Directrice nationale de projet
El-Hadjar	Complexe sidérurgique d'El-Hadjar
ENAVA	Entreprise Nationale de Verre et d'Abrasif
ENSEREDD	Ecole Nationale Supérieure des Energies Renouvelables, de l'Environnement et du Développement Durable
ENSSMAL	École Nationale des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral
FEM (GEF)	Fonds pour l'Environnement Mondial
FEROVIAL	Société nationale pour la construction de matériel et d'équipements ferroviaires
FERTIAL	Société des Fertilisants d'Algérie
GES	Gaz à Effet de Serre

GICA	Groupe industriel des Ciments d'Algérie
IMETAL	Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques
INRAA	Institut National de Recherche Agronomique d'Algérie
INRF	Institut National de Recherche Forestière
INSID	Institut National des Sols, de l'Irrigation et du Drainage
INSP	Institut National de Santé Publique
MADRP	Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche
MAECNEAA	Ministère des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines
MANAL	Groupe industriel minier Manadjim El Djazair
MC	Ministère de la Communication
MCPE	Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations
MDN	Ministère de la Défense Nationale
MECSUM	Ministère de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises
MEER	Ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables
MEN	Ministère de l'Education Nationale
MEQV	Ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie
MESRS	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MF	Ministère des Finances
MFEP	Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels
MH	Ministère de l'Hydraulique
MHM	Ministère des Hydrocarbures et des Mines
MHUVAT	Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire
MI	Ministère de l'Industrie
MICLT	Ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports
MPG	Modalities, Procedures and Guidelines
MRV	Measure, reporting, and verification
MS	Ministère de la Santé
MTA	Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
MTPIB	Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base
NAP	Plan National d'Adaptation
NC4	Quatrième communication nationale
NCE	Nature, Climat et Énergie
NIR	National Inventory Report
ONA	Office National de l'Assainissement
ONM	Office National de Météorologie
ONS	Office National des Statistiques
ONSC	Observatoire national de la Société Civile
PA	Paris Agreement
PFN	Point Focal National auprès de la CCNUCC
PIUP	Procédés Industriels et Utilisation des Produits
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
QA/QC	Quality Assurance/Quality Control
Saidal	Groupe pharmaceutique Saïdal
SCN	Seconde Communication Nationale
SNVI	Société nationale des véhicules industriels
SONATRACH	Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures

SONELGAZ	Société Nationale de l'électricité et du gaz
TCN	Troisième Communication Nationale
TdR	Termes de Référence
UGP	Unité de Gestion de Projet

Table des matières

A. Le Projet "Appui à l'élaboration du Premier Rapport Biennal de Transparence (BTR1) et de la Quatrième Communication Nationale combinée au Second Rapport Biennal de Transparence (NC4&BTR2) de l'Algérie auprès de la CCNUCC" 7

A.1. Contexte 7

A.2. Approche 8

A.3. Parties prenantes 8

A.4. Dispositif opérationnel 9

A.5. Gouvernance et gestion 9

B. Réalisations du projet : 11

B.1. Structures de gouvernance du projet 11

B.2. Principales activités réalisées 13

B.2.1- Recrutement des Experts techniques 13

B.2.2- Réalisation des activités techniques 14

B.2.2.1- Produit 1 : Circonstances nationales, arrangements institutionnels, contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques et de renforcement des capacités et autres informations pertinentes 14

B.2.2.2- Produit 2 : Inventaire de gaz à effet de serre 17

B.2.2.3- Produit 3 : Suivi de la mise en œuvre de la CDN et des action d'Atténuation des émissions de GES 24

B.2.2.4- Produit 4 : Analyse des impacts du changement climatique sur les secteurs prioritaires et des mesures d'adaptation 28

B.2.2.5- Produit 5 : Compilation du Premier Rapport biennal de Transparence, et du combinat Deuxième rapport biennal de transparence et de la quatrième communication nationale ; Suivi et Evaluation 31

B.2.3- Contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du projet 34

C. Principaux résultats réalisés par activités 34

C.1. Déroulement des activités 34

C.2. Indicateurs de résultats 35

D. Réalisations budgétaires 45

D.1. Evolution des dépenses budgétaires annuelles 45

D.2. Consommation Budgétaire de l'exercice 2025 46

E. Gestion des risques 47

Annexes 52

Annexe 1 : 53

A. Le Projet "Appui à l'élaboration du Premier Rapport Biennal de Transparence (BTR1) et de la Quatrième Communication Nationale combinée au Second Rapport Biennal de Transparence (NC4&BTR2) de l'Algérie auprès de la CCNUCC"

A.1. Contexte

L'Algérie a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1993, le Protocole de Kyoto en 2004 et l'Accord de Paris en 2016, reconnaissant ainsi l'importance de l'agenda du changement climatique et de l'engagement national subséquent. Elle s'est acquittée de ses obligations au titre de l'article 12 de la CCNUCC, en soumettant sa Communication Nationale Initiale (CNI) en 2001 ; sa Seconde Communication Nationale (SCN) en 2010 ; et sa Troisième Communication Nationale (TNC) en 2023. Le pays a également soumis son premier rapport biennal actualisé (BUR1) avec son Rapport national d'inventaire des GES (NIR).

Le PNUD a apporté son soutien à la réalisation de ces trois communications nationales sur les changements climatiques. Il s'est engagé à appuyer l'Algérie pour mener les activités nécessaires à l'établissement de son premier rapport biennal de transparence (BTR1) et de sa quatrième communication nationale combinée au deuxième rapport biennal de transparence (NC4&BTR2). Ce projet a également pour finalité de renforcer les capacités nationales afin de répondre aux exigences du cadre de transparence renforcé établie par l'Accord de paris (AP).

Le projet permettra :

- L'élaboration et l'actualisation de l'inventaire national des gaz à effet de serre (GES) pour la série temporelle 1990-2024 ;
- Analyser la vulnérabilité du territoire nationale et identifier des mesures d'adaptation aux changements climatiques des secteurs de l'Hydraulique, de l'Agriculture, des Forêts et de la Santé et d'intégrer l'action climatique au niveau local ;
- Suivre les progrès de la mise en œuvre de la CDN et Analyser les politiques et actions sectorielles d'atténuation pour réduire les émissions de GES par secteur (Energie, PIUP, AFAT et Déchets) ;
- Mettre à jour les informations sur les circonstances, les contraintes et les lacunes nationales, les besoins de financement, le transfert de technologie et le renforcement des capacités d'atténuation et d'adaptation.

Le projet s'appuie sur les travaux et les enseignements tirés des précédentes communications nationales, du premier rapport biennal actualisé et du premier rapport biennal de transparence (BTR1). Il tient compte des études réalisées dans tous les secteurs prioritaires, aux niveaux national et local, sur l'environnement, les ressources en eau, l'agriculture, la santé, l'énergie, l'industrie, les transports, l'habitat, l'économie et le développement, en relation avec les changements climatiques.
Le projet prône une approche participative impliquant toutes les parties prenantes ; c'est une opportunité pour promouvoir et faciliter l'intégration du changement climatique dans les stratégies sectorielles de développement. Il contribue au renforcement des capacités institutionnelles et techniques afin d'assurer la préparation régulière des rapports nationaux à la CCNUCC, conformément au cycle de 4 ans fixé par la COP pour les communications nationales (CN) et 2 ans pour les BTR.

A.2. Approche

Le projet s'appuie sur les travaux et les leçons tirées principalement de l'exercice d'élaboration de la troisième communication nationale et du premier rapport biennal (TCN&BUR1), ainsi que de l'élaboration du premier rapport biennal de transparence (BTR1). Toutefois, les études réalisées au niveau des secteurs concernés d'une part les actions d'atténuation et ceux confrontés à la problématique des changements climatiques, notamment ceux dont les mesures sont jugées prioritaires au regard des vulnérabilités de l'Algérie.

Le processus d'élaboration du deuxième rapport de transparence et de la quatrième communication nationale (NC4&BTR2) prône une approche participative, impliquant l'ensemble des parties prenantes (ministères et organismes sous-tutelle, collectivités locales, autorités locales, société civile, instituts de recherche, entreprises privées). Ceci vise à permettre l'intégration de la problématique des changements climatiques à tous les niveaux de l'action et de la prise de décision, pour ce qui a trait à la politique nationale de développement durable et de préservation de l'environnement. Ces acteurs participeront aux activités identifiées, par la fourniture de données et d'informations pour l'inventaire, l'élaboration du rapport sur les mesures d'adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques, ainsi que l'évaluation de l'impact des actions d'atténuation réalisées. Ils contribueront aussi, à permettre un suivi de la contribution prévue déterminée au niveau nationale.

L'approche est basée aussi sur la théorie du changement qui suppose que le soutien technique et financier fourni par le projet permettra à l'Algérie de préparer et de soumettre le rapport combiné BTR2/NC4. Il sera préparé d'une manière plus inclusive et sensible au genre et répondra aux exigences accrues de transparence ainsi qu'aux lignes directrices du GIEC pour le développement des inventaires de GES. En effet, les activités connexes prévues viseront à poursuivre les efforts de renforcement des capacités nationales dans des domaines qui nécessitent encore des améliorations tels que l'intégration du changement climatique dans les politiques et les stratégies de développement nationales et sectorielles, la coordination entre les parties prenantes impliquées dans la préparation de la TCN et du BUR1, le système national de mesure, de rapportage et de vérification (MRV), l'intégration du genre dans les politiques et stratégies d'atténuation et d'adaptation, l'identification des besoins technologiques dans certains secteurs et l'implication de la recherche et du développement. Elles permettront également d'accroître la transparence par une meilleure documentation des méthodologies utilisées et des annexes techniques, conformément aux exigences de l'Accord de Paris dans les MPGs.

A.3. Parties prenantes

Les principales parties prenantes au projet BTR1/NC4&BTR2, identifiées sont entre autres :

Ministères	MADRP ; MAECNEAA ; MDN ; MEQV ; MEER ; MHM ; MEQV ; MESRS ; MF ; MH ; MHUVAT ; MlCLT ; MI ; MECSUM ; MS ; MTPIB
Organismes sous tutelle	ADE ; AGIRE ; ALNAFT ; ANAM ; ANBT ; ANCC ; AND ; ANDRS ; ANRH ; APRUE ; ARH ; ASAL ; BNEDER ; CDER ; CERIST ; CNFE ; CNL ; CREAD ; CRSTRA ; DGF ; DGRM ; ENSEREDD ; ENSSMAL; INRAA ; INRF ; INSID ; INSP ; ONA ; ONEDD ; ONM ; ONS ; SONATRACH ; SONELGAZ
Comités et conseils nationaux	CNC ; CNESE ; CREG

Entreprises nationales et privées	Alphyt ; Amouda Ingeneering ; Asmidal ; Biskria Ciment ; El-Hadjar ; Condor ; DIVINDUS ; ELEC Groupe El-Djazaïr ; ENAVA ; FEROVIAL; Fertial; GICA; Groupe Saidal; IMETAL; Lafarge ; MANAL ; SNVI ; Tosyali
Organisations de la société civile et autres	ONSC ; Experts nationaux ; Chercheurs universitaires

A.4. Dispositif opérationnel

Quatre groupes sont créés pour se charger des travaux liés aux quatre thématiques essentielles du projet à savoir :

1. Groupe thématique : Circonstances nationales et autres informations pertinentes ;
2. Groupe thématique : Inventaire de gaz à effet de serre ;
3. Groupe thématique : Atténuation des GES et suivi de la CDN ;
4. Groupe thématique : Impacts des changements climatiques et mesures d'adaptation.

Chaque groupe est coordonné par un expert national avec l'appui d'un expert international. Il est composé des représentants des secteurs et institutions concernés (départements ministériels, agences, sociétés, administrations) des chercheurs, des universitaires, des spécialistes, des experts, et des représentants de la société civile. La composition du groupe prend en considération l'équilibre du genre (homme-femme).

Le groupe thématique s'organise pour contribuer à la réalisation des rapports de synthèse à la production de rapports qui alimenteront les rapports biennaux de transparence, la quatrième communication nationale et les rapports nationaux d'inventaire des GES.


Le groupe de travail est permanent avec un nombre limité ; mais, il peut faire appel à toute personne compétente pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs.

Chaque groupe de travail thématique sert aussi de trait d'union entre les institutions et le projet. Il assure notamment la collecte ainsi que le traitement et l'analyse des données et des informations en relation avec les activités du projet. De même, ses membres s'attachent à diffuser les résultats des travaux du projet dans leurs départements et institutions respectifs.

Ce dispositif est mis en place avec la participation active de tous les secteurs, assistés par des experts nationaux et internationaux afin d'assurer le renforcement des capacités des membres des groupes thématiques et de garantir la mise en œuvre du projet BTR1/NC4&BTR2. Il est aussi attendu à la fin du processus, un transfert de connaissances et de savoir-faire à tous et un échange d'expériences entre les différents groupes de travail. Les différentes structures verront leurs capacités renforcées par cet exercice et pourront capitaliser cette expérience pour assurer la pérennité du processus.

A.5. Gouvernance et gestion

Le projet est mis en œuvre selon la modalité nationale d'Exécution NIM du PNUD. Sa structure d'organisation est la suivante :

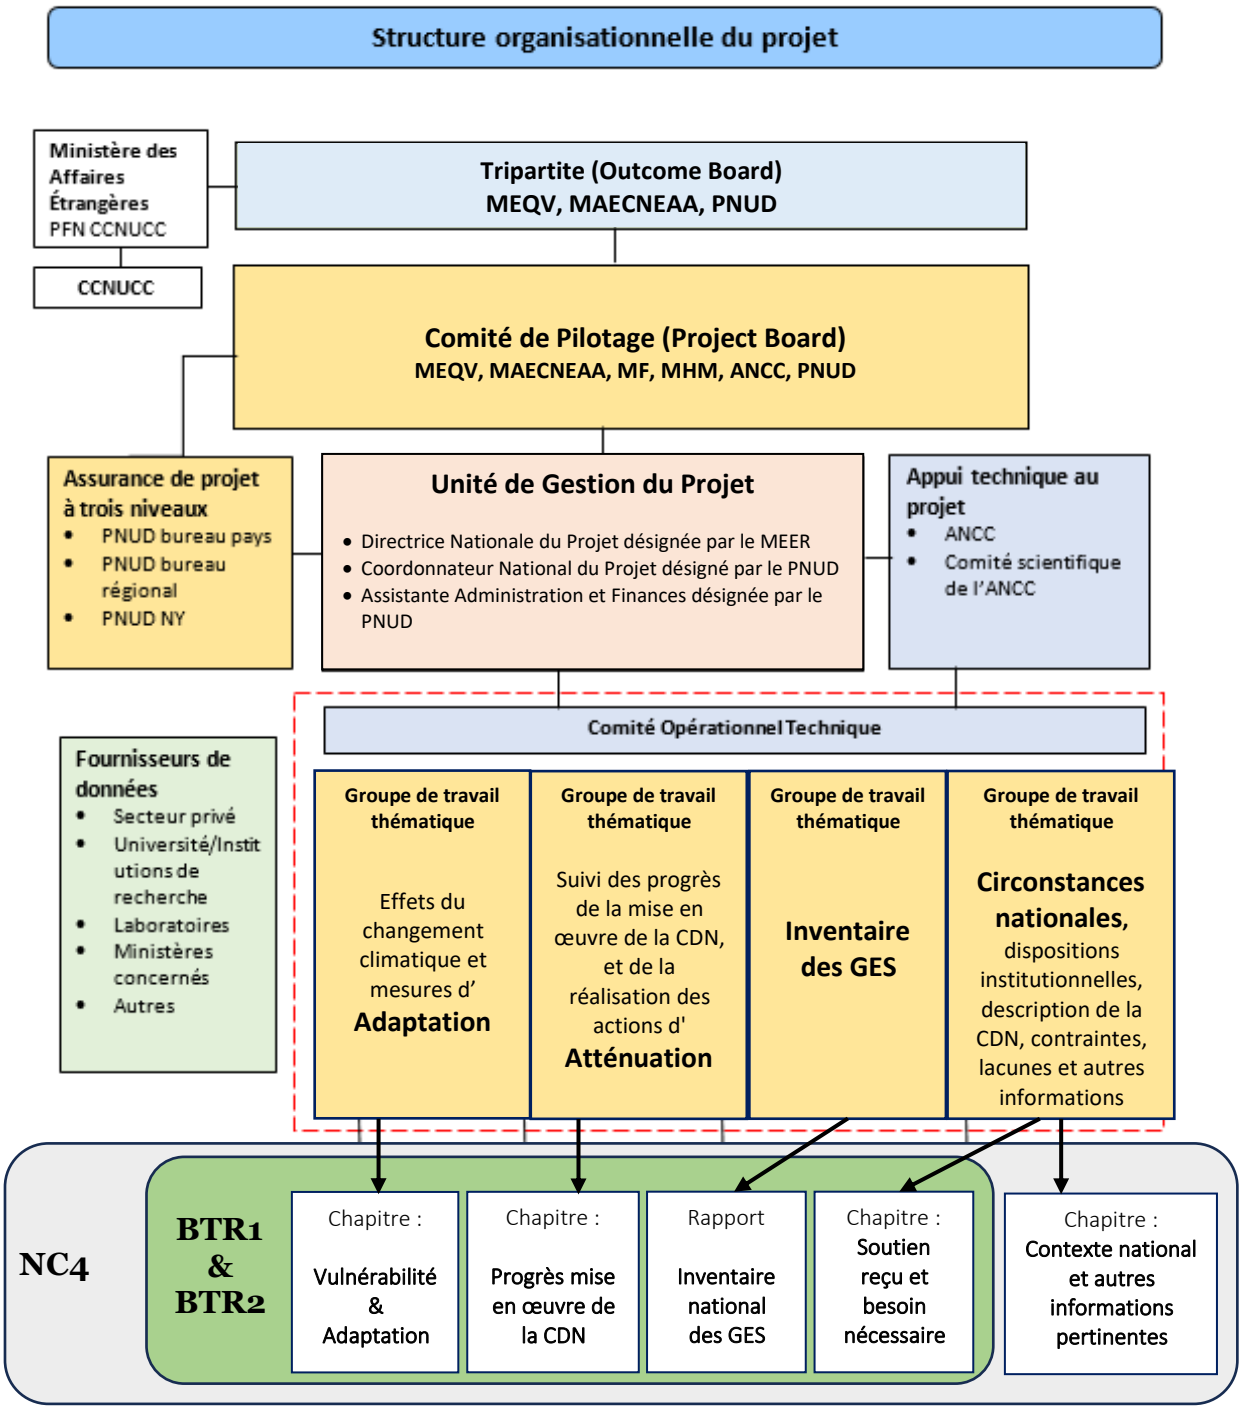

Tripartite (*Outcome Board*) : La réunion annuelle tripartite, coprésidée par un représentant du ministère des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaine (MAECNEAA) et la Représentante Résidente du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) ; à laquelle participera un représentant du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie (MEQV). Le point focal du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et le membre du Comité de pilotage (CoPil). Une tripartite sera organisée au moins une fois par an et selon les besoins, afin d'évaluer les résultats et l'impact du projet. Cette réunion permettra aux membres de suivre l'avancement du projet,

de s'accorder sur les mesures correctives à fournir et les orientations générales et stratégiques en alignant le projet avec les priorités nationales en vue d'accroître son efficacité et efficience.

Comité de Pilotage (*Project Board*) : est constitué par les représentants du MEQV, du MAECNEAA, du MF, du MHM, et du PNUD. Le CoPil assure la supervision, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet BTR1/NC4&BTR2. Il est responsable de l'orientation stratégique des activités du projet, et prend des décisions relatives à la mise en œuvre du projet. Il est responsable de la validation des plans annuels de travail, du budget, des termes de références des consultants, des résultats des études sectorielles. Il évalue et valide les livrables intermédiaires et les livrables finaux ($NIR_{1\&2}$, $BTR_{1\&2}$, NC4).

Le CoPil doit également i/ assurer la coordination avec les agences gouvernementales concernées ; ii/ diriger le processus de mise en œuvre du programme et synchroniser le projet avec les processus et les politiques de planification nationaux et locaux ; iii/ suivre le travail effectué par les unités d'exécution, suivre les progrès réalisés ; et iv/ contrôler l'efficacité de l'exécution du projet.

Unité de gestion du projet (UGP) : La gestion administrative du projet est assurée par l'UGP comprenant la Directrice nationale du projet (DNP) désignée par le MEQV, le Coordonnateur national du projet et l'Assistante Administration et Finances, ces deux derniers sont recrutés par le PNUD. L'UGP est responsable de la coordination générale et la mise en œuvre du projet. Les principales responsabilités incluent notamment la coordination nationale et locale avec toutes les parties prenantes, la gestion financière, le suivi, la communication, la gestion des connaissances, la sélection et la supervision des consultants et des organismes et sociétés nationaux de mise en œuvre, et des prestataires de services.

Comité Opérationnel et Technique (COT) : est composé des membres de l'UGP, les points focaux sectoriels coordonnateurs des groupes thématiques ; et du directeur général de l'ANCC. Ce comité assure la coordination, la communication et l'échange entre les différents groupes de travail et le suivi de la réalisation des activités du projet.

B. Réalisations du projet :

B.1. Structures de gouvernance du projet

- ***Tripartite***. Cet organe de supervision du projet, composé des représentants du MAECNEAA, du MEQV et du PNUD, ne s'est par réuni en 2025. Les parties prenantes ont désigné leurs représentants, il s'agit de
-

Nom et prénom	Fonction	Structure
M Karim BABA	Secrétaire Général	MEQV
Mme Manel El-AYOUBI	Directrice de l'Environnement et du Développement Durable	MAECNEAA
Mme Natacha van RIJN	Représentante Résidente	PNUD

Comité de Pilotage.

Les départements ministériels parties prenantes du projet et le PNUD, ont désigné leurs représentants au sein du CoPil, il s'agit de :

Nom et prénom	Fonction	Structure
M Karim BABA	Secrétaire Général	MEQV
Mme Natacha van RIJN	Représentante Résidente	PNUD
Mme Manal El-AYOUBI	Directrice de l'Environnement et du Développement Durable	MAECNEAA
Mme Nora ZOUAOUI BENDIMERAD	Directrice d'études	MHM
Mme Fadela AIT OUARES	Cheffe du bureau Développement durable	MF
M. Khalid BELABDI	Directeur général	ANCC

- Une première réunion du Copil s'est tenue le 26 mai 2024 au MEER, où il a été exposée et validée la planification opérationnelle et budgétaire des activités du projet pour l'exercice 2024.
- Une deuxième réunion du Copil s'est tenue le 18 mars 2025 au MEQV, où il a été exposée et validée la planification opérationnelle et budgétaire des activités du projet pour l'exercice 2025.
- Une troisième réunion du Copil s'est tenue le 13 janvier 2026 au MEQV, où il a été exposée et validée la planification opérationnelle et budgétaire des activités du projet pour l'exercice 2026.
-

- *Unité de Gestion de Projet (UGP)*.

Le personnel qui compose l'UGP inclut la Directrice Nationale du Projet (DNP), l'Assistante Administration et Finances ; et le Coordonnateur National du Projet.
Le local attribué à l'UGP se situe au sein de l'Agence nationale des changements climatiques (ANCC), sous tutelle du MEQV.

- *Comité Opérationnel et Technique*.

Les départements ministériels parties prenantes du projet, ont désigné leurs représentants au sein du COT. Ces derniers assistent aux ateliers thématiques, suivent les activités du projet ; et jouent le rôle de points focaux au niveau des différents départements ministériels.

B.2. Principales activités réalisées

B.2.1- Recrutement des Experts techniques

Après élaboration et finalisation des termes de référence, des appels à candidature ont été lancés, à partir du 31 janvier 2024, pour le recrutement de :

- EI01 : Expert Senior International en Analyse du contexte national par rapport aux changements climatiques (arrangements institutionnels, contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques l'évaluation des besoins de financements, de transfert de technologie et de renforcement de capacités)
- EI02 : Expert Senior International en Système d'inventaire de gaz à effet de serre (GES)
- EI03 : Expert Senior International en Atténuation des GES et suivi de la mise en œuvre de la CDN
- EI04 : Expert Senior International en Impacts des changements climatiques et mesures d'Adaptation
- EIR : Expert Senior International chargé de la rédaction du premier rapport biennal de transparence et de la Quatrième communication nationale combinée au deuxième rapport biennal de transparence sur les changements climatiques de l'Algérie auprès de la CCNUCC
- EIG : Expert Senior International chargé de l'intégration de la dimension Genre dans le projet
- EN1 : Expert national en Analyse du contexte national par rapport aux changements climatiques (arrangements institutionnels, contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques l'évaluation des besoins de financements, de transfert de technologie et de renforcement de capacités)
- EN02-1 : Expert national en Système d'inventaire de gaz à effet de serre (GES)
- EN02-2 : Expert national en Formations au système d'inventaire de gaz à effet de serre (GES)
- EN02-3 : Expert national en Rédaction de l'inventaire de gaz à effet de serre (GES)
- EN03 : Expert national Atténuation des GES et suivi de la mise en œuvre de la CDN
- EN04 : Expert national en Impacts des changements climatiques et mesures d'Adaptation
- ENR : Expert national chargé de la rédaction du premier rapport biennal de transparence et de la Quatrième communication nationale combinée au deuxième rapport biennal de transparence sur les changements climatiques de l'Algérie auprès de la CCNUCC

- Les candidatures suivantes ont été les plus pertinentes et donc retenues :

Code	Experts internationaux retenus	Code	Experts nationaux retenus
EI01	David MARADAN	EN01	Abdelhak TRACHE
EI02	Traute KOTHER	EN02-1	Hamza MERABET
EI03	Smail KHENNAS	EN02-2	Ménouèr BOUGHEDAOUI
EI04	Julie LOUVEL	EN02-3	
EIR	Smail KHENNAS	EN03	Hamza MERABET
EIG	Emna SOHLOBJI	EN04	Mahi TABET AOUL
		ENR	Abdelhak TRACHE

B.2.2- Réalisation des activités techniques

La méthode de travail adoptée pour réaliser les activités du projet, dans les quatre thématiques, consiste en l'organisation d'ateliers techniques thématiques pour présenter, discuter et adopter un plan d'actions par Groupes de travail thématiques (GTT) et par sous-groupes selon les sous-thématiques.

Pour faciliter la collecte de données et informations utiles, des canevas ont été développés et validés en séances plénières par les quatre GTT selon la spécificité de chaque thématique.

Au besoin, des réunions restreintes avec la *task-force* de chaque secteur sont privilégiées pour compléter les données fournies, demander les informations manquantes et discuter et préciser la qualité des chiffres communiqués.

B.2.2.1- Produit 1 : Circonstances nationales, arrangements institutionnels, contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques et de renforcement des capacités et autres informations pertinentes

i/ Organisation des ateliers techniques et de renforcement de capacités

- Un atelier a été organisé le 30 juillet 2024 pour le lancement des activités Circonstances nationales

L'atelier avait pour but de lancer les activités de la thématique "Circonstances nationale". Ainsi, des cadres ciblés des différents secteurs ont été conviés pour se charger des travaux liés à la thématique : évaluation des besoins en termes de financements, de transfert de technologie et de renforcement des capacités.

Sujet : Rappel des objectifs et du contenu du rapport "Circonstances Nationales"
Lieu: Hotel LEGACY Ben Aknoun Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Smain Khennas (EI03) et Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Hamza Merabet (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs prioritaires et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 21 octobre 2024 pour la présentation du 1er draft du rapport thématique Circonstances nationales pour le BTR1

L'atelier avait pour but de présenter le chapitre 5 du BTR1 relatif aux informations sur le soutien financier, le soutien au développement et au transfert de technologies, le soutien au renforcement des capacités, nécessaires et reçus par l'Algérie, rédigé à partir des informations collectées issues des différents secteurs.

Sujet : Amender et compléter les informations des Chapitres 3 et 5 décrivant les circonstances nationales pertinentes pour comprendre les engagements de l'Algérie ; et les appuis nécessaires et reçus en matière de soutien financier, de soutien au développement et au transfert de technologies, et de soutien au renforcement des capacités.

Lieu: Hotel New Day ; Hussein Dey, Alger

Mode de communication : Présentiel et visioconférence

Organisateur : MEER et PNUD Algérie

Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Smain Khennas (EI03), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Hamza Merabet (EN02_1)

Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)

Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 02 décembre 2024 pour la présentation du rapport thématique Circonstances nationales pour le BTR1

L'atelier avait pour but de présenter le chapitre 5 du BTR1 relatif aux informations sur le soutien financier, le soutien au développement et au transfert de technologies, le soutien au renforcement des capacités, nécessaires et reçus par l'Algérie, complété à partir des informations supplémentaires collectées et fournies par les différents secteurs.

Sujet : Amender et compléter les informations des Chapitres 3 et 5 décrivant les circonstances nationales pertinentes pour comprendre les engagements de l'Algérie ; et les appuis nécessaires et reçus en matière de soutien financier, de soutien au développement et au transfert de technologies, et de soutien au renforcement des capacités.

Lieu: Hotel Bali Building/LEGACY LUXURY HOTEL, Ben Aknoun, Alger

Mode de communication : Présentiel et visioconférence

Organisateur : MEQV et PNUD Algérie

Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Smain Khennas (EI03) ; Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Hamza Merabet (EN02_1)

Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)

Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 28 avril 2025 pour la présentation de la feuille de route des activités Circonstances nationales

L'atelier avait pour but d'expliciter et emporter l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes du projet. Il offre l'opportunité de tirer les leçons du processus d'élaboration du rapport thématique "Circonstances nationales" pour le BTR1. Il s'agit en particulier de discuter des formes d'organisation qui permettront de dépasser les carences observées et d'atteindre les objectifs assignés dans les délais.

Sujet : Présentation des difficultés et des barrières durant le processus d'élaboration du rapport thématique & Planification des activités : Organisation des travaux et échéancier

Lieu : Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger

Mode de communication : Présentiel et visioconférence

Organisateur : MEQV et PNUD Algérie

Animation : David Maradan (EI01) / Abdelhak Trache (EN01)

Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)

Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 1er et 2 février 2026 pour la préparation des travaux dédiés à la thématique Circonstances nationales

L'atelier avait pour but de poser les bases méthodologiques, institutionnelles et opérationnelles de la préparation intégrée de la thématique Circonstances nationales dans le BTR2 et la CN4. Cet atelier visait à garantir une approche harmonisée et participative.

Sujet : Assurer une planification concertée et coordonnée des activités de la thématique et son inclusion dans le BTR2 et la CN4 en définissant les méthodologies, les rôles institutionnels et un calendrier réaliste de mise en œuvre.
Lieu : Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : David Maradan (EI01) / Abdelhak Trache (EN01)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC


ii/ Traitement des données collectées et production des livrables et du rapport thématique

Les données sont traitées par les experts (national et international) au fur et mesure de leur réception de la part des structures concernées.
Des ateliers et rencontres réalisés les experts ont produit :
EI01 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport Circonstances nationales pour le BTR1
EN01 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport Circonstances nationales pour le BTR1
EIG : Deux (02) livrables intermédiaires

iii/ Situation budgétaire

L'évolution de consommation budgétaire de la thématique 01 du projet : Circonstances nationales, se présente comme suit :

Code	Désignation	Année 2024	Année 2025	Année 2026
71200	Expert International	22 782,17	29 466,66	
71300	Expert National	21 014,73	16 245,08	
71600	Voyages			
74200	Frais Audio Visual & Impression			
75700	Formations, Ateliers et Conférences			9 236,54
76100	Pertes de changes	-27.69		
	Total	**43 769.21**	**45 711,74**	**9 236,54**

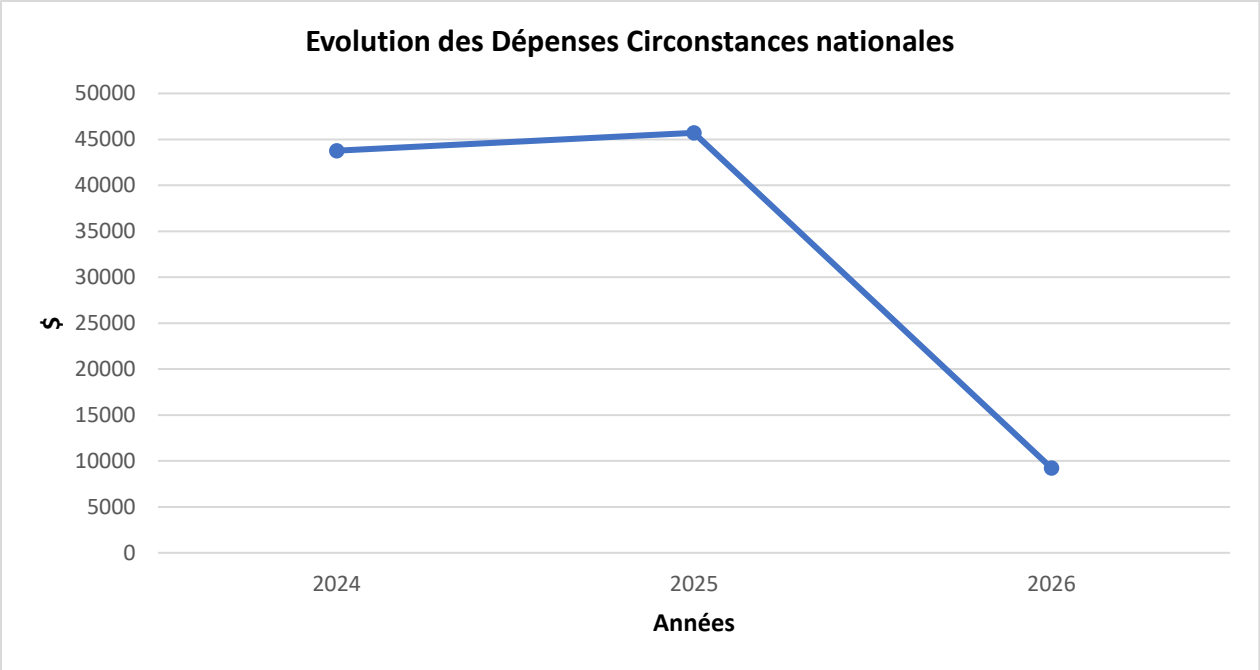

B.2.2.2- Produit 2 : Inventaire de gaz à effet de serre

i/ Organisation des ateliers techniques et de renforcement de capacités

- Un atelier a été organisé du 14 au 18 avril 2024 pour la préparation des activités "Inventaire GES"

L'atelier avait pour but de préparer les secteurs aux impératifs de collecte des informations sectorielles pour pouvoir établir l'Inventaire national des GES. Ainsi, les cadres des différents secteurs ont été conviés pour initier la constitution du groupe chargé des travaux liés à la thématique : Système d'inventaire de gaz à effet de serre (GES).

d'inventaire de gaz à effet de serre (GES).

- Réunion du 14 mai 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur AFAT

Sujet : Présentation des données à collecter
Lieu : Siège du Ministère de l'agriculture et du développement rural (MADR)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MADR, ANCC, DCC

- Réunion du 19 mai 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur Energie

Sujet : Présentation des données à collecter
Lieu : Siège du Ministère de l'Energie et des Mines
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Hamza Merabet Expert national (EN02_1) & Ménouèr Boughedaoui (EN02_3)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEM, Sonatrach, Sonelgaz, CREG, ARH, ALNAFT, APRUE, ANCC, DCC

- Réunion du 22 mai 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur FAT

Sujet : Présentation des données à collecter
Lieu : Siège de la Direction Générale des Forêts (DGF)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Hamza Merabet Expert national (EN02_1) & Traute S. Köther (EI02)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de la DGF, ANCC, DCC

- Réunion du 28 mai 2024 pour la présentation des données collectées pour le secteur Energie

Sujet : Bilan des données à collectées
Lieu : Siège du Ministère de l'Energie et des Mines
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1) / Ménouèr Boughedaoui (EN02_3)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEM, Sonatrach, Sonelgaz, CREG, ARH, ALNAFT, APRUE, ANCC, DCC

- Réunion du 01 juillet 2024 pour le secteur Energie

Sujet : Etat des données transmise par Sonelgaz
Lieu : Siège du Ministère de l'Energie et des Mines
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1) / Ménouèr Boughedaoui (EN02_3)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEM, Sonelgaz, CREG, ARH, ALNAFT, APRUE, ANCC, DCC

- Réunion du 17 juillet 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur AFAT

Sujet : Présentation des données à collecter
Lieu : Siège du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables

Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres du MADR, MDN, DGF, ASAL, ANCC, DCC

- Réunion du 18 juillet 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur Déchets

Sujet : Présentation des données à collecter
Lieu : Siège du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres du MEER, Sonatrach, Sonelgaz, CREG, ARH, AND, ANCC, DCC

- Réunion du 23 juillet 2024 pour la présentation de l'état des données collectées pour le secteur Energie

Sujet : Bilan des données à collectées
Lieu : Siège du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1) / Ménouèr Boughedaoui (EN02_3)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEM, Sonatrach, Sonelgaz, CREG, ARH, ALNAFT, APRUE, ANCC, DCC

- Réunion du 24 juillet 2024 pour la présentation des données à collecter pour le secteur Déchets

Sujet : Présentation des données à collecter Déchets liquides
Lieu : Siège du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres du MH, ANRH, SEAAL, AGIRE, MEER, ANCC

- Atelier du 06 et 07 aout 2024 pour le renforcement des capacités du secteur Energie

Sujet : Formation au CQ/AQ de l'inventaire des GES
Lieu : Hotel LEGACY, Ben Aknoun, Alger

Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Ménouèr Boughedaoui (EN02_2)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEM, Sonatrach, Sonelgaz, CREG, ARH, ALNAFT, APRUE, NAFTAL, ANCC, DCC

- Atelier du 13 aout 2024 pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation du canevas de la collecte de données
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement des énergies renouvelables
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de GICA, IMETAL, HOLCIM, MIPP, MEM, Sonatrach, AQS, SIDER Groupe, ACS, MEER, ANCC.

- Atelier du 21 aout 2024 pour le secteur Transports

Sujet : Présentation du canevas de la collecte de données Transport aérien
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement des énergies renouvelables
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de Tassili Airlines ; Air Algérie, MT, ENNA, NAFTAL, MEER, ANCC.

- Atelier du 28 aout 2024 pour le secteur Agriculture

Sujet : Présentation du canevas de la collecte de données Agriculture
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement des énergies renouvelables
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de Tassili Airlines ; Air Algérie, MT, ENNA, NAFTAL, MEER, ANCC.

- Atelier du 02 septembre 2024 pour le secteur Energie

Sujet : Présentation des 1er résultats d'analyses
Lieu : Siège du ministère de l'Energie et des Mines

Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP)
Participants : Cadres de Sonelgaz, Sonatrach, APRUE, CREG, ARH, ALNAFT, MEM, MEER, ANCC.

- Atelier du 03 septembre 2024 pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation du canevas de collecte de données pour Tosyali
Lieu : Siège de l'ANCC
Mode de communication : Visio conférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Chérif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de Tosyali, ANCC.

- Réunion du 03 novembre 2024 pour la Coordination de la rédaction du document national d'inventaire des GES

Sujet : Coordination des activités de rédaction du DNI
Lieu : Siège de l'Agence nationale des changements climatiques
Mode de communication : Présentiel & Visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)/ Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Ingénieurs de l'ANCC, DCC

- Réunion du 10 novembre 2024 pour la Coordination de la rédaction du document national d'inventaire des GES

Sujet : Coordination des activités de rédaction du DNI
Lieu : Siège de l'Agence nationale des changements climatiques
Mode de communication : Présentiel & Visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1) / Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Ingénieurs de l'ANCC, DCC

- Réunion du 12 mai 2025 pour la présentation du canevas de données à collecter pour le secteur Energie

Sujet : Présentation des données à collecter

Lieu : Siège du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MEMER, Sonelgaz, APRUE, CREG, ALNAFT, ARH, ANCC, DCC

- Réunion du 14 mai 2025 pour la présentation des canevas de données à collecter pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation des données à collecter Industrie Fer & Acier
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MI, AQS, SIDER El-Hadjar, ANCC, DCC

- Réunion du 21 mai 2025 pour la présentation des canevas de données à collecter pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation des données à collecter Ciments
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres de LAFARGE, MI, ANCC, DCC

- Réunion du 22 mai 2025 pour la présentation des canevas de données à collecter pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation des données à collecter Ciments
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Traute S. Köther (EI02) / Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres de GICA, MI, ANCC, DCC

- Réunion du 11 & 12 novembre 2025 pour la présentation des canevas de données à collecter pour le secteur PIUP

Sujet : Présentation des données à collecter Sidérurgie

Lieu : Algerian Quatari Steel
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres de AQS, ANCC

- Réunion du 19 février 2026 pour la présentation des canevas de données à collecter pour le secteur Agriculture

Sujet : Présentation des données à collecter Effectifs des élevages ; Affectations des terres
Lieu : Siège du ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres du MADRP, ANCC

- Atelier du 30 et 31 mars 2026 pour la formation de formation au contrôle qualité et à l'assurance qualité (CQ/AQ) de l'inventaire national des émissions de GES du secteur Industriel (PIUP)

Sujet : Présentation des principes du CQ/AQ pour le secteur Ciment
Lieu : Hôtel "ATLANTIS", Bouzareah
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Ménouèr Boughedaoui Expert national (EN02_2) ; Hamza Merabet Expert national (EN02_1)
Modérateur : Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres membres de Amouda Ciment ; Groupe Holcim, MHM, MI, ANCC

ii/ Traitement des données collectées et production des livrables et du rapport thématique


Les données sont traitées par les experts (nationaux et internationale) au fur et mesure de leur réception de la part des structures concernées.

Des ateliers et rencontres réalisés les experts ont produit :
EI02 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport National d'Inventaire des GES (1990-2022)
EN01 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport National d'Inventaire des GES (1990-2022)
EN02 : Deux (02) livrables intermédiaires
EN03 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport National d'Inventaire des GES (1990-2022)

iii/ Situation budgétaire

L'évolution de consommation budgétaire de la thématique 1 du projet : Inventaire GES et MRV, se présente comme suit :

Code	Désignation	Année 2024	Année 2025	Année 2026
71200	Experte Internationale	35 046,00	30 521,00	
71300	Experts Nationaux	50 838,62	46 319,93	
71600	Voyages		546,78	
74200	Frais Audio Visual & Impression	6 217,23	6 435,15	
75700	Formations, Ateliers et Conférences	21 134,28	19 918,92	1 991,37
76100	Pertes de changes	-74,26	291,73	
	Total	**113 161,87**	**104 033,51**	**1 991,37**

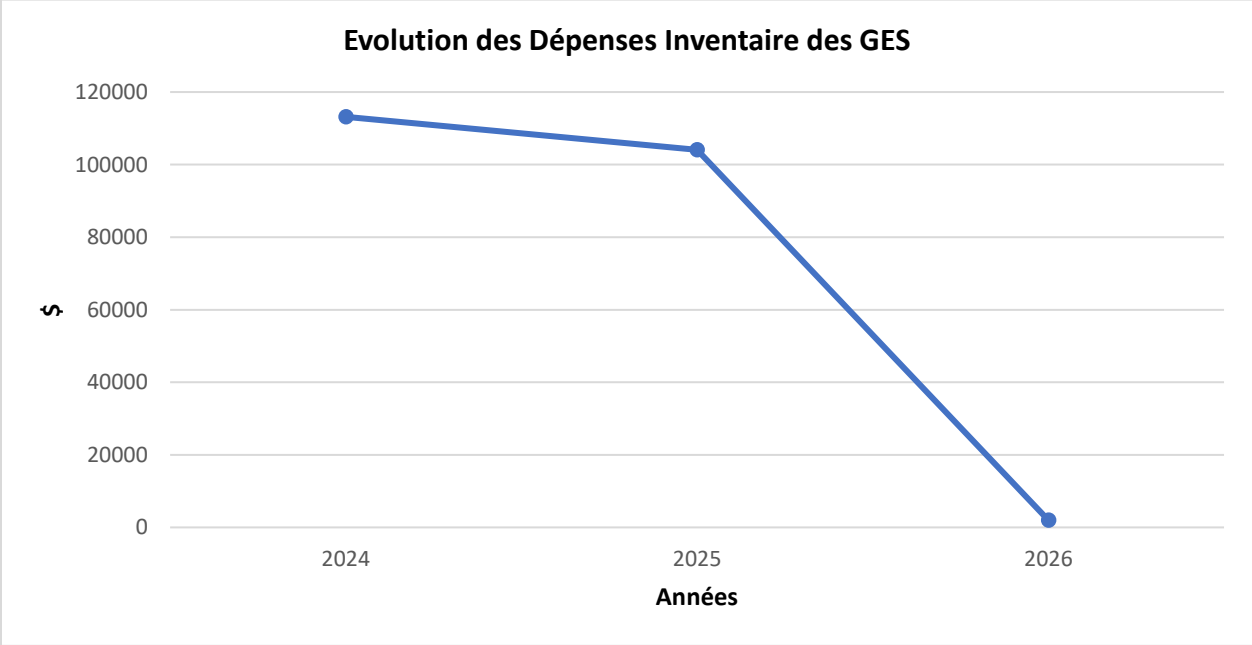

B.2.2.3- Produit 3 : Suivi de la mise en œuvre de la CDN et des action d'Atténuation des émissions de GES

i/ Organisation des ateliers techniques et de renforcement de capacités

- Un atelier a été organisé le 31 juillet 2024 pour lancer les activités de la thématique

L'atelier avait pour but de lancer la thématique "Suivi de la mise en œuvre de la CDN et des action d'Atténuation des émission de GES". Ainsi, des cadres ciblés des différents secteurs ont été conviés pour contribuer à la réalisation du chapitre progrès de la CDN et actions d'atténuation des GES dans le BTR1.

Sujet : Identification des secteurs et Plan d'actions

Lieu : Hotel LEGACY, Ben Aknoun, Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03), Abdelhak Trache (EN01), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) et David Maradan (EI01)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : ensemble des secteurs membres du CNC et OST.

- Un atelier a été organisé le 22 octobre 2024 pour la présentation du 1er draft du rapport Suivi des progrès de la CDN et actions d'atténuation des GES

L'atelier avait pour but de présenter le chapitre 3 du BTR1 relatif aux suivi des progrès de la mise en œuvre et de la réalisation de la CDN, rédigé à partir des informations collectées issues des différents secteurs.

Sujet : Amender et compléter les informations du chapitre 3 décrivant les progrès de la mise en œuvre et de la réalisation de la CDN et du Plan National Climat (PNC) ; et les hypothèses et les projections des émissions et absorptions de GES à l'horizon 2040
Lieu : Hotel New Day ; Hussein Dey, Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 28 avril 2025 pour la présentation de la feuille de route des activités Suivi des progrès de la CDN et actions d'atténuation des GES

L'atelier avait pour but d'expliciter et emporter l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes du projet. Il offre l'opportunité de tirer les leçons du processus d'élaboration du rapport thématique "Suivi des progrès de la CDN et actions d'atténuation des GES" pour le BTR1. Il s'agit en particulier de discuter des formes d'organisation qui permettront de dépasser les carences observées et d'atteindre les objectifs assignés dans les délais.

Sujet : Présentation des difficultés et des barrières durant le processus d'élaboration du rapport thématique & Planification des activités : Organisation des travaux et échéancier
Lieu : Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 07 avril 2026 sur les politiques, mesures et actions (PMA) du secteur de l'électricité dans le cadre du BTR2

L'atelier avait pour but de renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'électricité impliqués dans l'inventaire des politiques, mesures et actions (PMA) et leur impact sur la réduction des émissions de GES.

Sujet : Identifier les politiques, mesures et actions (PMA) du secteur de l'électricité et développer avec les secteurs une méthodologie pratique de calcul des émissions évitées pour le reporting du BTR2.
Lieu : Hôtel ATLANTIS, Bouzareah, Alger
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03) ; Hamza Merabet Expert national (EN03)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de l'ANCC ; MEER ; Sonelgaz ; CREG ; MEQV

- Un atelier a été organisé le 09 avril 2026 sur les politiques, mesures et actions (PMA) d'Atténuation des émissions de GES du secteur des Forêts

L'atelier avait pour but de renforcer les capacités des acteurs du secteur des Forêts impliqués dans l'inventaire des politiques, mesures et actions (PMA) et leur impact sur la réduction des émissions de GES.

Sujet : Identifier les politiques, mesures et actions (PMA) du secteur forestier et développer avec le secteur une méthodologie pratique de calcul des émissions évitées pour le reporting du BTR2.
Lieu : Hôtel ATLANTIS, Bouzareah, Alger
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03) ; Hamza Merabet Expert national (EN03)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de l'ANCC ; DGF

- Un atelier a été organisé le 19 avril 2026 sur les politiques, mesures et actions (PMA) d'Atténuation des émissions de GES du secteur des Ciments

L'atelier avait pour but de renforcer les capacités des acteurs du secteur des ciments impliqués dans l'inventaire des politiques, mesures et actions (PMA) et leur impact sur la réduction des émissions de GES.

Sujet : Identifier les politiques, mesures et actions (PMA) du secteur cimentier et développer avec le secteur une méthodologie pratique de calcul des émissions évitées pour le reporting du BTR2.
Lieu : Hôtel ATLANTIS, Bouzareah, Alger
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03) ; Hamza Merabet Expert national (EN03)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de l'ANCC ; Groupe Holcim

- Un atelier a été organisé le 20 avril 2026 sur les politiques, mesures et actions (PMA) d'Atténuation des émissions de GES du secteur des Ciments

L'atelier avait pour but de renforcer les capacités des acteurs du secteur des ciments impliqués dans l'inventaire des politiques, mesures et actions (PMA) et leur impact sur la réduction des émissions de GES.

Sujet : Identifier les politiques, mesures et actions (PMA) du secteur cimentier et développer avec le secteur une méthodologie pratique de calcul des émissions évitées pour le reporting du BTR2.
Lieu : Hôtel ATLANTIS, Bouzareah, Alger
Mode de communication : Présentiel
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smain Khennas (EI03) ; Hamza Merabet Expert national (EN03)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : Cadres de l'ANCC ; Groupe GICA

ii/ Traitement des données collectées et production des livrables et du rapport thématique


Les données sont traitées par l'expert national au fur et mesure de leur réception de la part des structures concernées.

Des ateliers et rencontres réalisés les experts ont produit :
EI03 : Deux (02) livrables intermédiaires
Le Rapport thématique Suivi des progrès de la CDN et actions d'atténuation des GES
EN03 : Un (01) livrable intermédiaire

iii/ Situation budgétaire

L'évolution de consommation budgétaire de la thématique 2 du projet : Atténuation des GES et MRV, se présente comme suit :

Code	Désignation	Année 2024	Année 2025	Année 2026
71200	Expert International	28 758,94	9 000,00	
71300	Expert National		9 730,32	
71600	Voyages			
74200	Frais Audio Visual & Impression			
75700	Formations, Ateliers et Conférences			5 288,88
76100	Pertes de changes		60,82	
	Total	**28 758,94**	**18 791,14**	**5 288,88**

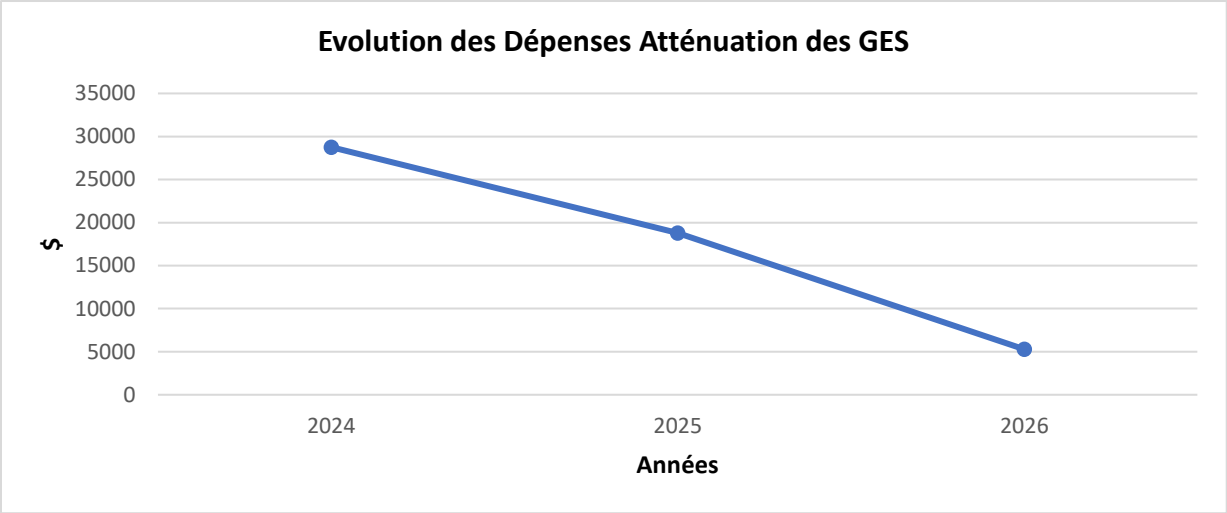

B.2.2.4- Produit 4 : Analyse des impacts du changement climatique sur les secteurs prioritaires et des mesures d'adaptation

i/ Organisation des ateliers techniques et de renforcement de capacités

- Atelier du 02 juillet 2024 pour l'élaboration du plan d'actions

Sujet : Elaboration du plan d'actions
Lieu : Siège du Ministère de l'environnement et des énergies renouvelables
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Mahi Tabet Aoul (EN04) & Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs prioritaires et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 23 octobre 2024 pour la présentation du contenu du rapport Vulnérabilité et mesures d'adaptation entreprises par les secteurs prioritaires face aux impacts des CC

L'atelier avait pour but de présenter le chapitre 4 du BTR1 relatif aux vulnérabilités et mesures d'adaptation entreprises par les secteurs prioritaires face aux impacts des changements climatiques.

Sujet : Amender et compléter les informations du chapitre 4/ décrivant les vulnérabilités et mesures d'adaptation entreprises par les secteurs prioritaires face aux impacts des CC
Lieu : Hotel New Day ; Hussein Dey, Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Mahi Tabet Aoul (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 29 avril 2025 pour le lancement des activités Vulnérabilité et Adaptation pour l'élaboration du BTR2&NC4

L'atelier avait pour but d'expliciter et emporter l'adhésion des secteurs prioritaires (Eau, Santé, Forêts, Agriculture) parties prenantes du projet. Il offre l'opportunité de tirer les leçons du processus d'élaboration du rapport thématique "Vulnérabilité et Adaptation" pour le BTR1. Il s'agit en particulier de discuter des formes d'organisation qui permettront de dépasser les carences observées et d'atteindre les objectifs assignés dans les délais.

Sujet : Retour sur les leçons apprises des processus précédents pour les secteurs prioritaires de l'adaptation/ Présentation des exigences d'informations et des contributions attendues des secteurs/ Cadrage stratégique des secteurs : Canevas à renseigner et thématiques proposées.
Lieu: Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Mahi Tabet Aoul (EN04) et Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 15 et 16 février pour le Cadrage stratégique du volet Vulnérabilité & Adaptation

L'atelier de Cadrage stratégique du volet Vulnérabilité & Adaptation est organisée afin d'entamer l'évaluation des activités actuelles engagées par les secteurs prioritaires en matière de lutte contre les effets adverses des changements climatiques, principalement en ce qui concerne l'Irrigation et la Santé animale et végétale et adaptation au CC (Agriculture), Gestion de l'eau et risque d'inondation (Hydraulique), Désertification et relance du barrage vert, Forêts et richesses forestières (Forêts), Santé humaine et adaptation au CC (Santé).

Sujet : Evaluer les activités actuelles en matière de lutte contre les CC ; Examiner les processus actuels de prévention des risques climatiques ; tirer les leçons à travers l'historique des activités sectorielles ; Renforcer les capacités institutionnelles et techniques en matière de vulnérabilité et d'adaptation aux CC ; Proposer des recommandations pour améliorer la préparation des prochains rapports.
Lieu: Hôtel M Suite, Dar-El-Beïda, Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Mahi Tabet Aoul (EN04) et Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

ii/ Traitement des données collectées et production des livrables et du rapport thématique

Les données sont traitées par les experts (national et international) au fur et mesure de leur réception de la part des structures concernées.

Des ateliers et rencontres réalisés les experts ont produit :

EI04 : Un (01) livrable intermédiaire

Le Rapport thématique Vulnérabilité et Adaptation des secteurs prioritaires pour le BTR1


EN04 : Un (01) livrable intermédiaire

Le Rapport Vulnérabilité et Adaptation des secteurs prioritaires pour le BTR1

iii/ Situation budgétaire

L'évolution de consommation budgétaire de la thématique 3 du projet : Vulnérabilité et Adaptation, se présente comme suit :

Code	Désignation	Année 2024	Année 2025	Année 2026
71200	Experte Internationale	3 150,00	12 600,00	
71300	Experts Nationaux	21 039,87	21 525,56	
71600	Voyages		0,00	
74200	Frais Audio Visual & Impression		0,00	1 340.00
75700	Formations, Ateliers et Conférences	14 830,25	10 653,09	6 939,52
76100	Pertes de changes	-34,43	40,17	-135,11
	Total	**38 985,69**	**44 818,82**	**8 144,41**

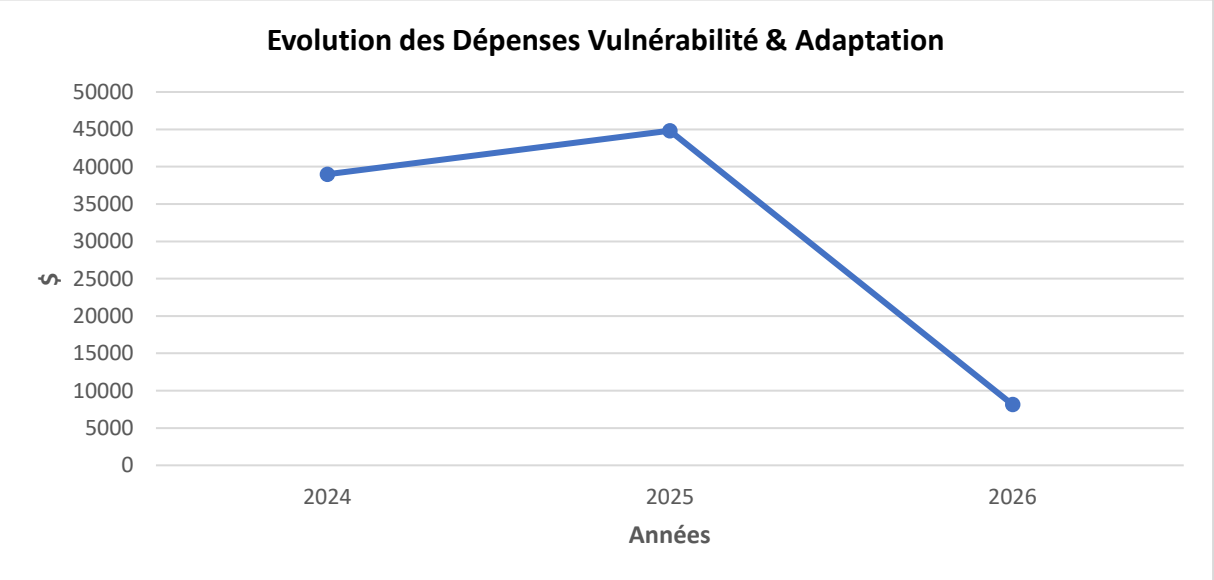

B.2.2.5- Produit 5 : Compilation du Premier Rapport biennal de Transparence, et du combinat Deuxième rapport biennal de transparence et de la quatrième communication nationale ; Suivi et Evaluation

- L'atelier de lancement s'est tenu à Alger, le dimanche 26 mai 2024, au siège du Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables où il a été discuté en détails, le cadre logique du projet et l'actualisation des risques.

- Un atelier a été organisé du 21 au 23 octobre 2024 pour la présentation du 1er draft du premier rapport biennal de transparence (BTR1)

L'atelier s'inscrit dans le processus de co-construction du rapport BTR1 avec les ministères et institutions entamé lors de l'atelier de lancement des activités relatives aux composantes 3 et 5 (30 et 31 juillet) et celui de la composante 4 (02 juillet). Depuis lors, les données requises pour la rédaction des chapitres 3, 4 et 5 ont été en partie transmises par les ministères et institutions, revues et intégrées dans la version préliminaire (Draft 1), transmise ainsi que les tableaux relatifs à l'état de réalisation du PNC et ceux traitant des appuis nécessaires et reçus.

Sujet : Amender et compléter les informations des Chapitres 3, 4, et 5 du rapport préliminaire BTR1.
Lieu : Hotel New Day ; Hussein Dey, Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEER et PNUD Algérie
Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Traute Koether (EI02) ; Hamza Merabet (EN02_1) ; Smain Khennas (EI03), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé du 02 décembre 2024 pour la présentation du document premier rapport biennal de transparence (BTR1)

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du 1er rapport de transparence de l'Algérie (BTR1). Il fait suite aux différents ateliers organisés pour les différentes composantes de ce projet ainsi qu'aux processus de collecte d'informations, d'analyse, d'échanges et de révisions successives prenant en compte les remarques et correctifs formulés par les secteurs.

Le document présenté est l'aboutissement du processus de concertations, de débats autour des hypothèses de travail et des contributions des différents secteurs. Des amendements substantiels ont été apportés aux différentes versions produites qui prennent en charge les remarques formulées. L'objectif général de l'atelier a été la pré-validation des chapitres constituant l'avant-projet de BTR1. La prise en compte des remarques formulées sur le document durant l'atelier a permis de produire un avant-projet consolidé pour le soumettre à validation officielle

Sujet : pré-validation des chapitres constituant le BTR1 pour le soumettre à validation officielle.
Lieu : Hotel Bali Building/ Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun, Alger

Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Traute Koether (EI02) ; Hamza Merabet (EN02_1) ; Smain Khennas (EI03), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé du 22 décembre 2024 pour la validation du premier rapport biennal de transparence (BTR1)

Sujet : Validation du document BTR1 pour le soumettre à la CCNUCC.
Lieu : Ministère de l'environnement et de la Qualité de la vie (MEQV)
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Traute Koether (EI02) ; Hamza Merabet (EN02_1) ; Smain Khennas (EI03), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres du Comité national climat (CNC)

- Un atelier a été organisé le 28 & 29 avril 2025 pour le lancement des activités d'élaboration du combinat BTR2&NC4

L'atelier avait pour but d'expliciter et emporter l'adhésion des secteurs parties prenantes du projet. Il offre l'opportunité de tirer les leçons du processus d'élaboration du BTR1. Il s'agit en particulier de discuter des formes d'organisation qui permettront de dépasser les carences observées et d'atteindre les objectifs assignés dans les délais.

Sujet : Retour sur les leçons apprises des processus précédents
Lieu: Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Abdelhak Trache (EN01) ; David Maradan (EI01) ; Traute Koether (EI02) ; Hamza Merabet (EN02_1) ; Smain Khennas (EI03), Ménouèr Boughedaoui (EN02_3) ; Mahi Tabet Aoul (EN04) ; Julie Louvel (EI04)
Modérateur : Salima Cherchali (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

- Un atelier a été organisé le 1er et 2 février 2026 pour la préparation des travaux du second rapport biennal de transparence (BTR2) et de la quatrième communication nationale (CN4)

L'atelier avait pour but de poser les bases méthodologiques, institutionnelles et opérationnelles de la préparation intégrée du BTR2 et de la CN4. Cet atelier visait à garantir une approche harmonisée, participative et conforme aux directives de la CCNUCC, notamment les décisions 4/CP.5 et 17/CP.8, ainsi qu'au Cadre de transparence renforcé (MPV) de l'Accord de Paris.

Sujet : Assurer une planification concertée et coordonnée du BTR2 et de la CN4 en définissant les méthodologies, les rôles institutionnels et un calendrier réaliste de mise en œuvre.
Lieu : Legacy Luxury Hotel ; Ben Aknoun , Alger
Mode de communication : Présentiel et visioconférence
Organisateur : MEQV et PNUD Algérie
Animation : Smail Khennas (EI05) / Abdelhak Trache (EN05) / David Maradan (EI01) / Emna Sohlobji (EIG)/ Hamza Merabet (EN03) / Traute Köther (EI02) / Ménouèr Boughedaoui (EN02_3)
Modérateur : Saïda Laouar (DNP) & Cherif Aoudjit (CNP)
Participants : membres désignés par les secteurs parties prenantes du projet et les membres du CNC

i/ Organisation de réunions de coordination

Depuis le mois d'avril, les experts rédacteurs du BTR1 et de la CN4/BTR2 participent à tous les ateliers/ rencontres organisés par le projet. En outre, les experts ont initié une (01) réunion de coordination avec l'ensemble des experts pour débattre de l'état d'avancement de chaque thématique et essayer de solutionner les contraintes rencontrées.

ii/ Traitement des données collectées et production des livrables


Les livrables remis par les experts (nationaux et internationaux) sont traités au fur et mesure de leur réception.

Des ateliers et rencontres réalisés les experts ont produit :
EI05 : Le Rapport BTR1
EN05 : Le Rapport BTR1

iii/ Situation budgétaire

L'évolution de consommation budgétaire de la composante 5 du projet : Compilation du BTR1, Suivi et Evaluation, se présente comme suit :

Code	Désignation	Année 2024	Année 2025	Année 2026
71200	Expert International	9 000,00	10 200,00	
71300	Experts Nationaux	18 478,93	3 782,35	
71600	Voyages		5 041,00	
74200	Frais Audio Visual & Impression			
75700	Formations, Ateliers et Conférences			
76100	Pertes de changes	-27,99	-4,35	
	Total	**27 450,94**	**19 019,00**	

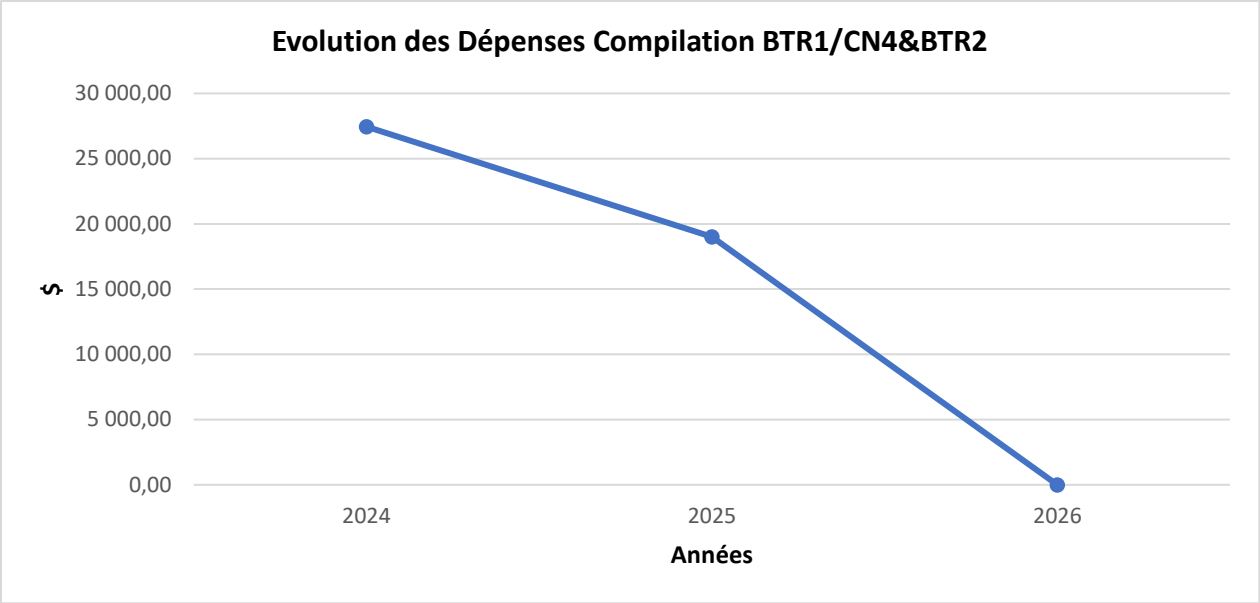

B.2.3- Contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du projet

La planification opérationnelle basée sur le document de base du projet a été mise à jour pour tenir compte de la situation particulière engendrée par le délais très restreints (06 mois) accordés à l'élaboration du BTR1.

Au-delà, depuis juin 2024, toutes les activités ont été lancées à travers des ateliers techniques regroupant les cadres des différentes parties prenantes identifiées pour faire partie des quatre groupes de travail thématiques (GTT).

Le recrutement d'un expert international Genre et d'un expert national pour le suivi de la CDN et des actions d'atténuation n'a été possible que vers la fin de l'exercice 2025, faute de candidatures intéressantes.

L'exercice 2025 a enregistré le départ à la retraite de la Directrice Nationale du Projet (DNP) ; les activités ont été arrêtées entre juin et octobre.

C. Principaux résultats réalisés par activités

C.1. Déroulement des activités

Composante 1 : Les circonstances nationales et arrangements institutionnels pertinents pour la préparation du BTR1 sont actualisées.

La rédaction du rapport thématique Circonstances nationales pour le BTR1 est entamée dès juillet 2024. L'élaboration de ce rapport a été finalisée et intégrée au BTR1. Depuis janvier 2025, la collecte des données issues des différents secteurs membres du CNC est relancée. Ces derniers ont été destinataires de courriers officiels, de demande et de rappels pour transmettre les canevas renseignés et documents sectoriels.

Composante 2 : Inventaire des GES

La rédaction du Document national d'inventaire (DNI) qui est la partie la plus importante du BTR1 a été finalisée et intégrée au BTR1. Le DNI a été soumis à la CCNUCC au même titre que le BTR1.
La rédaction du DNI pour la CN4&BTR2, a été entamée dès janvier 2025. Selon la planification, le DNI est en phase de finalisation et devrait être prêt à la fin du mois de novembre 2026.
L'opération de collecte des données nécessaires à la rédaction du rapport d'Inventaire GES, s'est faite par l'entremise de canevas à renseigner envoyés aux partenaires institutionnels transmis depuis avril 2025. Des réunions restreintes ont été organisées pour expliciter les canevas et les besoins en données.

Composante 3 : Suivi de la mise en œuvre de la CDN et des actions d'atténuation des émissions de GES

La rédaction du rapport Suivi de la mise en œuvre de la CDN et des actions d'atténuation des émissions de GES pour les besoins du BTR1, a été finalisée après transmission des derniers résultats de calcul de l'inventaire des GES.
Des courriers officiels ont été adressés aux secteurs pour transmettre les canevas renseignés. Les membres désignés par les secteurs ont été saisis par mails et par téléphone pour accélérer la transmission des renseignements demandés afin d'actualiser le rapport thématique pour le combinat BTR2&CN4.

Composante 4 : Analyse des impacts des changements climatiques sur les secteurs prioritaires et les mesures d'adaptation

La rédaction du rapport thématique Vulnérabilité et Adaptation a été entamée dès juillet et finalisée en décembre 2024. L'élaboration d'un nouveau rapport pour l'intégrer au combinat BTR2&CN4 est en phase d'élaboration après collecte des données et documents stratégiques des secteurs prioritaires.
Des courriers officiels, de demande et de rappels, ont été adressés aux secteurs pour transmettre les canevas renseignés et documents sectoriels.

C.2. Indicateurs de résultats

L'objectif premier du Projet pour l'année 2025 est d'engager les activités d'élaboration du combinat BTR2 et NC4. Il repose sur les deux (02) indicateurs donnés par le cadre logique, à savoir :

- Indicateur 1 : *Bénéficiaires directs du projet ventilés par sexe (personnes individuelles)*.
  - Au 30 avril 2026, le nombre de bénéficiaires directs du projet est de 275 (dont 158 femmes).

- Indicateur 2 : *Premier BTR et quatrième CN/deuxième BTR soumis à la CCNUCC*.
  - Le BTR1 a été élaboré et soumis à la CCNUCC le 29 décembre 2024.
  - Le NIR1 a été élaboré et soumis à la CCNUCC le 29 décembre 2024.
  - Le BTR2, la NC4 et le NIR2 devraient être soumis à la CCNUC en décembre 2026.

Quant aux composante du projet, ils sont au nombre de quatre :

Composante 1 : Circonstances nationales, arrangements institutionnels, description des CDN, contraintes, lacunes et autres informations

- Indicateurs 3 : *Collecte d'informations sur les circonstances nationales et les dispositions institutionnelles pertinentes.*

  - Les Informations sur les Circonstances nationales jusqu'en 2022 ont été collectées et communiquées dans le BTR1.
  - Les Informations sur les Circonstances nationales et les dispositions institutionnelles pertinentes et actualisées, sont en cours de collecte selon des canevas préétablis et communiqués aux différents secteurs parties prenantes du projet ; elles seront communiquées dans le BTR2&NC4

- Indicateurs 4 : *Informations sur la CDN y compris les points de référence, fournies.*

  - La CPDN a été décrite en tenant compte des impacts socio-économiques des actions et politiques d'atténuation et le degré d'intégration de la dimension Genre au niveau national et sectoriel, pour le BTR1.
  - Les informations sur la CDN révisées en 2025, y compris les points de référence, fournies en tant que contributions pertinentes pour les Circonstances nationales et les dispositions institutionnelles sont en cours de collecte ; elles seront rapportées dans le BTR2&NC4

- Indicateurs 5 : *Collecte d'informations sur les ressources financières, le transfert de technologie, le renforcement de capacités et l'assistance technique.*

  - Les informations sur les lacunes et les besoins en matière de ressources financières, de transfert de technologie et de renforcement de capacités ont été très partiellement identifiés malgré la tenue des ateliers consultatifs avec les parties prenantes du projet dans le cadre de l'élaboration du BTR1.
  - Les Informations actualisées sur les ressources financières, le transfert de technologie, le renforcement de capacités et l'assistance technique nécessaires et reçues, sont en phase de collecte, selon les canevas communiqués aux différents secteurs. Des améliorations devraient être faites dans le rapport thématique pour être intégrées dans le combinat BTR2&NC4

- Indicateurs 6 : *Analyse de Genre avec recommandations sur l'intégration de la dimensions Genre dans les politiques et législation relatives au CC.*

  - Le lancement d'une première analyse sur les femmes et le changement climatique en Algérie n'a pas pu être réalisé au cours de l'élaboration du BTR1.
  - L'Analyse de Genre en tant que contribution aux informations relatives à la situation nationale et aux dispositions institutionnelles est en cours d'amélioration pour être intégrée dans les chapitres pertinents des BTR2&NC4

Composante 2 : Inventaire des GES

- Indicateur 7 : *Amélioration des données de l'inventaire des GES et mise en œuvre d'un plan d'assurance et contrôle de la qualité.*

  - La réévaluation des facteurs d'émission nationaux et le recalcul des GES sur la base des ajustements des facteurs d'émission, ont été effectués pour la série temporelle 1990 à 2022
  - L'Amélioration des données de l'inventaire des GES, l'utilisation de facteurs d'émission nationaux dans les données d'entrée pour 2020-2024, l'actualisation des données des séries

temporelles jusqu'en 2024 et la mise en œuvre d'un plan d'assurance et de contrôle qualité (AQ/CQ), sont en cours de réalisation.

- Indicateur 8 : *Inventaire des GES élaboré conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC.*

- L'inventaire national de GES a été mis à jour en incluant les années 2021 et 2022 dans la série temporelle établie depuis l'inventaire de la TCN. Les nouveaux chiffres sont inclus dans le BTR1.
- L'inventaire national de GES est en phase de mise à jour pour inclure les années 2023 et 2024 dans la série temporelle établie depuis l'inventaire du BTR1. Les nouveaux chiffres seront inclus dans le BTR2/NC4.

- Indicateur 9 : *Rapport d'Inventaire national sur les émission anthropiques de GES par les sources et de l'absorption par les puits de tous les GES, mis à jour avec trois années supplémentaires (2021-2024).*

- Le Rapport national d'inventaire des GES (NIR) a été mis à jour pour le BTR1 en complétant les séries chronologiques de 1990 à 2022.
- Le Rapport national d'inventaire des GES (NIR) est en phase de mise à jour pour le BTR2&NC4 en complétant les séries chronologiques de 1990 à 2024.

Composante 3 : Suivi des progrès de la mise en œuvre et de la réalisation de la CDN et des actions d'atténuation

- Indicateur 10 : *Politiques nationales de réduction des émissions de GES, décrites*

- Une mesure politique n'a pas pu être développée ni une mise à jour du guide de procédures pour la préparation des inventaires pour le BTR1.
- L'Analyse des politiques et mesures nationales ayant un potentiel d'atténuation, y compris la CDN en cours d'élaboration (finalisée en décembre 2025) dans le cadre du chapitre sur les informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs au titre de l'article 4 de l'AP, est en cours de réalisation.

- Indicateur 11 : *Elaboration de projections d'émissions de GES jusqu'en 2040*

- Des scénario d'émission de GES à l'horizon 2030 ont été décrits dans les principaux secteurs (Energie, PIUP, AFAT et Déchets)
- Des scénario d'émission de GES à l'horizon 2040 sont en cours de réalisation selon les données collectées issues sur les principaux secteurs (Energie, PIUP, AFAT et Déchets)

- Indicateur 12 : *Cadre conceptuel pour le suivi des CDN, disponible*

- L'analyse des impacts socioéconomiques des actions et politiques d'atténuation a été menée, alors que le degré d'intégration de la dimension Genre au niveau national et sectoriel n'a été que partiellement développé.
- Le concept de suivi des CDN sera adopté et présenté dans le cadre du chapitre "Informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs au titre de l'article 4 de l'AP, du BTR2&NC4

Composante 4 : Impacts du changement climatique et mesures d'adaptation

- Indicateur 13 : *Un chapitre sur l'adaptation comprenant des scénarios climatiques*

- Des scénarios climatiques compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5°C et bien en dessous de 2°C, ont été développés.
- La collecte de données en cours afin d'établir des scénarios climatiques et actualiser les informations sur les mesures d'adaptation. Le chapitre "Informations relatives aux impacts du CC et à l'adaptation" au titre de l'article 7 de l'AP n'est pas encore entamé.

- Indicateur 14 : *Intégration de la dimension Genre dans les mesures d'adaptation au CC*

- l'Analyse sexospécifique des mesures d'adaptation est entamée ; ses résultats seront présentés dans le cadre des mesures relatives au CC et à l'adaptation.

Composante 5 : Compilation, publication et soumission du rapport NC4/BTR1, Gestion des connaissances

- Indicateur 15 : *BTR1/NC4&BTR2 compilés et soumis, et les enseignements tirés sont collectés et diffusés*

- Le BTR1 soumis à la CCNUCC en décembre 2024. Les enseignements tirés ont fait l'objet de deux ateliers spécifiques de capitalisation de l'expérience avec les toutes les parties prenantes du projet.

- Indicateur 16 : *Nombre de réunions de groupes de travail organisées pour présenter les conclusions et les résultats de BTR1/NC4/BTR2*

- Trois (03) ateliers ont été organisés du 21 au 23 octobre, du 02 décembre et 22 décembre 2024 avec toutes les parties prenantes du projet.
- Un (01) atelier a été organisé du 28 avril 2025 avec toutes les parties prenantes du projet, pour capitaliser l'expérience de l'élaboration du BTR1.
- Un (01) atelier a été organisé du 01 et 02 février 2026 avec toutes les parties prenantes du projet, pour capitaliser l'expérience de l'élaboration du BTR1.
-

- Indicateur 17 : *Le S&E est effectué conformément aux règles et procédures applicables*

- Le suivi et évaluation du projet est effectué conformément au plan annuel de S&E approuvé.

Cadre logique du projet (objectifs 2024)

		Indicateurs	Base de référence	Objectifs à moyen terme	Notation
Objectif du Projet	Aider l'Algérie à préparer et à soumettre le rapport BTR1 pour le respect des obligations découlant de la CCNUCC et de l'AP conformément aux MPG pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de la décision 18/CMA.1 et les directives sur l'opérationnalisation des MPG conformément à la décision 5/CMA.3.	**Indicateur 1 :** Bénéficiaires directs du projet ventilés par sexe (personnes individuelles)		50 bénéficiaires (personnes individuelles) dont 50% de femmes	100%
		Indicateur 2 : Premier BTR et quatrième NC/deuxième BTR combinés soumis à la CCNUCC	TCN&BUR1	BTR1 soumis en décembre 2024	100%
Résultat 1	1.1 Examen des communications nationales antérieures et aperçu de la situation, des politiques et des arrangements institutionnels actuels concernant l'élaboration des RTC1 et RTC2/NC4	**Indicateur 3 :** Collecte d'informations sur les circonstances nationales et les dispositions institutionnelles pertinentes	TCN&BUR1	Informations sur les Circonstances nationales jusqu'en 2022 collectées et communiquées dans le BTR1	100%
		Indicateur 4 : Informations sur la CDN y compris les points de référence, fournies	CDN octobre 2016	Description de la CDN, y compris les impacts socio-économiques des actions et politiques d'atténuation et le degré d'intégration de la dimension Genre au niveau national et sectoriel	100%
	1.2 Autres informations pertinentes décrites (recherche/observation systématique, transfert de technologie, éducation, sensibilisation du public, renforcement des capacités, contraintes et lacunes)	**Indicateur 5 :** Collecte d'informations sur les ressources financières, le transfert de technologie, le renforcement de capacités et l'assistance technique	CNC	Les lacunes et les besoins en matière de ressources financières, de transfert de technologie et de renforcement de capacités sont identifiés lors d'ateliers consultatifs nationaux	20%
		Indicateur 6 : Analyse de Genre avec recommandations sur l'intégration de la dimensions G dans les politiques et législation relatives au CC	N/A	Lancement d'une 1ère analyse sur les femmes et le CC en Algérie	
Résul		**Indicateur 7 :**	TCN&BUR1		100%

	2.1 Système national des inventaires des émissions de GES	Amélioration des données de l'inventaire des GES et mise en œuvre d'un plan d'assurance et contrôle de la qualité		Réévaluation des facteurs d'émission nationaux et recalcul des GES sur la base des ajustements des facteurs d'émission, effectués	
	2.2 Renforcement des capacités nationales pour la préparation et la gestion des inventaires de GES	**Indicateur 8 :** Inventaire des GES élaboré conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC	TCN&BUR1	Mise à jour de l'inventaire des GES pour inclure les années 2021 et 2022 dans le BTR1	100%
	2.3 Rapport les inventaires sectoriels nationaux des émissions par les sources et de l'absorption par les puits de tous les GES	**Indicateur 9 :** Rapport d'Inventaire national sur les émission anthropiques de GES par les sources et de l'absorption par les puits de tous les GES, mis à jour avec trois années supplémentaires (2021-2024)	TCN&BUR1	Mise à jour du NIR pour le BTR1 dans le cadre des séries chronologiques 1990-2022	100%
Résultat 3	3.1 Analyse des politiques et mesures prises par le gouvernement pour réduire les émissions de GES par secteur (énergie, IPPU, AFAT et déchets)	**Indicateur 10 :** Politiques nationales de réduction des émissions de GES, décrites	Lignes directrices 2006 du GIEC	Une mesure politique est développée et un guide de procédures pour la préparation des inventaires est mis à jour pour le BTR1	0%
	3.2 Les projections des émissions de GES jusqu'en 2040, dans le cadre de l'AP, dans les principaux secteurs et la feuille de route NDC 2025-2030 complétée	**Indicateur 11 :** Elaboration de projections d'émissions de GES jusqu'en 2040	TCN&BUR1 ; CDN	Scénario d'émission de GES à l'horizon 2030 décrit dans les principaux secteurs (Energie, PIUP, AFAT et Déchets)	100%
	3.3 Système de suivi CDN	**Indicateur 12 :** Cadre conceptuel pour le suivi des CDN, disponible	N/A	Analyse des impacts socioéconomiques des actions et politiques d'atténuation, et du degré d'intégration de la dimension Genre au niveau national et sectoriel	70%
Résult		**Indicateur 13 :**	TCN&BUR1		100%

	4.1 Élaboration de scénarios climatiques et de scénarios socioéconomiques d'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques pour les secteurs prioritaires et élaboration de plans et de programmes proposant des mesures pour faciliter l'adaptation	Un chapitre sur l'adaptation comprenant des scénarios climatiques		Scénarios climatiques compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5°C et bien en dessous de 2°C	
		Indicateur 14 : Intégration de la dimension Genre dans les mesures d'adaptation au CC	TCN&BUR1	Evaluation du rôle des femmes dans les mesures d'adaptation	
Résultat 5	5.1 Compilation des rapports BTR1 et BTR2/NC4	**Indicateur 15 :** BTR1/NC4/BTR2 compilés et soumis, et les enseignements tirés sont collectés et diffusés	TCN&BUR1	BTR1 soumis à la CCNUCC en décembre 2024	100%
	5.2 Élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion des connaissances	**Indicateur 16 :** Nombre de réunions de groupes de travail organisées pour présenter les conclusions et les résultats de BTR1/NC4/BTR2		Au moins trois réunions publiques avec les principales parties prenantes sont organisées	100%
	5.3 Suivi et évaluation menés conformément aux règles et procédures applicables	**Indicateur 17 :** Le S&E est effectué conformément aux règles et procédures applicables	S&E de la TCN&BUR1	Le S&E est effectué conformément au plan annuel de S&E approuvé	100%

Cadre logique du projet (objectifs 2025-2026)

		Indicateurs	Base de référence	Objectifs de fin de projet	Réalisation
Objectif du Projet	Aider l'Algérie à préparer et à soumettre les rapport NC4&BTR2 pour le respect des obligations découlant de la CCNUCC et de l'AP conformément aux MPG pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de la décision 18/CMA.1 et les directives sur l'opérationnalisation des MPG conformément à la décision 5/CMA.3.	**Indicateur 1 :** Bénéficiaires directs du projet ventilés par sexe (personnes individuelles)		200 bénéficiaires (personnes individuelles) dont 50% de femmes	138% 158%
		Indicateur 2 : Premier BTR et quatrième NC/deuxième BTR combinés soumis à la CCNUCC	TCN&BUR1	NC4/BTR2 soumis en décembre 2026 NIR élaboré	
Résultat 1	1.1 Examen des communications nationales antérieures et aperçu de la situation, des politiques et des arrangements institutionnels actuels concernant l'élaboration des RTC1 et RTC2/NC4	**Indicateur 3 :** Collecte d'informations sur les circonstances nationales et les dispositions institutionnelles pertinentes	TCN&BUR1	Informations actualisées sur les Circonstances nationales et les dispositions institutionnelles pertinentes collectées et communiquées dans le BTR2/NC4	50%
		Indicateur 4 : Informations sur la CDN y compris les points de référence, fournies	CDN octobre 2016	Informations sur la CDN révisées, y compris les points de référence, fournies en tant que contributions pertinentes pour les Circonstances nationales et les dispositions institutionnelles collectées et rapportées dans le BTR2/NC4	75%
	1.2 Autres informations pertinentes décrites (recherche/observation systématique, transfert de technologie, éducation, sensibilisation du public, renforcement des capacités, contraintes et lacunes)	**Indicateur 5 :** Collecte d'informations sur les ressources financières, le transfert de technologie, le renforcement de capacités et l'assistance technique	CNC	Informations actualisées sur les ressources financières, le transfert de technologie, le renforcement de capacités et l'assistance technique nécessaires et reçues ont été collectées	25%
		Indicateur 6 : Analyse de Genre avec recommandations sur l'intégration de la dimensions G dans les politiques et législation relatives au CC	N/A	Amélioration de l'analyse de Genre en tant que contribution aux informations relatives à la situation nationale et aux dispositions institutionnelles dans le cadre des chapitres pertinents des BTR2/NC4	25%

Résultat 2	2.1 Système national des inventaires des émissions de GES	**Indicateur 7 :** Amélioration des données de l'inventaire des GES et mise en œuvre d'un plan d'assurance et contrôle de la qualité	TCN&BUR1	Amélioration des données de l'inventaire des GES, utilisation de facteurs d'émission nationaux dans les données d'entrée pour 2020-2024 et mise en œuvre d'un plan d'assurance et de contrôle qualité (AQ/CQ)	50%
	2.2 Renforcement des capacités nationales pour la préparation et la gestion des inventaires de GES	**Indicateur 8 :** Inventaire des GES élaboré conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC	TCN&BUR1	Mise à jour de l'inventaire des GES pour les années supplémentaires 2020-2024	50%
	2.3 Rapport les inventaires sectoriels nationaux des émissions par les sources et de l'absorption par les puits de tous les GES	**Indicateur 9 :** Rapport d'Inventaire national sur les émission anthropiques de GES par les sources et de l'absorption par les puits de tous les GES, mis à jour avec trois années supplémentaires (2021-2024)	TCN&BUR1	NIR pour BTR2/NC4 développé jusqu'en 2024	50%
Résultat 3	3.1 Analyse des politiques et mesures prises par le gouvernement pour réduire les émissions de GES par secteur (énergie, IPPU, AFAT et déchets)	**Indicateur 10 :** Politiques nationales de réduction des émissions de GES, décrites	Lignes directrices 2006 du GIEC	Analyse des politiques et mesures nationales ayant un potentiel d'atténuation, y compris la feuille de route révisée de la CDN élaborée dans le cadre du chapitre sur les informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs au titre de l'article 4 de l'AP	50%
	3.2 Les projections des émissions de GES jusqu'en 2040, dans le cadre de l'AP, dans les principaux secteurs et la feuille de route NDC 2025-2030 complétée	**Indicateur 11 :** Elaboration de projections d'émissions de GES jusqu'en 2040	TCN&BUR1 ; CDN	Analyse des politiques et mesures nationales ayant un potentiel d'atténuation, y compris la feuille de route révisée de la CDN élaborée dans le cadre du chapitre sur les informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs au titre de l'article 4 de l'AP	50%
	3.3 Système de suivi CDN	**Indicateur 12 :** Cadre conceptuel pour le suivi des CDN, disponible	N/A	Concept de suivi des CDN adopté et présenté dans le cadre du chapitre "Informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs au titre de l'article 4 de l'AP	


Résultat 4	4.1 Élaboration de scénarios climatiques et de scénarios socioéconomiques d'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques pour les secteurs prioritaires et élaboration de plans et de programmes proposant des mesures pour faciliter l'adaptation	**Indicateur 13 :** Un chapitre sur l'adaptation comprenant des scénarios climatiques	TCN&BUR1	Scénarios climatiques élaborés et informations actualisées sur les mesures d'adaptation présentées dans le cadre du chapitre "Informations relatives aux impacts du CC et à l'adaptation au titre de l'article 7 de l'AP	25%
		Indicateur 14 : Intégration de la dimension Genre dans les mesures d'adaptation au CC	TCN&BUR1	Analyse sexospécifique des mesures d'adaptation élaborées et présentées dans le cadre des mesures relatives au CC et à l'adaptation	
Résultat 5	5.1 Compilation des rapports BTR1 et BTR2/NC4	**Indicateur 15 :** BTR1/NC4/BTR2 compilés et soumis, et les enseignements tirés sont collectés et diffusés	TCN&BUR1	NC4/BTR2 soumis à la CCNUCC en décembre 2026	
	5.2 Élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion des connaissances	**Indicateur 16 :** Nombre de réunions de groupes de travail organisées pour présenter les conclusions et les résultats de BTR1/NC4/BTR2		Au moins six réunions publiques avec les principales parties prenantes sont organisées	33%
	5.3 Suivi et évaluation menés conformément aux règles et procédures applicables	**Indicateur 17 :** Le S&E est effectué conformément aux règles et procédures applicables	S&E de la TCN&BUR1	Le S&E est effectué conformément au plan annuel de S&E approuvé, y compris l'atelier de démarrage, les rapports annuel d'état d'avancement et le rapport de fin de projet	50%

D. Réalisations budgétaires

Les réalisations budgétaires sont scindées en deux parties :

D.1. Evolution des dépenses budgétaires annuelles


Code	Désignation	Budget alloué	Dépenses 2024	Dépenses 2025	Dépenses 2026	%
71200	Experts Internationaux	77 500,00	22 782,17	29 466,66		67%
71300	Expert National	77 500,00	21 014,73	16 245,08		48%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	15 000,00			9 445,92	63%
71600	Voyages	10 000,00				0%
76100	Pertes de changes		-27,69		-209,38	
	Circonstances nationales	**180 000,00**	**43 769,21**	**45 711,74**	**9 236,54**	**50%**
71200	Experte Internationale	90 000,00	35 046,00	30 521,00		73%
71300	Experts Nationaux	157 500,00	50 838,62	46 319,93		62%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	55 000,00	21 134,28	19 918,92	1 964,83	78%
71600	Voyages	36 000,00		546,78		2%
74200	Frais Audio Visual & Impression	59 500,00	6 217,23	6 435,15		21%
76100	Pertes de changes	0,00	-74,26	291,73	26,63	
	Inventaire GES	**398 000,00**	**113 161,87**	**104 033,51**	**1 991,46**	**55%**
71200	Expert International	70 400,00	28 758,94	9 000,00		54%
71300	Expert National	25 000,00		9 730,32		39%
71600	Voyages	5 010,00				0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	20 000,00				0%
76100	Pertes de changes			60,82		
	CDN & Atténuation des GES	**120 410,00**	**28 758,94**	**18 791,14**	**0,00**	**39%**
71200	Experte Internationale	70 000,00	3 150,00	12 600,00		23%
71300	Expert National	135 000,00	21 039,87	21 525,56		32%
71600	Voyages	5 000,00				0%
74200	Frais Audio Visual & Impression	17 000,00			1 340,00	8%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	65 000,00	14 830,25	10 653,09	6 939,52	50%
76100	Pertes de changes		-34,43	40,17	-135,11	
	Vulnérabilité & Adaptation	**292 000,00**	**38 985,69**	**44 818,82**	**8 144,41**	**29%**
71200	Expert International	75 000,00	9 000,00	10 200,00		26%
71300	Expert National	35 000,00	18 478,93	3 782,35		64%
71600	Voyages	6 000,00	1 558,55	5 041,00		110%
74200	Frais Audio Visual & Impression	8 500,00				0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	6 000,00				0%
76100	Pertes de changes	0,00	-40,32	-4,35		
	Compilation BTR1/NC4&BTR2	**130 500,00**	**28 997,16**	**19 019,00**	**0,00**	**37%**
71400	Contrat de Services Individuel	108 090,00	36 368,13	55 527,87	14 367,86	98%
74596	Services pour Project - GOEs	4 000,00		2 058,76		51%
	Management de projet	**112 090,00**	**36 368,13**	**57 586,63**	**14 367,86**	**84%**
		1 233 000,00	**290 041,00**	**289 960,84**	**33 740,27**	**50%**

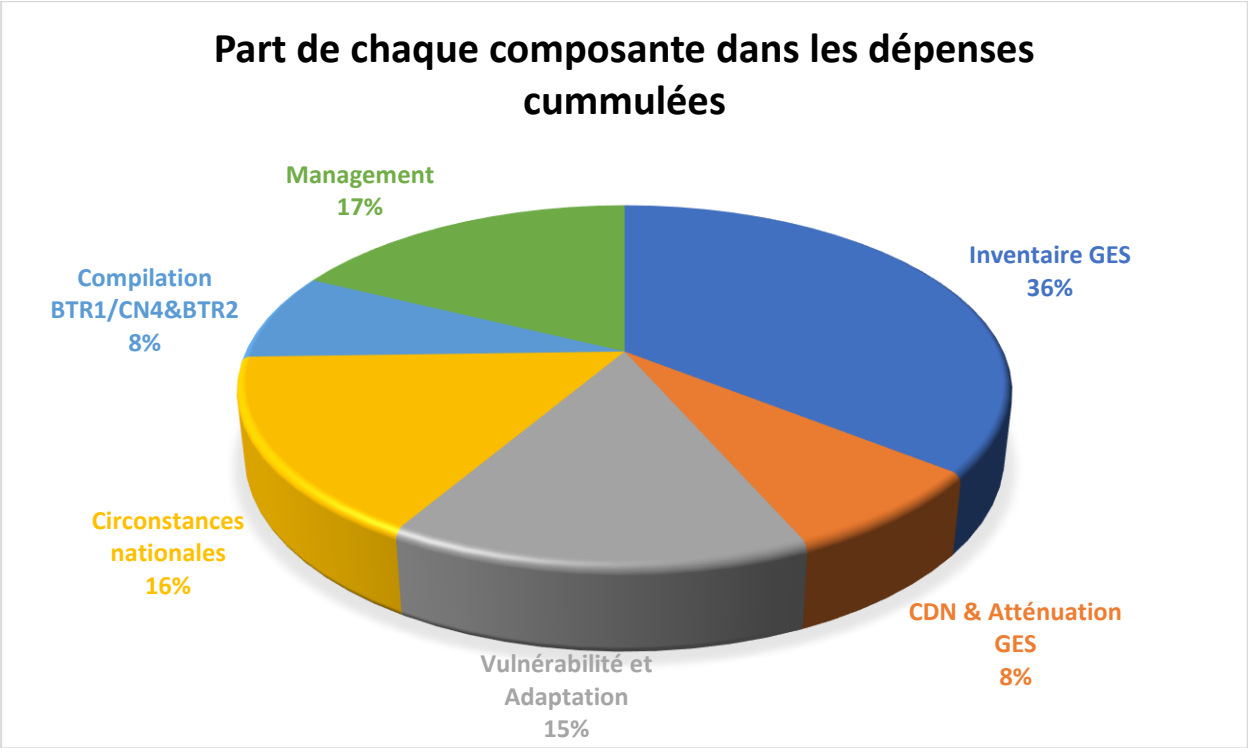

D.2. Consommation Budgétaire de l'exercice 2026

Code	Désignation	Budget 2026	Dépenses 2026	Reste à dépenser en 2026	%
71200	Expert International	45 500,00		45 500,00	0%
71300	Expert National	26 680,00		26 680,00	0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	10 000,00	9 445,92	554,08	94%
71600	Voyages	5 660		5 660,00	0%
76100	Pertes de changes		-209,38		
	Circonstances nationales	**87 840,00**	**9 236,54**	**78 394,08**	**11%**
71200	Expert International	34 000,00		34 000,00	0%
71300	Expert National	79 500,00		79 500,00	0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	8 389,00	1 964,83	6 424,17	23%
71600	Voyages	15 500		15 500,00	0%
74200	Frais Audio Visual & Impression	29 982,77		29 982,77	0%
76100	Pertes de changes		26,63		
	Inventaire GES	**167 371,77**	**1 991,46**	**165 406,94**	**1%**
71200	Expert International	14 000,00		14 000,00	0%
71300	Expert National	15 000,00		15 000,00	0%
71600	Voyages	5 010		5 010,00	0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	20 000,00		20 000,00	0%
76100	Pertes de changes				
	CDN & Atténuation des GES	**54 010,00**	**0,00**	**54 010,00**	**0%**
71200	Expert International	37 850,00		37 850,00	0%
71300	Expert National	36 789,19		36 789,19	0%
71600	Voyages	5 000		5 000,00	0%
74200	Frais Audio Visual & Impression	17 000	1 340,00	15 660,00	8%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	39 104,00	6 939,52	32 164,48	18%

76100	Pertes de changes		-135,11		
	Vulnérabilité & Adaptation	**135 743,19**	**8 144,41**	**127 463,67**	**6%**
71200	Expert International	0,00		0,00	
71300	Expert National	18 500,00		18 500,00	0%
71600	Voyages	900,00		900,00	0%
74200	Frais Audio Visual & Impression	8 500		8 500,00	0%
75700	Formations, Ateliers et Conférences	4 441		4 441,00	0%
76100	Pertes de changes				
	Compilation BTR1/NC4&BTR2	**32 341,00**	**0,00**	**32 341,00**	**0%**
71400	Contrat de Services Individuel	29 632,00	14 367,86	15 264,14	48%
74596	Services pour Project - GOEs	2 000,00		2 000,00	0%
76100	Pertes de changes			0,00	
	Management de projet	**31 632,00**	**14 367,86**	**17 264,14**	**94%**
		508 937,96	**33 740,27**	**474 879,83**	**7%**

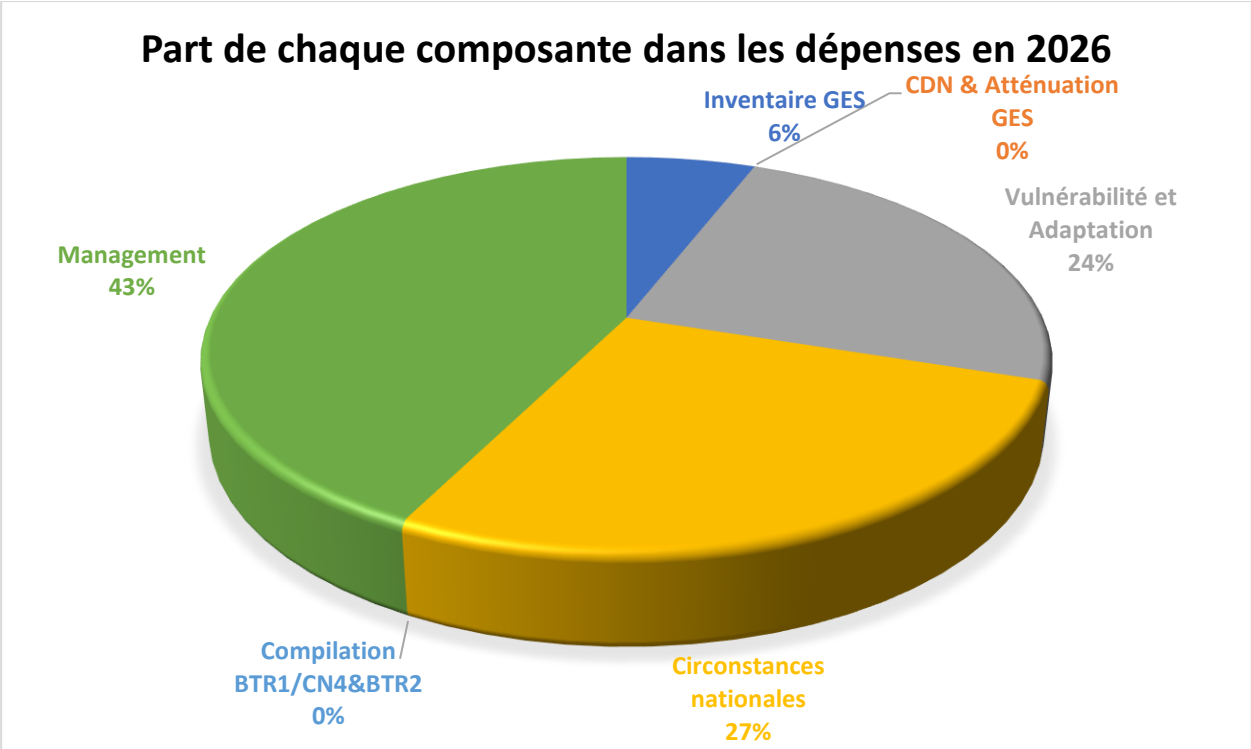

E. Gestion des risques

Le registre des risques, développé lors de la formulation du projet, est périodiquement mis à jour afin de revoir les mesures d'atténuation et les réponses de gestion à mettre en place.

La matrice pour l'évaluation des risques pour le projet BTR1/NC4&BTR2 est donnée au tableau ci-après.

		Impact				
		Insignifiant	Mineur	Modéré	Majeur	Critique
Probabilité	Très probable	5 - Moyen	10 - **Elevé**	15 - Très élevé	20 - Très élevé	25 - Très élevé
	Probable	4 - Moyen	8 - Moyen	12 - **Elevé**	16 - Très élevé	20 - Très élevé
	Possible	3 - Faible	6 - Moyen	9 - Moyen	12 - **Elevé**	15 - Très élevé
	Peu probable	2 - Très faible	4 - Faible	6 - Moyen	8 - Moyen	10 - **Elevé**
	Improbable	1 - Très faible	2 - Très faible	3 - Faible	4 - Moyen	5 - Moyen

Le document de projet (Prodoc) a identifié, pour le projet BTR1/CN4&BTR2 un total de quatre (04) risques. Sur ce nombre total, aucun risque ne s'est vérifié/aggravé lors de la réalisation des activités du projet, pour être reclassé vers un échelon supérieur.

Un risque n'a pas été prévu dans le Prodoc ; il a dû être intégré à la matrice de gestion des risques qui sont passés au nombre total de cinq (05). Il s'agit principalement des délais restreints pour l'élaboration du BTR1. En effet, le projet risque de ne pas être au rendez-vous de fin octobre 2024 à cause des difficultés dans la collecte des données et informations des secteurs (public et privé) pour diverses causes (indisponibilité des séries temporelles complètes, incompatibilité de la terminologie technique du GIEC avec celle des secteurs, difficultés de désagrégation des données fournies, …) ; ainsi que le non-respect des délais impartis dans la réalisation des activités demandées et des retours aux demandes formulées (études, rapports, canevas, explications par rapport aux incohérences des données, …).

Le registre des risques, ainsi que les réponses envisagées sont présentés dans le tableau suivant.

Risque	Stratégie d'atténuation
1 / Production, par des experts ou par des acteurs économiques, d'informations inexactes ou incorrectes concernant les vulnérabilités actuelles, les effets du changement climatique et les catastrophes liées *Date d'identification* : 30 octobre 2023 *Date de mise à jour* : 30 avril 2026 *Type de risque* : Opérationnel *Impact* : Modéré (3) *Probabilité* : Improbable (1)	- Examen critique et approfondi afin de s'assurer que les procédures et mesures recommandées soient applicables - Des experts techniques issus du monde universitaire et des parties prenantes sont impliqués dans tous les processus afin de garantir l'exactitude des résultats et des rapports - Les données fournies sont vérifiées par un comité technique composé de représentants des secteurs - Les experts du PNUD procèdent à une vérification croisée des données générées afin de s'assurer que les opérateurs du secteur économique (notamment privé) fournissent des données exactes, actualisées et utilisables à des fins d'établissement de rapports
Catégorie du risque : **Faible**	
Evolution du risque : Atténuation *Catégorie de réponse* : suivi périodique	
2/ Manque de données et d'informations ventilées par sexe *Date d'identification* : 30 octobre 2023 *Date de mise à jour* : 30 avril 2026 *Type de risque* : Opérationnel *Impact* : Modéré (3) *Probabilité* : Improbable (1)	- Le projet suivra l'analyse et le plan d'action pour le Genre élaborés par le projet TCN&BUR1 afin de mettre en évidence les questions de Genre pertinentes, d'explorer les possibilités d'intégration du Genre et d'aligner les efforts du projet sur les normes mondiales telles que le plan d'action pour le Genre de la CCNUCC, la boîte à outils pour des communications
Catégorie du risque : **Faible**	

Evolution du risque : Atténuation *Catégorie de réponse* : suivi périodique	nationales tenant compte du genre et la stratégie pour le genre du PNUD. - Un plan global d'intégration de la dimension de genre sera formulé afin de garantir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes de participer aux initiatives de lutte contre le changement climatique et d'en tirer profit. - Prise en compte des perspectives de genre dans toutes les analyses, évaluations et modèles pertinents - Collecter les données ventilées par sexe dans la mesure du possible. - Le PNUD plaidera pour que l'État soutienne fermement le plan d'action sur le genre
3/ Réapparition de la pandémie Covid 19 *Date d'identification* : 30 octobre 2023 *Date de mise à jour* : 30 avril 2026 *Type de risque* : Organisationnel *Impact* : Modéré (3) *Probabilité* : Improbable (1) Catégorie du risque : **Faible** *Evolution du risque* : Atténuation *Catégorie de réponse* : Suivi périodique	- Réunions par visioconférence - Signatures électroniques des documents - Echanges de documents par courriels - Réunions restreintes à un nombre réduit de personnes avec distanciation et port de bavettes - Réévaluez le calendrier du projet et l'ajuster si nécessaire pour tenir compte des retards potentiels. - Hiérarchiser les activités du projet : Identifier les activités critiques du projet qui doivent être achevées à temps et les classer par ordre de priorité - Si nécessaire, repousser les activités moins critiques à plus tard dans le calendrier du projet
4/ Récurrence de phénomènes climatiques majeurs (inondations, sécheresses persistantes, incendies, etc.) *Date d'identification* : 30 octobre 2023 *Date de mise à jour* : 30 avril 2026 *Type de risque* : Opérationnel *Impact* : Modéré (3) *Probabilité* : Improbable (1) Catégorie du risque : **Faible** *Evolution du risque* : Atténuation *Catégorie de réponse* : Suivi périodique	- Élaborer des plans d'urgence qui tiennent compte de l'impact potentiel des phénomènes climatiques récurrents sur les activités du projet. - Utiliser les données et les prévisions climatiques pour estimer l'impact potentiel des phénomènes climatiques récurrents sur les activités du projet. - Impliquer les experts en climatologie dans la planification et la mise en œuvre des activités du projet par les secteurs concernés. - Organiser des réunions spécifiques avec des représentants de ces secteurs pour faciliter leur contribution au projet. - Contrôler et évaluer l'impact des phénomènes climatiques récurrents sur les activités du projet. - Combiner les actions de renforcement des capacités avec les différentes étapes du travail à réaliser. -

5/ Dépassement des délais pour élaborer le BTR1 *Date d'identification* : 04 juin 2025 *Date de mise à jour* : 30 avril 2026 *Type de risque* : Opérationnel *Impact* : Modéré (3) *Probabilité* : Possible (3)	- Les Groupes thématiques sont constitués des cadres de tous les secteurs parties prenantes du projet. Ils sont les fournisseurs de données. - Contact permanent avec les points focaux du projet dans les secteurs. Ils ont pour rôle de faire le plaidoyer pour faciliter l'échange de données. - Sélection précoce et implication du personnel de tous les secteurs et des parties prenantes. - Formation de tout le personnel participant à l'inventaire des émissions de GES et fourniture de données et d'informations - Envois de courriers officiels et mails de rappel - Organisation de réunions et séances de travail restreintes et répétées avec chaque secteur - Jumeler les actions de renforcement des capacités avec les différentes étapes des travaux à réaliser - Mise en place d'une planification mensuelle des activités techniques avec des délais à respecter et des rencontres de coordination et d'appréciation de l'état d'avancement - Mise en place d'un système de validation des livrables au fur et à mesure de leur production de sorte que le produit final compilé soit à son tour automatiquement validé - Suivi par l'UGP de tous les groupes et experts pour mettre en œuvre les activités en temps voulu avec les livrables - Mise en place d'un tableau-de-bord de suivi des livrables - Rappels insistants pour la validation des livrables - Déplacement au niveau des secteurs ou organisation de réunion virtuelles pour faciliter la compréhension des travaux demandés. - La rédaction des rapports et leur compilation se font simultanément
Catégorie du risque : Moyen	
Evolution du risque : Atténuation *Catégorie de réponse* : Suivi périodique	
6/ Arrêt des activités du projet faute de DNP du projet désigné par le partenaire national *Date d'identification* : 04 juin 2025 *Date de mise à jour* : 31 octobre 2025 *Type de risque* : Opérationnel *Impact* : Majeur (4) *Probabilité* : Possible (5)	- Les Groupes thématiques sont constitués des cadres de tous les secteurs parties prenantes du projet. Ils sont les fournisseurs de données. - Contact permanent avec les points focaux du projet dans les secteurs. Ils ont pour rôle de faire le plaidoyer pour faciliter l'échange de données.
Catégorie du risque : Très élevé	
Evolution du risque : Atténuation	

Catégorie de réponse : Suivi périodique	- Sélection précoce et implication du personnel de tous les secteurs et des parties prenantes. - Formation de tout le personnel participant à l'inventaire des émissions de GES et fourniture de données et d'informations - Envois de courriers officiels et mails de rappel - Organisation de réunions et séances de travail restreintes et répétées avec chaque secteur - Jumeler les actions de renforcement des capacités avec les différentes étapes des travaux à réaliser - Mise en place d'une planification mensuelle des activités techniques avec des délais à respecter et des rencontres de coordination et d'appréciation de l'état d'avancement - Mise en place d'un système de validation des livrables au fur et à mesure de leur production de sorte que le produit final compilé soit à son tour automatiquement validé - Suivi par l'UGP de tous les groupes et experts pour mettre en œuvre les activités en temps voulu avec les livrables - Mise en place d'un tableau-de-bord de suivi des livrables - Rappels insistants pour la validation des livrables - Déplacement au niveau des secteurs ou organisation de réunion virtuelles pour faciliter la compréhension des travaux demandés. - La rédaction des rapports et leur compilation se font simultanément

Annexes

Annexe 1 :
