Informe cuatrimestral

Informe cuatrimestral del avance del proyecto

8va Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)

1004173

Contenido

1. Información básica del proyecto 2
2. Resumen del proyecto 4
3. Principales avances 6
   3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 7
   3.2 Aportes en gestión de conocimiento 8
4. Registro de desafíos y temas pendientes 10
5. Registro y gestión de riesgos 10
6. Información financiera del proyecto 13
7. Anexos 14
   Anexo 1. Portal de transparencia 14

Informe cuatrimestral

1. Información básica del proyecto

Número y título del Proyecto:	*Octava Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF SGP OP8- Proyecto en Quantum 1004173*
Fecha de firma del Proyecto:	*Junio 2024*
Fecha de inicio y término del Proyecto:	*01 julio 2024-30 junio 2028*
Período cubierto por este informe:	*Enero-abril 2026*
Fecha de entrega de este informe al PNUD:	*04 de mayo 2026*
Autor:	*Ariana Araujo Resenterra*
Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):	*Alineado con el Resultado 3: Adaptación al cambio climático y uso eficiente de los recursos de los ecosistemas. Para 2027, las personas, las comunidades y las instituciones mitigarán el cambio climático y se adaptarán a él, y harán un uso sostenible y eficiente de los recursos de los ecosistemas que conserve y prevenga la degradación de la naturaleza, detenga la contaminación y proteja el planeta. (Resultado 4.2 del Marco de Acción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible).* *Y el Producto 3.2: las instituciones del Gobierno central y local, la sociedad civil y el sector privado aumentaron su apoyo a las estrategias de adaptación basadas en los ecosistemas con una perspectiva de género y consolidaron la inclusión social.*
Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:	*El ProDoc global de la FO8 del PPD plantea los siguientes resultados:* *Resultado 1.1: Se fortalece un ambiente habilitador para enfoques integrados efectivos impulsados por las comunidades.* *Resultado 2.1: Se avanzan los objetivos estratégicos de paisajes-marinos mediante subvenciones lideradas por la comunidad.* *Resultado 3.1: Se mejora la sostenibilidad y el impacto de las acciones colectivas lideradas por la comunidad a través de la gestión del conocimiento y enfoques de aprendizaje en paisajes-marinos y regiones.* *Resultado 4.1: Se fortalecen la escala, la durabilidad y el impacto de la acción comunitaria liderada localmente mediante la supervisión, evaluación y el aprendizaje basado en evidencias.*
Asociado en la Implementación:	
Partes Responsables:	

Informe cuatrimestral

Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$:	*US$ 1 006 818 para grants* *US$ 29 471 operaciones 2026*
Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$:	*US$ 130 000 (asignados en Quantum proyecto 01 OP8 con CONAFLU)* *US$ 242 540 (comprometidos para grants)* *US$ 372 540 total comprometidos en grants fondos GEF (saldo en grants 901 433)* *No se han ejecutado fondos de operaciones a la fecha. Todo ha sido cubeirto por fondos COMDEKS desde UNOPS.*

Breve descripción del Proyecto

El PPD-OP8, a nivel global, se basa en 30 años de experiencia exitosa empoderando a OSC Organizaciones de la Sociedad Civil) y OCB (Organizaciones Comunitarias de Base) locales en iniciativas impulsadas por la comunidad que han mejorado el bienestar, aumentado la conciencia y la resiliencia, y generado beneficios ambientales globales. Con las crecientes presiones del desarrollo económico en el mundo en desarrollo y las desigualdades asociadas, las comunidades locales, especialmente los grupos vulnerables y desfavorecidos, se están viendo cada vez más marginadas.

El objetivo de la Parte 1 de PPD OP8 es involucrar a las OSC/OCB locales en enfoques de paisajes- marinos en los 99 países participantes, proporcionándoles acceso a conocimientos e información, capacitándolos mediante el aprendizaje práctico, desarrollo de habilidades, y brindando asistencia técnica y financiera para intervenciones que mejoren las condiciones socioeconómicas y generen beneficios ambientales globales. De acuerdo con el Documento de Arreglos de Implementación de GEF-8 SGP (PIMS), los recursos principales de PPD se asignarán equitativamente entre todos los países elegibles.

La estrategia propuesta, elaborada a través de cuatro resultados complementarios, refleja las características clave del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 2.0 del GEF, incluyendo nuevos enfoques para apoyar a jóvenes, mujeres y Pueblos Indígenas, vincularse con alianzas complementarias, cooperar con dos agencias adicionales del GEF y aprovechar oportunidades con otros programas del GEF. SGP-OP8 facilitará oportunidades para la innovación y la ampliación, catalizará alianzas entre múltiples partes interesadas y fomentará plataformas de diálogo para lograr un mayor impacto.

Una ventaja comparativa importante del SGP es su enfoque en la inclusión social y los grupos vulnerables, incluyendo mujeres, Pueblos Indígenas, personas con discapacidad, personas mayores y jóvenes. Los resultados esperados en la Parte 1 de OP8 incluyen:

225,000 hectáreas de tierra y ecosistemas en restauración,
3,800,000 hectáreas de paisajes con prácticas mejoradas,
90,000 hectáreas de áreas marinas protegidas bajo una gestión mejorada,
270,000 hectáreas de hábitats marinos con prácticas mejoradas,
y 500,000 beneficiarios directos, de los cuales 250,000 son mujeres.

2. Resumen del proyecto

Durante este período, se ha avanzado en aspectos significativos, que se enlistan abajo:

Convocatoria OP8 PDD y otros procesos de colocación de *grants*:

- Cierre de la convocatoria para acceder a fondos de la OP8 del PPD (finales de febrero 2026): es decir representa el arranque en la implementación oficial para ejecutar esta fase operativa.
- Se recibieron más de 30 propuestas, de las cuales solamente la mitad (aproximadamente) cumple con los criterios y requisitos mínimos para ser valoradas.
- Se revisaron, solicitaron ajustes y se enviaron al Comité Directivo Nacional un total de 3 propuestas.
- Una propuesta adicional (CONAFLU) ya había sido recibida y presentada al CDN, la cual fue aprobada, representando el primer proyecto dentro de la OP8.
- El CDN sesionó el día 20 de abril y aprobó 3 proyectos más: con el CINAT-UNA, el Liceo Rural de Isla Venado y la UCR, y FUNDECODES.
- El PPD recibió un fondo adicional por parte de COMDEKS dentro de la ejecución de la 4ta Fase. Por lo que se recibió y aprobó en la misma sesión del CDN un proyecto que complementa el trabajo que se está haciendo en Isla Chira, alrededor de la cadena de valor del mejillón.
- En este período, el CDN también aprobó el proyecto con LAST, en el marco de la convocatoria que se había lanzado con Costas Circulares para proyectos en gestión de residuos sólidos en costas. Este proyecto se ejecuta con fondos de INCOP y se encuentra en proceso de ingreso a los sistemas bajo un Low Value Grant.
- *Monto de la colocación:*
- US$ 130 000 (asignados en Quantum proyecto 01 OP8 con CONAFLU)
- US$ 242 540 (comprometidos para grants
- US$ 372 540 total comprometidos en grants fondos GEF (saldo en grants 901 433)

- *Sesiones CDN:* Durante este período se han realizado 3 sesiones del CDN (enero, marzo y mayo).

Proyectos PPD aprobados en este período

FONDOS GEF:

- *Agua y Territorios: Fortaleciendo la gobernanza comunitaria del agua y la resiliencia climática en Costa Rica.* Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones por el Ambiente, el Agua y la Salud de Costa Rica, mejor conocida como la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales de Costa Rica (CONAFLU). *Monto USD 130 000*
- *Adaptación climática de la infraestructura educativa y fortalecimiento del bienestar y desempeño estudiantil mediante estrategias bioclimáticas de bajo consumo energético: desarrollo de un modelo replicable a partir de un caso en contexto rural.* Junta Administrativa Telesecundaria Isla Venado (JATIV). Monto USD 69 900 (Fondos GEF)
- *Fortalecimiento integral de la apicultura tropical: capacitación técnica, equidad de género y conservación ambiental Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional (UNA).* Monto USD 97 640 (Fondos GEF).

- *Gobernanza marina participativa: implementación de un plan piloto para la gestión sostenible de ecosistemas marino-costeros.* Fundación para el Equilibrio entre la Conservación y el Desarrollo (FUNDECODES). Monto solicitado: USD 74 999 (Fondos GEF).

FONDOS COMDEKS

- *Fortalecimiento comunitario en inocuidad y procesamiento sanitario del cultivo marino de mejillón con bajo impacto ambiental.* Asociación Ecoturística La Amistad Isla Chira. Monto USD 49 999 (Fondos COMDEKS).

Fondos Costas Circulares-INCOP

- *Gestión comunitaria del manejo de los residuos sólidos y la conservación de ecosistemas marinos-costeros, como aportes a la reducción de la contaminación, bajo modelos de economía circular en el cantón de Puerto Jiménez*. Asociación Latin American Sea Turtles (Asociación LAST). Monto USD 44 000.

Alianzas estratégicas

El PPD ha avanzado significativamente en establecer alianzas estratégicas con otros proyectos de PNUD, del SNU y de la cooperación técnica:

- ONUDI: se gestionó una alianza para el apoyo del proceso de trazabilidad de la producción de mejillón en isla Chira. En concreto, esta agencia aportará alrededor de USD 10 000 para la contratación de una asistencia técnica especializada que acompañe al grupo (ASOCMEMA) en la trazabilidad de su sistema productivo.
- BIOFIN: PPD apoyó la gestión de NATURALIA de la mano con SINAC y BIOFIN en el corredor biológico Montes del Aguacate. La idea es articular los proyectos que el PPD pueda financiar en este territorio de la mano con el trabajo que se hará en conjunto con IMPACT Hub para la implementación de NATURALIA.
- FAO-Scala: a partir de una coordinación con Jairo Serna, se creó una alianza estratégica con FAO para que los proyectos que se apoyen desde PPD en temas de ganadería sostenible (NAMA), utilice la metodología de Doctoras del Suelo (para medición de la salud del suelo) y se generen datos clave para determinar los servicios ecosistémicos que brinda la reconversión de fincas ganaderas.
- CORFOGA: en línea con lo planteado anteriormente, se ha conversado con CORFOGA, para que las fincas ganaderas apoyadas por PPD puedan ser parte del proyecto de análisis con BOOMITRA para mediciones de CO2 en pasturas (suelos/pastos) y que en un futuro puedan acceder a recursos financieros por la compensación en servicios de captura en suelo.
- Costas Circulares: PPD abrió una convocatoria para que Costas Circulares pudiera hacer una convocatoria con fondos del INCOP para que organizaciones de base comunitaria pudieran presentar propuestas para ejecutar proyectos en gestión de residuos sólidos. Como se mencionó se aprobó un proyecto con LAST (Puerto Jiménez). Se llevará a cabo un estudio que analice las otras propuestas recibidas para valorar la factibilidad de plantear un proyecto conjunto para la zona de intervención del INCOP.

Actividades clave:

- Participación en lanzamiento NATURALIA (BIOFIN-SINAC-PNUD-PPD). PPD formó parte del consorcio que ejecuta NATURALIA, y se está articulando el apoyo de iniciativas y la implementación de acciones alrededor de la OP8 en la zona del CBMA, como parte de esta alianza estratégica.

- Reunión Global COMDEKS: La CN del PPD participará en la reunión global de COMDEKS (Fase 4) durante la segunda semana de mayo, a realizarse en Marruecos.
- Capacitación M&E PNUD: el equipo del PPD (CNA&PA) participó en la capacitación de 4 semanas que llevó a cabo la oficina alrededor de temas de M&E.

Administrativos

- Después de varios años del proceso de transición del sistema administrativo y operativo del PPD de UNOPS a PNUD, ya tanto al CN como la PA (equipo del PPD) cuenta con contratos PNUD y tiene acceso a Quantum con los permisos correspondientes para ejecutar la OP8. En el caso de la PA, la transición se dio a partir del mes de abril y el acceso al sistema se dio a finales de ese mes. Por lo que se puede decir que hasta ahora se tiene control sobre la ejecución de la OP8 bajo PNUD.
- El equipo está en proceso de ajuste de requisitos de Plan Financiero y del presupuesto. Pero ya se ha ingresado al sistema toda la información necesaria(con base en la información del PPD Global y de la que se envió para el caso de CR desde la sede), así como se refleja en el dashboard de transparencia.
- AWP presentado y aprobado.

Visitas de campo

- Gira Puntarenas: la CN participó en un evento estado que llevó a cabo el Programa Estado de la Nación: *Soluciones compartidas para ecosistemas compartidos: construyendo propuestas para la sostenibilidad marino-costera (realizado el 11 de febrero de 2026, en la UTN de Puntarenas).*
- Visita a Isla Chira como parte del seguimiento a la ejecución del proyecto de Mejillones, en Palito.

3. Principales avances

Esta sección responde a la pregunta sobre los principales resultados alcanzados por el proyecto. Incluye la valoración de las actividades, productos e indicadores definidos, destacando cambios transformacionales derivados de la implementación. Se revisan los avances en relación con el Plan de Trabajo Anual (POA/AWP). ***Se recomienda incorporar la matriz de indicadores del documento de proyecto con sus avances****, acompañada de observaciones o anotaciones explicativas sobre el progreso reportado.*

Indicadores	*Meta (final de periodo)*	*Avance*	*Observaciones*
Output 1: Se fortalece un ambiente habilitador para enfoques integrados efectivos impulsados por las comunidades.			
Cantidad de alianzas estratégicas.	Al menos 3 alianzas estratégicas	Superado: Se han establecido 5 alianzas estratégicas con resultados concretos (ver arriba)	
Cantidad de intervenciones en campo.	Al menos 4 actividades anuales	Se han ejecutado 2 giras en campo para dar seguimiento a los proyectos y posicionar al PPD como actor clave en otros espacios de contrapartes clave.	
Número de reuniones de acompañamiento con los grupos solicitantes y contrapartes estratégicas	Al menos 10 reuniones	Seguimiento bisemanal MAGMA (al menos 6 reuniones a la fecha)	

		Reuniones con contrapartes (al menos 1 reunión de seguimiento por proyecto y al menos 1 con contrapartes clave).	
Output 2: Se avanzan los objetivos estratégicos de paisajes-marinos mediante subvenciones lideradas por la comunidad.			
Cantidad de propuestas recibidas y revisadas.	Al menos 50 propuestas	Se han recibido por medio de todas las convocatorias 2026 38 propuestas para fondos GEF, y 9 para la convocatoria de Costas Circulares: 47 en total.	El proceso de revisión y ajuste de propuestas sigue en proceso.
Cantidad de propuestas aprobadas.	Al menos 20 propuestas	Se han aprobado 4 propuestas por parte del CDN.	
Cantidad de sesiones con el CDN.	Al menos 5 sesiones al año	Se han ejecutado 3 sesiones del CDN	Las sesiones dependen de la cantidad de propuestas lista para ser revisadas por el CDN.
Cantidad de proyectos estratégicos que brinden acompañamiento a los grupos.	Al menos 1 proyecto	A la fecha no se han lanzado los TdR para contar con un proyecto de esta naturaleza, ya que se requiere contar con los proyectos aprobados primero.	
Output 3: Se mejora la sostenibilidad y el impacto de las acciones colectivas lideradas por la comunidad a través de la gestión del conocimiento y enfoques de aprendizaje en paisajes-marinos y regiones.			
Número de productos de comunicación.	Al menos 1 por mes	Para el periodo que cubre este informe, se han publicado 16 productos de comunicación en las redes del PPD (Instagram y Facebook).	
Cantidad de productos de gestión del conocimiento.	Al menos 5 productos	Para el periodo que cubre este informe, se han generado 4 productos de gestión del conocimiento (Ver en tabla "3.2 Aportes en gestión del conocimiento").	
Número de eventos realizados.	Al menos 2 eventos	Para este periodo no se han realizado eventos.	
Output 4: Se fortalecen la escala, la durabilidad y el impacto de la acción comunitaria liderada localmente mediante la supervisión, evaluación y el aprendizaje basado en evidencias.			
Herramienta de monitoreo.	1 herramienta de monitoreo para PPD OP8	En proceso de elaboración con base el lineamientos e indicadores PPD Global y Estrategia PPD CR	
Número de reportes elaborados.	Al menos 2 reportes por proyecto	Se contará con estos informes una vez que los proyectos arranquen ejecución	

3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

El Plan de Acción de Género para la OP8 del PPD fue presentado en versión final a la OP de PNUD para su correspondiente revisión, desde setiembre 2025. Dado que para abril del 2026 no se había contado con una respuesta ni con insumos, se solicitó por parte de la Oficial de Naturaleza, Clima y Energía que esta revisión técnica la asumiera la Oficial de Género de Costas Circulares.

Más allá de este documento, desde la implementación de la OP8, se han revisado las propuestas de proyectos bajo un enfoque de género. Además, se está revisando una propuesta que buscan incidir en el apoyo específico a grupos de mujeres para que puedan acceder a asistencia técnica y fondos del Programa para desarrollar sus acciones vinculadas a los temas que apoya el Programa.

3.2 Aportes en gestión de conocimiento

Nombre del producto	*Descripción*	*Fecha de públicación*	*Enlace de publicación.*
Iniciativas COMDEKS del Programa de Pequeñas Donaciones Fortalecen La Economía Azul y La Economía Circular En Isla Chira	*Las iniciativas del PPD, apoyadas por el mecanismo COMDEKS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsan en Isla Chira proyectos comunitarios que integran la conservación marina con el desarrollo económico sostenible. Estas acciones combinan la* ***economía azul****, mediante la maricultura de mejillones, con la* ***economía circular****, enfocada en la recuperación y reciclaje de artes de pesca, promoviendo medios de vida locales y reduciendo la contaminación marina.*	*28 de enero del 2026*	*https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/iniciativas-comdeks-del-programa-de-pequenas-donaciones-fortalecen-la-economia-azul-y-la-economia-circular-en-isla*
Las pequeñas	*Publicación en SGP global*	*16 de enero 2026*	*Publicación PPD Global: La acción comunitaria fortalece la resiliencia y la biodiversidad en Costa Rica.*

subvenciones impulsan medios de vida verdes e inclusivos. La acción comunitaria fortalece la resiliencia y la biodiversidad en Costa Rica.	*sobre el trabajo con felinos en la Fase Operativa 7*		
"Hearding Big Cats: The only shots were photos". Cuento escrito por Ariana Araujo Resenterra	*Un cuento para niños basado en una experiencia real de un proyecto del PPD sobre monitoreo de felinos y depredación en ganadería.*	*Lanzamiento será el 6 de mayo 2026.*	*"Hearding Big Cats: The only shots were photos".*
Video del avance del proyecto de Monitoreo y Vigilancia de ASODEPU	*Video de Magma sobre el trabajo de ASODEPU, proyecto de fondos COMDEKS, el cual se basa en la vigilancia y monitoreo del AMPR 201, Bajos de yuca, Isla Chira,*	*No se ha publicado todavía, está en revisión de últimos detalles para pronto ser publicado.*	*https://drive.google.com/file/d/1oltaqHa02lfHpnxSYRBQW5ahN-f_fNW7/view*

4. Registro de desafíos y temas pendientes

Esta sección identifica las condiciones internas que afectan la implementación del proyecto, incluyendo desafíos, cuellos de botella, obstáculos y temas pendientes. Asimismo, describe las acciones tomadas o planificadas por el equipo para gestionar estos riesgos y asegurar una ejecución efectiva dentro del cronograma previsto.

Tema pendiente/ desafíos y/o problema	*Fecha de identificación*	*Medidas de manejo / posibles soluciones*	*Solicitud de apoyo a la Gerencia*
Implementación de PPD bajo LVG PNUD: no es un problema, pero es una consideración dado que el PPD lleva +30 años bajo implementación de UNOPS y ahora hay que migrar todos los procesos administrativos del Programa y los Proyectos a PNUD (Quantum)	Inicio OP8	-Capacitación continua (autoinducción) del equipo PPD a los sistemas de PNUD para implementar el programa y los LVG. -Comunicación con el equipo de apoyo de la OP relacionado con los procesos que implican implementar OP8 bajo PNUD. -Comunicación y participación en los webinars que realiza PPD Global y el grupo de CN de LAC-PPD.	-Seguir acompañando y dando gruías técnicas y operativas al equipo del PPD para poder implementar OP8, y apoyo de las personas involucradas a nivel de sistema para garantizar que se puedan ejecutar los LVG en Quantum (desde la firma de los MOA, hasta los desembolsos a contrapartes).

5. Registro y gestión de riesgos

Esta sección identifica, describe y analiza los riesgos externos al proyecto (políticos, sociales, ambientales, operacionales, regulatorios, entre otros) que hayan impactado los entregables o que hayan surgido durante el período. ***Los riesgos deben actualizarse, registrarse y monitorearse al menos dos veces al año en la plataforma Quantum****, detallando las acciones de gestión (mitigación, reducción de probabilidad o aprovechamiento como oportunidad). En caso de nuevos riesgos, deben incorporarse en el módulo* Projects – Risk Register *con toda la información requerida (adjuntar pantallazo en caso de agregar nuevos riegos). Asimismo, para los riesgos existentes se debe adjuntar un pantallazo del dashboard de riesgos que evidencie que la información está completa y que todos los riesgos cuentan con sus respectivos tratamientos.* Dashboard de Riesgos

Evento	*Causa*	*Impacto (s)*	*Categoría del riesgo*[1]*	*Impacto, probabilidad y nivel de riesgo***
Existe el riesgo de que los proyectos pueden conducir a situaciones de discriminación contra las mujeres debido a su género, especialmente en lo relacionado con la participación en el diseño, la implementación y el acceso a oportunidades y beneficios	Posibles consecuencias de normas culturales, roles tradicionales y barreras estructurales dentro de los grupos y organizaciones, que limitan la equidad de género y restringen la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.	Podría repercutir en una menor participación de las mujeres en talleres, reuniones y actividades de ejecución, reduciendo su acceso a beneficios y oportunidades del proyecto, debilitando la inclusión social y afectando la equidad en el desarrollo local.	1. Social y Ambiental (1.2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)

[1] *Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.
**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)

Existe el riesgo de que las actividades de los proyectos se desarrollan dentro de hábitats críticos y(o) zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y(o) pueblos indígenas o comunidades locales.	Algunas de las localidades en las que opera el PPD presentan una alta fragilidad ecológica y presión sobre los ecosistemas, lo que requiere una planificación y diseño cuidadoso para evitar impactos negativos.	Si las actividades no son planificadas e implementadas adecuadamente en su contexto social y ecológico, se pueden generar efectos adversos como la alteración de ecosistemas frágiles, pérdida de biodiversidad, afectación de medios de vida locales y conflictos socioambientales con las comunidades.	1. Social y Ambiental (1.4. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)
Existe el riesgo de que algunos proyectos incluyen actividades de productivas como casas sombra, reforestación o el desarrollo de plantaciones en territorios ambientalmente sensibles.	Estas actividades productivas pueden transformar el paisaje natural, ejercer presión sobre los recursos del entorno y generar conflictos por el acceso a la tierra o por una distribución desigual de los beneficios derivados de los proyectos.	Si no se gestionan adecuadamente, estas transformaciones pueden provocar degradación ecológica, pérdida de biodiversidad y conflictos con comunidades locales o pueblos indígenas. Todo ello puede afectar la sostenibilidad de los medios de vida, la conservación del territorio y los objetivos ambientales de los proyectos.	1. Social y Ambiental (1.5. Cambio climático y desastres) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)
Existe el riesgo de que algunos proyectos se desarrollen en zonas vulnerables a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, marejadas, tsunamis y erupciones volcánicas.	Algunas posibles áreas de intervención o influencia de los proyectos se ubican en territorios con alta exposición a amenazas naturales y condiciones geográficas o climáticas inestables.	Estos eventos pueden causar daños directos a la infraestructura y al entorno natural, afectando ecosistemas sensibles y comunidades locales. Se pueden generar pérdidas de hábitats críticos, degradación de recursos naturales y afectación de medios de vida, provocando desplazamientos y un aumento de la vulnerabilidad económica y social, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Además, pueden interrumpir la continuidad y sostenibilidad de los proyectos.	1. Social y Ambiental (1.5. Cambio climático y desastres) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)
Existe el riesgo de que los proyectos productivos desarrollados en las zonas de intervención	Como consecuencia de las condiciones climáticas cambiantes derivados del cambio climático, incluyendo el aumento de las	Estas condiciones pueden generar estrés en los sistemas productivos, afectando la calidad, cantidad y viabilidad de los productos, así como los	1. Social y Ambiental (1.5. Cambio climático y desastres) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor

cuenten con productos y resultados que son sensibles o vulnerables a los impactos del cambio climático, tales como el aumento de las precipitaciones, sequías, variaciones de temperatura, incremento de la salinidad y eventos climáticos extremos.	precipitaciones, las sequías, las variaciones de temperatura, el incremento de la salinidad y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, que afectan directamente los sistemas productivos	procesos asociados a su producción. Esto reduce los ingresos y la seguridad alimentaria, aumentando la vulnerabilidad de pequeños productores y comunidades indígenas, y poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades.		Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)
La presencia de pueblos indígenas en las áreas de intervención o influencia de los proyectos puede generar riesgos si no se incorpora un enfoque intercultural adecuado en la formulación, ni se garantiza la consulta previa, libre e informada.	Algunas de las áreas de intervención o influencia de los posibles proyectos se pueden traslapar con territorios indígenas y no se aplican mecanismos adecuados de consulta, participación y enfoque intercultural en las etapas de diseño e implementación.	Podría acarrear conflictos socioterritoriales, afectar la cohesión social y las estructuras comunitarias, invisibilizar conocimientos y prácticas tradicionales, intervenir territorios manejados de forma sostenible por las comunidades y alterar ecosistemas valiosos. Además, la falta de consentimiento puede causar oposición al proyecto, retrasos en su ejecución y afectación de actividades productivas locales que dependen del uso tradicional de los recursos naturales.	1. Social y Ambiental (1.9 Derechos de los pueblos indígenas) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)
Existe el riesgo de que la ejecución de actividades en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas represente una amenaza significativa si no se reconoce y respeta el proceso de reclamación territorial.	Vinculado a la posible falta de un enfoque adecuado que contemple los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como la ausencia de mecanismos de diálogo, reconocimiento y coordinación con las comunidades involucradas.	Desde el punto de vista social, puede generar tensiones, conflictos legales, pérdida de legitimidad del proyecto y resistencia comunitaria. En el ámbito ambiental, podría conllevar la alteración de territorios tradicionalmente gestionados de forma sostenible, y en el plano económico, ocasionar demoras, sobrecostos o incluso la suspensión de actividades.	1. Social y Ambiental (1.9 Derechos de los pueblos indígenas) UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 – Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)

Informe cuatrimestral


6. Información financiera del proyecto

Actividad/componente	Monto Total Aprobado en el AWP	Gasto en el Período del informe				Gasto Total ejecutado hasta la fecha	% de ejecución
		I	II	III	IV		
Grants	1 006 818					130 000 adjudicados 372 540 total comprometidos en grants fondos GEF (saldo en grants 901 433)	No hay desembolsos a proyectos como tal a nivel de sistema, pero un 37% ya está comprometido
Total Gastos Operativos	29 471 79						No se han ejecutado fondos operativos, ya que a la fecha lo ha cubierto COMDEKS desde UNOPS
Total							

¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?	Si ( ) No (x) Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: _____

7. Anexos

Anexo 1. Portal de transparencia

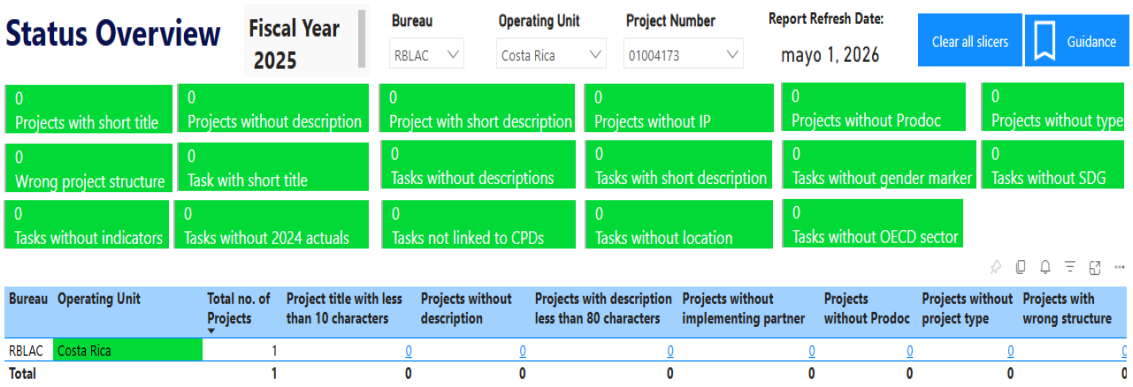

Bureau	Operating Unit	Total no. of Projects	Project title with less than 10 characters	Projects without description	Projects with description less than 80 characters	Projects without implementing partner	Projects without Prodoc	Projects without project type	Projects with wrong structure
RBLAC	Costa Rica	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
