



INFORME DE PROGRESO - PROYECTO:  
REAFIRMANDO GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO  
AGOSTO 2021 – DICIEMBRE 2022



Fecha de elaboración: 23 de mayo 2023

## Tabla de contenidos

1	CONTEXTO GENERAL .....	3
1.1	PERFIL DEL PROYECTO .....	3
2	DATOS FINANCIEROS .....	3
3	ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.....	4
3.1	CONTEXTO LOCAL .....	4
3.2	OBJETIVOS.....	5
3.3	RESULTADOS Y PRODUCTOS.....	6
4	PROGRESO HASTA LA FECHA .....	6
4.1	ANALISIS DE LOS PROGRESOS REALIZADOS SEGUN LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS PREVISTOS .....	6
4.2	ANALISIS DE LOS PROGRESOS REALIZADOS SEGUN LOS INDICADORES DEL PROYECTO .....	7
4.3	ANALISIS DE RIESGOS.....	12
4.4	LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS .....	113
4.5	SOSTENIBILIDAD .....	14
5	PROXIMAS ACCIONES .....	14
6	ANALISIS DE PRESUPUESTO .....	16
7	ANEXOS – Matriz de indicadores y Medios de verificación.....	18

## 1 CONTEXTO GENERAL

### 1.1 PERFIL DEL PROYECTO

<b>País:</b>	Guatemala
<b>Código del proyecto:</b>	00134407
<b>Título del proyecto:</b>	Reafirmando garantías de no repetición para la paz y el desarrollo
<b>Donantes:</b>	Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo -ACCD-, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo – AVCD- y Cooperación Suiza
<b>Periodo al que se refiere el informe:</b>	De agosto 2021 a diciembre 2022
<b>Fecha de inicio del proyecto:</b>	1 de agosto de 2021
<b>Fecha de fin del proyecto:</b>	30 de septiembre de 2023

<b>Contribución al Marco Programático de País</b>	
<b>ODS</b>	5 – Igualdad de género, 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas y 17 – Alianzas para lograr los objetivos.
<b>Resultados del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025</b>	Efecto MECNUD para 2025, las instituciones del Estado mejorarán la gobernanza democrática, la gestión de recursos eficiente y transparente y la toma de decisiones con base empírica, incluido el uso de la información y las tecnologías de la comunicación.
<b>Resultado del Programa de País del PNUD</b>	Las instituciones de seguridad, justicia y paz tienen la capacidad, las herramientas y las tecnologías innovadoras necesarias para ofrecer una justicia transparente, transformadora y eficiente.

## 2 DATOS FINANCIEROS

<b>Presupuesto:</b> USD 904,076.49
<b>Suma ejecutada:</b> USD 550,009.09 <b>Por ejecutar:</b> USD 354,067.40

### 3 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

#### 3.1 CONTEXTO LOCAL

El proyecto *Reafirmando garantías de no repetición para la paz y el desarrollo* cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo -ACCD-, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo -AVCD-, y de la cooperación de Suiza; comprende tres Ejes de trabajo: 1) Fortalecimiento de la participación ciudadana de las juventudes; 2) Promoción de los archivos históricos como patrimonio único e insustituible y 3) Empoderamiento de las mujeres y de las juventudes como actoras y protagonistas de los procesos de justicia de transición para la transformación social. Se diseñó con el objetivo de ampliar el alcance de los procesos de empoderamiento de las juventudes a través del fortalecimiento de la participación y capacidad de incidencia en los procesos políticos y de toma de decisiones; en el impulso de procesos de memoria histórica y desarrollo sostenible y en la promoción de alianza con instituciones estatales y actores clave de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Guatemala. Así como, ampliar el conocimiento y compromiso de la sociedad guatemalteca con la conservación y preservación del Archivo Histórico de la Policía Nacional -AHPN- como fuente fundamental para la recuperación de la memoria histórica del país y contribuir al fortalecimiento de la participación y los espacios de acción de las mujeres sobrevivientes en el territorio priorizado, aumentando sus capacidades de agencia individual y colectiva, revitalizando su rol como promotoras de la justicia, la cohesión social comunitaria y la paz.

En una primera fase, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo -ACCD- implementado de agosto 2021 a septiembre 2022, apoyó el Eje 1, se llevaron a cabo procesos de formación ciudadana y de empoderamiento de las juventudes para fomentar actitudes, habilidades y comportamientos que les permitan ejercer una ciudadanía responsable, comprometida con la paz, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y respetuosa de la diversidad étnico-cultural del país. Se promovieron espacios y encuentros intergeneracionales entre jóvenes, líderes comunitarios y autoridades locales para el intercambio de experiencias y visiones sobre temas clave para la paz y el desarrollo de los municipios de Cobán y San Pedro Carchá de Alta Verapaz, se planteó beneficiar directamente alrededor de 100 jóvenes entre 16 y 29 años, en su mayoría indígenas (80%), mujeres (60%) y hombres (40%). Asimismo, el proyecto facilitó procesos de formación técnica y especializada para las y los jóvenes en: turismo comunitario y local, periodismo comunitario, aviturismo, uso de las TICS, Esteticismo, en preparación de café y catación y emprendedurismo social.

También, dentro del mismo Eje apoyado por ACCD, es importante mencionar que, debido a dificultades para lograr la aprobación oficial por parte del Ministerio de Cultura y Deportes para llevar a cabo las actividades orientadas al “fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos para la gestión pública eficiente y sostenible de los archivos estatales como patrimonio documental fundamental para la memoria histórica”, se aprobó mediante revisión sustantiva de agosto 2022 el cierre del *Output 00127934* y la reasignación de los fondos al *Output 00125998* dirigido a fortalecer el trabajo con la juventud. Además, por atrasos que se fueron dando en la implementación del proyecto se obtuvo la aprobación del donante para la extensión sin costo por dos meses más la vigencia de proyecto, finalizando en septiembre de 2022.

En el último trimestre de 2022 la ACCD dio inicio a una segunda fase del apoyo, para un periodo de un año comprendido de octubre 2022 a septiembre de 2023, en el marco de este apoyo se amplió la cobertura a otras regiones de Huehuetenango, Quiché y Guatemala.

El Eje 2 del proyecto, contó con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) para *fortalecer el proceso de conservación, protección y gestión pública eficiente y sostenible del Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional (FDaAHPN)*, por un periodo inicialmente aprobado de octubre 2021 a septiembre 2022; sin embargo, la decisión del Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) cambió en los últimos meses de 2021 e inicios de 2022 dado que el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural priorizó el fortalecimiento de aspectos relativos a infraestructura de la Dirección de Patrimonio Documental y Bibliográfico, no contemplaba las necesidades específicas vinculadas al proceso de conservación y gestión pública eficiente y sostenible del Archivo Histórico de la Policía Nacional, esto conllevó a que PNUD solicitara a AVCD la readequación sustantiva y presupuestaria del proyecto y la ampliación de tiempo sin costo; en la Junta de Proyecto realizada el 28 de septiembre de 2022 se aprobó la extensión de la vigencia del proyecto al 31 de marzo de 2023. Con la readequación del proyecto se aprobó fortalecer el objetivo relacionado a *fomentar la promoción de los archivos históricos como patrimonio único e insustituible, junto con su utilidad y los servicios que ofrecen en beneficio de la sociedad en general al salvaguardar y contribuir a la memoria individual y colectiva*, para implementar iniciativas de promoción de los archivos como patrimonio cultural y como herramienta para el fortalecimiento de la memoria histórica.

Adicionalmente, el Eje 3 del proyecto con apoyo de la cooperación Suiza, para el periodo de octubre 2021 a septiembre 2022, se trabajó desde una estrategia orientada a reafirmar y sostener los esfuerzos alcanzados en las garantías de no repetición mediante la promoción de la memoria histórica, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las juventudes como actrices y protagonistas de los procesos de justicia de transición para la transformación social, se contribuyó a los resultados planteados en los componentes apoyados por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD), enfocado al fortalecimiento de la participación y de los espacios de acción de las mujeres sobrevivientes de Cobán y Panzós de Alta Verapaz, aumentado sus capacidades de agencia individual y colectiva, revitalizando su rol como promotoras de la justicia, la cohesión social comunitaria y la paz, fortaleciendo a los funcionarios/as que deben prestar este servicio y habilitando entornos protectores para las mujeres y que permitan el ejercicio de su liderazgo como constructoras de paz.

Durante el periodo que comprende este informe, la implementación del proyecto se realizó en un área geográfica cuyos índices de contagio por COVID-19 se mantenían, e incluso aumentaban por temporadas, esto constituyó un riesgo para el desarrollo de los procesos impulsados por el proyecto, obligó a atender y cumplir con los protocolos de prevención establecidos gubernamentalmente, lo cual generó algunos atrasos, dado que se exigía el cumplimiento de las medidas sanitarias en espacios donde se llevaron a cabo las distintas actividades; sin embargo, no afectó el avance y alcance de los resultados del proyecto.

### **3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO**

Ampliar el alcance de los procesos de empoderamiento de las juventudes a través del fortalecimiento de la participación y capacidad de incidencia en los procesos políticos y de toma de decisiones; en el impulso de procesos de memoria histórica y desarrollo sostenible y en la promoción de alianza con instituciones estatales y actores clave de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Guatemala. Así como, ampliar el conocimiento y compromiso de la sociedad guatemalteca con la conservación y preservación del Archivo Histórico de la Policía Nacional -AHPN- como fuente fundamental para la recuperación de la memoria histórica del país y contribuir al fortalecimiento de la participación y los espacios de

acción de las mujeres sobrevivientes en el territorio priorizado, aumentado sus capacidades de agencia individual y colectiva, revitalizando su rol como promotoras de la justicia, la cohesión social comunitaria y la paz.

### **3.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS**

A continuación se enuncian los productos previstos en el proyecto:

- 3.3.1** Jóvenes de los municipios priorizados con capacidades fortalecidas, participan e inciden en espacios para la promoción de la cultura de paz, el rescate de la memoria histórica y el impulso del desarrollo.
- 3.3.2** Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional fortalecido con la implementación de nuevas tecnologías informáticas y estrategias innovadoras para la preservación del patrimonio documental y la promoción de la memoria histórica.
- 3.3.3** Se ha fortalecido la participación de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al enfrentamiento armado interno (EAI), en procesos de justicia y paz, mediante la prestación de servicios inclusivos de atención psicosocial, redes de apoyo comunitario y capacitación a técnicos y especialistas que participan en procesos judiciales de violaciones a derechos humanos durante el EAI.

## **4 PROGRESO HASTA LA FECHA**

### **4.1 ANALISIS DE LOS PROGRESOS REALIZADOS SEGUN LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS PREVISTOS**

El proyecto contribuyó al empoderamiento de las juventudes a través del fortalecimiento de la participación y capacidad de incidencia en los procesos políticos y de toma de decisiones; en el impulso de procesos de memoria histórica y desarrollo sostenible y en la promoción de alianza con instituciones estatales y actores clave de los municipios priorizados de Alta Verapaz, en total 192 jóvenes participaron en los procesos llevados a cabo durante el periodo del reporte, de este total el 78% pertenecen a pueblos indígenas, la mayoría maya Q'eqchi' y 22% no indígenas; 119 mujeres (62%) y 74 hombres (38%). La participación en procesos de fortalecimiento de capacidades, generó compromisos de las y los jóvenes en su propia formación y en trasladar y apoyar a otros jóvenes de sus comunidades.

También, se apoyó el desarrollo de una estrategia de atención psicosocial de manera presencial y remota, dirigido a 47 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el enfrentamiento armado interno (EAI) de comunidades de Cobán y Panzós del departamento de Alta Verapaz. Con los servicios de atención psicosocial las mujeres se sintieron acompañadas en sus procesos de reconocimiento de las violaciones a derechos humanos de las cuales fueron objeto; el grupo de mujeres puede expresar su historia de vida como muestra de un testimonio real de injusticia e indignación, pero también de sus capacidades y afrontamientos para estar vivas y colaborar con su reconstrucción como sobrevivientes. Se reconocieron como mujeres sobrevivientes para brindarle fuerza a quien

nunca había hablado de su historia y dolor. Se reconocieron como mujeres hijas de la madre tierra, en su cuidado y defensa de su cuerpo y territorio.

#### **4.2 ANALISIS DE LOS PROGRESOS REALIZADOS SEGUN LOS INDICADORES DEL PROYECTO**

El proyecto contempló 3 Ejes de Trabajo con sus correspondientes resultados e indicadores, cuyos avances y logros se presentan a continuación:

##### ***A. Eje de trabajo 1. Fortalecimiento de la participación ciudadana de las juventudes.***

#### **4.2.1 Fortalecidas las capacidades de liderazgo de jóvenes entre 16 y 29 años en Cobán y San Pedro Carchá, como agentes de cambio en los procesos de construcción de paz y desarrollo sostenible.**

Se contribuyó en el fortalecimiento de las capacidades de 76 jóvenes muy cerca del alcance del indicador propuesto de 80 jóvenes (44 fueron mujeres y 32 hombres), el 50% de pueblos indígenas, quienes participaron en la construcción de agendas enfocadas en la paz y el desarrollo sostenible. Se realizaron consultas con jóvenes líderes, y entrevistas con actores clave a nivel local incluyendo representantes de COCODE, CONJUVE, y Municipalidades de Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Cabe destacar que las entrevistas con los actores clave fueron lideradas por los jóvenes. Entre las prioridades identificadas por los jóvenes: La corrupción, falta de educación sexual y reproductiva, embarazos tempranos, falta de empleo, entre otros.

Se pudo establecer mediante una encuesta un promedio mayor del grado de empoderamiento (4) de la juventud que participó en este proceso, superando el indicador propuesto de un nivel 3 de grado de empoderamiento, lo cual se refleja en las 6 iniciativas innovadoras que se codiseñaron, a través de jornadas de capacitación y desenvolvimiento en la definición de soluciones con más de 40 jóvenes de Cobán y San Pedro Carcha. De estas 6, fueron seleccionadas 3 para fortalecer las ideas de los jóvenes en una siguiente fase del proyecto; esto conlleva a que el indicador establecido de 4, fue superado, se codiseñaron 6 iniciativas.

El proyecto realizó la actualización del análisis de contexto sobre las principales problemáticas que afectan a las juventudes en los territorios priorizados, tomando en cuenta su perspectiva; los resultados fueron socializados con la juventud participante del proyecto, actores clave y representante de ACCD. Con dicho análisis se concluyó, que la situación de la juventud de Cobán es heterogénea, así como sus problemas y circunstancias en el área urbana y rural. En general, la mayoría de la juventud del municipio de Cobán se enfrenta a una situación de pobreza y pobreza extrema y por tanto a una serie de dificultades para desarrollarse exitosamente y ejercer su ciudadanía a plenitud. En el caso del municipio de San Pedro Carchá tiene una población joven, el 29% se encuentra entre los rangos de edad de 15 a 29 años. Durante los últimos años el municipio de San Pedro Carchá ha enfrentado amenazas por desastres naturales y altos índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición crónica, situación que limita el desarrollo humano integral de la juventud.

Por otro lado, PNUD y la OACNUDH en alianza con la Asociación Civil Paz Joven Guatemala, llevaron a cabo el encuentro juvenil interdepartamental en el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada en el Memorial de las Víctimas de Desaparición Forzada

“Paisajes de la Memoria”, ubicado en San Juan Comalapa, Chimaltenango, donde descansan los restos de alrededor de 170 víctimas, este lugar es reconocido por su importancia en el conocimiento de la verdad y la consolidación de la paz. Se propició un espacio de diálogo y reflexión entre diferentes generaciones de víctimas y jóvenes a través de la expresión artística desde la participación de jóvenes del país a lo largo de la historia, la memoria sobre los hechos del conflicto armado interno y el rol de las personas jóvenes en la consolidación de la paz en Guatemala.


Los encuentros intergeneracionales fueron importantes para el intercambio de experiencias y desarrollar miradas con perspectivas diversas sobre los problemas y las soluciones que pueden proponerse para las comunidades, así mismo se logró consolidar el pensamiento crítico, suprimir obstáculos de la separación entre generaciones, entender y respetar distintos modos de concebir la participación y organización juvenil y favorecer el acercamiento de posturas a pesar de las diferencias de edades.

#### **4.2.2 Fortalecidas las capacidades técnicas de jóvenes entre 18 y 29 años de Cobán y San Pedro Carchá en áreas de emprendedurismo social para el desarrollo comunitario**

El indicador establecido de 80 jóvenes tuvo un alcance superior, se logró un total 117 jóvenes de los municipios de Cobán y San Pedro Carchá quienes finalizaron los 8 cursos técnicos. Las participantes fueron mayoritariamente mujeres 75 mujeres (64%) y 42 hombres (36%) y el 77% se autoidentificaron de pueblos indígenas.

Los procesos de capacitación técnica, según el informe de sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto, fueron valorados por la juventud beneficiaria como “altamente exitosos”, ofrecieron cinco especializaciones certificadas por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP-, también, dos de estos cursos fueron certificados por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-; instalaron capacidades a los y las participantes y ampliaron sus posibilidades para la inserción laboral, los cursos realizados por el INTECAP fueron: Guía comunitario de turistas, Guía local de turistas, Operador de computadoras (dos grupos de jóvenes) y Esteticismo; la organización Love Global Mission apoyó el curso de Preparación de café y catación; la Agencia Ocote tuvo a su cargo el de Periodismo Comunitario y Sociedad para la Vida Silvestre -WCS- por sus siglas en inglés, implementó el curso de Aviturismo. A continuación, se puede apreciar la participación de la juventud en los distintos cursos.



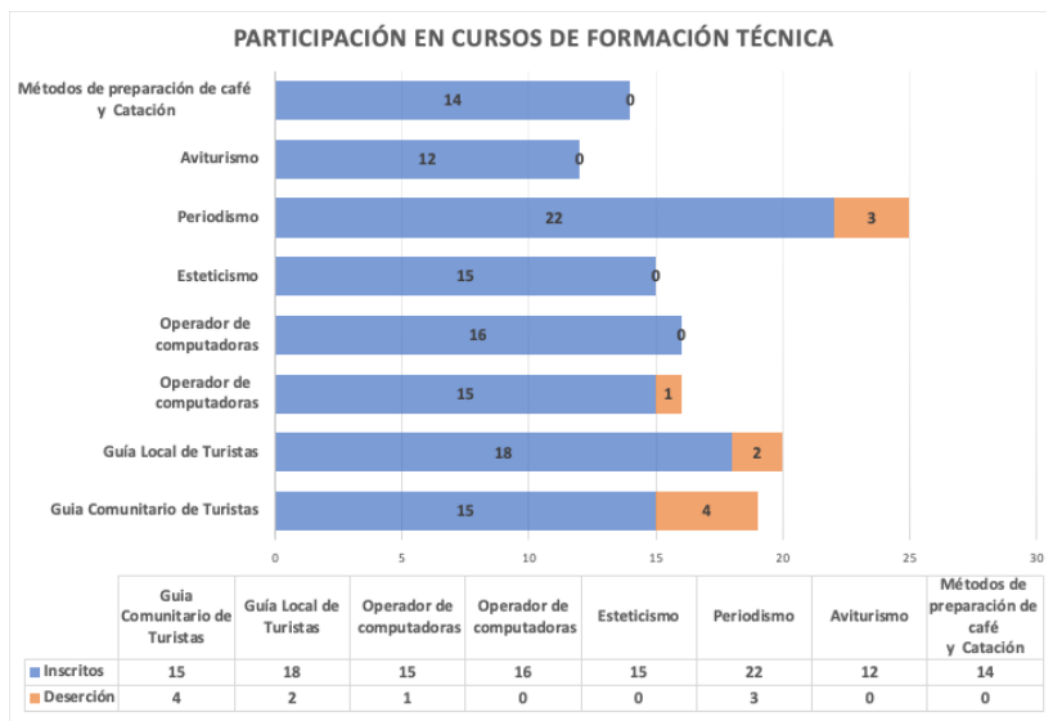

Fuente: Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto.

Asimismo, resultado de la encuesta aplicada a la población participante de los cursos de formación técnica se determinó el alcance del indicador de un nivel 3 establecido, a un 3.5 del promedio de grado de satisfacción en los cursos, la juventud mostró alto grado de satisfacción por los aprendizajes y experiencias durante los procesos formativos.

#### **4.2.3 Generadas alianzas estratégicas para fortalecer el diseño y la implementación de iniciativas orientadas a promover oportunidades de participación y desarrollo de las juventudes en los municipios priorizados.**

Durante la implementación del proyecto, la promoción y establecimiento de alianzas estratégicas fue transversal, aportaron tanto al proceso de formación de liderazgo juvenil, como a las capacitaciones técnicas; se crearon y consolidaron alianzas con las Oficinas Municipales de la Juventud, INTECAP, INGUAT y la Cooperativa de Samac. Se alcanzó el indicador de tres alianzas propuestas para este resultado. De la misma manera, se elaboraron tres propuestas de iniciativas las cuales serán fortalecidas en la fase II del apoyo de la ACCD por medio de un proceso de capacitación a los jóvenes de los tres grupos que las conforman. Las iniciativas juveniles se enfocan en: Recuperación de la Memoria Histórica (Somos Imagen de Nuestra Historia), Construcción de una ciudadanía democrática y liderazgo (Juventud Polinizadora) y Alianzas para el desarrollo comunitario (Radio Kemok).

#### **B. Eje 2 de Trabajo. Promoción de los archivos históricos como patrimonio único e insustituible**

Como se describió en el apartado de antecedentes, la implementación de este eje tuvo retrasos; sin embargo, una vez se contó con la aprobación de la readecuación sustantiva y financiera por

parte del donante, en el último trimestre de 2022 se prepararon las condiciones para el alcance del resultado establecido.

**4.2.4 Se han diseñado estrategias y espacios de promoción de los archivos como patrimonio único e insustituible y como herramientas para el fortalecimiento de la memoria histórica.**

Se inició con el proceso de contratación del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS), con el propósito de desarrollar el diplomado sobre Memoria y Archivos como bases para la promoción y defensa de derechos humanos, formación especializada para promover el uso del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en espacios educativos formales e informales, dirigido a 30 profesionales y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que cuenten con herramientas conceptuales y metodológicas que les faciliten el conocimiento, acceso y uso de los archivos en la búsqueda de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, haciendo especial énfasis en el valor histórico y documental AHPN.

Además, se logró formalizar una enmienda al Acuerdo de Subvención de Bajo Valor con la Asociación Civil Paz Joven Guatemala -socia del proyecto- para que 100 jóvenes puedan conocer el contenido y valor de los archivos, en especial del AHPN, como un paso esencial para la no-repetición y para asegurar el cuidado y salvaguarda del patrimonio documental de generación en generación.

Por otro lado, se identificaron proveedores para el diseño y realización de 12 materiales y recursos didácticos para las juventudes y docentes sobre la importancia del uso de los archivos en la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica, enfatizando en el Archivo Histórico de la Policía Nacional.

***C. Eje 3 de Trabajo. Empoderamiento de las mujeres y de las juventudes como actoras y protagonistas de los procesos de justicia de transición para la transformación social.***

**4.2.5 Mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI que participan en procesos de justicia, cuentan con acceso a servicios de atención psicosocial adaptados culturalmente para fortalecer su bienestar desde la esfera individual, familiar y comunitaria.**

En alianza con el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), se implementó la estrategia de atención psicosocial remota en un 100%, fue dirigido a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el enfrentamiento armado interno (EAI). Las mujeres se sintieron acompañadas en sus procesos de reconocimiento de las violaciones a derechos humanos de las cuales fueron objeto.

47 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI, quienes participan en procesos de justicia, recibieron servicios de atención psicosocial presencial y remota proporcionados por el proyecto, el indicador del número de 45 mujeres establecido previamente fue superado. A través del proceso del acompañamiento psicosocial y las metodologías creadas y creativas desde sus contextos, las mujeres lograron construir acuerdos y propuestas colectivas

para transmisión intergeneracional de la memoria histórica y la divulgación de sus historias de vida para exigir justicia y la concientización de sus derechos.

Además, por medio de una encuesta aplicada al grupo de mujeres se estableció el alcance del indicador de un nivel 3 establecido, a un 3.5 del promedio de grado de satisfacción del grupo de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el EAI con el acompañamiento psicosocial brindado por el ECAP.

#### **4.2.6 Se han promovido espacios intergeneracionales orientados a transformar relaciones para la no-repetición de la violencia, tejer redes de apoyo para las mujeres en sus procesos de búsqueda de justicia y para la cohesión social comunitaria.**

Durante la implementación del proyecto se logró el indicador previsto de 6 diálogos intergeneracionales, promovidos para reforzar las redes de apoyo intracomunitarias para la no-repetición de la violencia y la cohesión social. Se creó un grupo diverso, hijas e hijos, nietos y nietas de sobrevivientes del EAI y de defensores del territorio, quienes además, han manifestado deseo de intercambiar conocimientos y experiencias con otros grupos de jóvenes, líderes y representantes de otros territorios y luchas sociales. Estos diálogos también buscan construir colectivamente entre mujeres y jóvenes acciones que evidencien la memoria histórica, la prevención de la violencia contra la mujer, la justicia y la transformación social.

El grupo de 48 jóvenes (71% mujeres y 29% de hombres) al escuchar desde las voces de las mujeres su historia, generaron sentimientos de empatía y mostraron buena recepción alrededor de la información recibida la cual los llevó a analizar los sucesos y elaboraron de manera conjunta propuestas a ejecutar desde sus miradas. Crearon propuestas en conjunto tanto con las mujeres y las/os jóvenes, durante el festival *Denunciar y Justicia Real, para florecer desde la libertad* que llevaron a cabo, se formaron 4 estaciones para la reconstrucción de la memoria histórica y la socialización de sus historias de vida, desde los procesos de prevención de la violencia sexual a mujeres del EAI y formas de denuncia, en donde las y los jóvenes se pudieron integrar en 4 módulos de trabajo y análisis reflexivo desde la historia de presidencias militares, reflexión o testimonios sobre los hechos de violencia, módulo reflexivo sobre propuestas de seguimiento y un último módulo de juego con imágenes sobre acciones de violencia. Las y los jóvenes conocieron desde las voces de las mujeres la historia del pasado reciente en Guatemala y eso hace que ellos agradezcan la lucha, el traslado de la memoria porque son historias escondidas y que se desconoce.

Adicionalmente, las mujeres y jóvenes lideraron tres acciones para la promoción del buen vivir y la cohesión social comunitaria basada en el respeto y la igualdad de derechos: a) Abordar la violencia sexual a través del análisis del contexto histórico en que se dieron; b) Realizar denuncia pública de la violencia sexual en contra de los cuerpos de las mujeres durante el EAI, a través del arte y c) Mantener la divulgación de lo ocurrido con las mujeres durante el EAI.

Frases o expresiones relevantes de mujeres y jóvenes participantes en los procesos:

#### **Mujeres:**

"A nosotras las mujeres nos enseñaron con la violencia, pero hoy a los jóvenes les vamos a enseñar nuestra historia con el amor y la verdad".

"Defender mi cuerpo como territorio fue la lucha más fuerte... mía y de muchas mujeres más".

"La violencia no va a acabar, hasta que la ley sea justa con los pueblos indígenas".

**Jóvenes:**

"Nosotros los jóvenes somos el futuro para seguir cuidando la herencia de nuestros abuelos".

"mi mirada cambió al ver las cosas reales y quiero seguir apoyando a mi tierra".

"Siento mucho miedo al darme cuenta de lo que pasa en mi pueblo, pero eso me va a ayudar a enseñar de la historia a otros jóvenes".

**4.2.7 Operadoras/es de justicia y equipos interdisciplinarios cuentan con herramientas y capacidades para la investigación y persecución penal de delitos de violencia sexual contra mujeres indígenas, desde un enfoque de género e intercultural.**

El proyecto llevó a cabo el 100% de un proceso de formación sobre el Protocolo de Estambul, el cual se desarrolló con la participación de 46 profesionales entre fiscales, querellantes, psicólogos/as, promotores/as en salud mental, médicas/os y forenses, quienes incrementaron sus conocimientos sobre la aplicación del protocolo como una herramienta para la atención adecuada de familiares de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI y en particular de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género.

**4.3 ANALISIS DE RIESGOS**

Riesgos identificados	Acciones de mitigación
Poca participación de autoridades municipales y representantes de organizaciones en actividades del proyecto.	Se realizaron reuniones con las municipalidades de Cobán, San Pedro Carchá y Rabinal, a quienes se les presentó e invitó a formar parte del proceso.
Conflictividad social que afecta la movilización y desarrollo de las actividades del proyecto.	Se han identificado espacios seguros para realizar las actividades. No se ha presentado ningún inconveniente.
Deserción de las y los participantes en los procesos de formación y capacitación técnica.	La participación de los jóvenes ha sido constante, aunque han existido algunos casos de deserción. Las organizaciones que llevan los procesos realizan acciones de comunicación y seguimiento a las y los participantes de los procesos.
Ataques o represalias a personal del proyecto por comunicar temas de la memoria histórica.	Se han realizado coordinaciones con organizaciones y líderes a nivel comunitario. No se ha presentado ningún inconveniente.
Modificación de marcos jurídicos, normativas y reglamentos que limiten el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones de pueblos indígenas y jóvenes.	Se ha acompañado a las organizaciones de sociedad civil durante el proyecto para que cumplan con las disposiciones que se les requieran en los marcos normativos.
Adaptación a la nueva normalidad causada por la pandemia por COVID -19, implica estar en una constante innovación para responder adecuadamente.	Se desarrollaron procesos virtuales y de atención telefónica, según las recomendaciones del protocolo de atención y prevención COVID. Al momento en implementación procesos de formación híbridos haciendo uso de las TICs.

#### **4.4 LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS**

##### **4.4.1 Lecciones aprendidas:**

- a. El desarrollo de actividades y la búsqueda de establecer alianzas con actores estatales con mandato en el tema de juventud, demostró la necesidad de impulsar acciones específicas en este campo y de plantear mecanismos para comprometer de manera más consistente a las instituciones, para que estas desarrollen políticas, con planes y presupuestos específicos para el trabajo con juventudes.
- b. Es necesario profundizar la forma de plantear los encuentros intergeneracionales, tanto conceptual como metodológicamente, sobre cómo involucrar a adultos de diferentes edades y experiencias, para lograr su participación y compromiso con las juventudes y establecer espacios de comunicación horizontal y respetuosa.
- c. La inclusión de la visita a la comunidad de Río Negro y la reflexión sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado, ha sido valorada positivamente por el representante del INTECAP y ya se ha incluido dicha visita en el pensum del curso de guía local de turismo para futuras cohortes.
- d. El uso de una metodología adecuada facilita la escucha responsable, respetuosa y empática de dos generaciones distintas.
- e. Es importante incorporar el trabajo sistemático con juventudes, buscando contribuir a la superación de las limitaciones para la comunicación intergeneracional.
- f. La necesidad de seguir sensibilizando a quienes acompañan, brindan atención o tienen el rol de búsqueda de justicia para sobrevivientes y familiares de las víctimas del EAI.

##### **4.4.2 Buenas prácticas:**

- a. El proyecto partió de un diagnóstico de necesidades y consultas locales para la definición de los programas de formación a ofrecer. En el proceso de fortalecimiento de capacidades para el liderazgo se contemplaron reuniones previas con jóvenes para validar información de un diagnóstico realizado en la fase anterior y así definir los contenidos. Para el proceso de formación técnica, el acercamiento con el INTECAP e INGUAT para definir las ofertas de formación fueron fundamentales, ya que éstos permitieron enfocarse en las condiciones de la población a la que se dirigían, como el caso de la juventud participante de Samac. Se mencionan en seguida, algunas buenas prácticas llevadas a cabo durante la implementación del proyecto.
- b. Establecimiento de alianza con INTECAP para procesos de formación técnica y oferta de cursos técnicos certificados por parte de INTECAP y del INGUAT. El ofrecer cursos certificados agrega valor a los procesos formativos, las y los participantes pueden incluirlos en sus hojas de vida y les abre mayores posibilidades de empleo.
- c. Las metodologías innovadoras para el abordaje de los procesos de formación y su concreción en iniciativas locales diseñadas por los jóvenes permiten dar continuidad a los procesos iniciados durante la temporalidad del proyecto. La utilización de la metodología design thinking fue una buena práctica relevante. Entrevistados de instituciones aliadas consideraron importante poder capacitarse en su utilización como una forma de hacer más eficientes diferentes intervenciones con jóvenes.
- d. Focalización en un caso comunitario y propiciar intercambio con otros grupos de jóvenes con experiencias similares como el caso del grupo de jóvenes de Samac y el de Turismo local, provoca empatía con los líderes comunitarios.
- e. El llevar los aprendizajes e impactos a nivel comunitario como el caso de la Cooperativa Samac o la implementación de soluciones diseñadas en las comunidades de origen de

los jóvenes que integran Juventud Polinizadora amplía las posibilidades de alcance de los resultados del proyecto.

- f. Priorización y transversalización explícita del enfoque de género en todas las acciones del proyecto, dio como resultado que la perspectiva se incorporó en las prácticas, análisis y discursos de las y los jóvenes en el marco del proyecto.
- g. Seguimiento y acompañamiento al desempeño de las y los jóvenes mediante la utilización de herramientas de monitoreo que permitieron dar seguimiento a las necesidades enfrentadas por la juventud participante, lo que redundó positivamente en su desempeño y permanencia en los procesos del proyecto.
- h. Es importante comprender que las acciones psicosociales son parte de un proceso de acción psicosocial en contextos históricamente violentados, no obstante, las comunidades, mujeres y pueblos indígenas continúan apostando para una realidad distinta, donde exista un reconocimiento de su lucha, identidad y sus derechos.
- i. La acción sin daño es parte de las acciones psicosociales que se impulsa con la población, por ello se reafirma la importancia de poner en el centro a las víctimas, sus necesidades, tiempos y propuestas.
- j. El intercambio entre las diferentes generaciones (jóvenes, estudiantes, mujeres, hombres, abuelas y abuelos) en espacio de diálogo, reconocimiento de las diferentes violencias contra la mujer y las que suceden en su territorio para la transformación desde diferentes acciones en los espacios que comparten.

#### 4.5 SOSTENIBILIDAD

El establecimiento de alianzas estratégicas para lograr el involucramiento de entidades como el INTECAP, INGUAT y las municipalidades; además de actores o socios clave, como Love Global Missions y Paz Joven, fortalecen la sostenibilidad de los procesos e iniciativas generadas durante la temporalidad del proyecto.

El empoderamiento de la juventud participante y beneficiaria directa del proyecto, fortalece sus capacidades y les motiva dar seguimiento a los procesos de organización y participación que pueden dar continuidad a los proyectos comunitarios planteados o emprendimientos iniciados a partir de las formaciones recibidas.

### 5 PROXIMAS ACCIONES

Con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) para una segunda fase de las iniciativas impulsadas en la fase I (agosto 2021 a septiembre 2022) y con el fin de dar continuidad y ampliar el alcance de los procesos de empoderamiento de la juventud, se trabajará en los siguientes componentes:

Componente 1. Implementación del Diplomado *Ciudadanía para la paz y el desarrollo: herramientas para la incidencia política para la formación de la juventud con liderazgos democráticos* a cargo de Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (CIPREVICA), esta organización fue seleccionada después de un proceso competitivo llevado a cabo por el Proyecto/PNUD. El diplomado tendrá como finalidad dar continuidad y ampliar el alcance de los procesos de empoderamiento de alrededor de 50 jóvenes a través del fortalecimiento de la participación y capacidad de incidencia; en el impulso de procesos de memoria histórica y desarrollo sostenible y en la promoción de alianza con

instituciones estatales y actores clave de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Guatemala.

Componente 2. Asistencia técnica que busca promover y fortalecer alianzas para el cambio, mediante la aceleración de las iniciativas diseñadas en el encuentro de innovación.

Componente 3. Acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer el proceso de desarrollo turístico y memoria histórica de las comunidades de Samac, Cobán y Río Negro de Las Verapaces.

Se continuará con el fortalecimiento de la capacidad de la Asociación Civil Paz Joven Guatemala para la implementación de los componentes 2 y 3 mencionados anteriormente; se brindará acompañamiento a los jóvenes que participaron en la fase 1 en los procesos de formación dirigido al grupo de 36 jóvenes quienes serán responsables de la implementación de las iniciativas de innovación. Asimismo, se continuará trabajando con los 10 jóvenes de la comunidad de Samac, Cobán que participaron en la fase I, tomando en cuenta el interés de seguir fortaleciendo su liderazgo y empoderamiento en su comunidad. Además, la incorporación de 15 jóvenes como guías comunitarios de turistas para promover la memoria histórica de Río Negro.

Se coordinará con INTECAP para que se lleven a cabo los cursos de formación técnica y para el de Guía Comunitario de Turistas se coordinará con el INGUAT para la acreditación de las y los jóvenes participantes en dicho curso.

Por otro lado, con Apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) el proyecto implementará 3 componentes:

Componente 1. Desarrollo de un programa de estudio a nivel de diplomado, dirigido a 30 profesionales y estudiantes de las ciencias sociales y humanísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que cuenten con herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan formular y participar en proyectos educativos, periodísticos y de investigación desde un enfoque de memoria histórica, a cargo del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS). Este diplomado centrará parte de los contenidos en el acervo documental del AHPN, haciendo referencia a casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos que han sido documentados a partir de la información contenida en los documentos del AHPN.

Componente 2. Se continuará con el fortalecimiento de las capacidades de la Asociación Civil Paz Joven Guatemala, para promover el conocimiento e involucramiento de las juventudes organizadas en el cuidado, uso y promoción de los archivos históricos relativa a memoria histórica, archivos y juventud.

Componente 3. El proyecto desarrollará 12 materiales y recursos didácticos (5 podcast, 5 fanzines y 2 videos cortos) para las juventudes y docentes sobre la importancia del uso de los archivos en la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica, enfatizando en el Archivo Histórico de la Policía Nacional.

El equipo de coordinación técnica administrativa del Proyecto del PNUD dará acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades de cada uno de los componentes, en alianza con las organizaciones de sociedad civil socias del Proyecto.

## 6 ANALISIS DE PRESUPUESTO

RESULTADO/PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	BALANCE PRESUPUESTARIO
Jóvenes de los municipios priorizados con capacidades fortalecidas, participan e inciden en espacios para la promoción de la cultura de paz, el rescate de la memoria histórica y el impulso del desarrollo. (00125998)	1. Fortalecidas las capacidades de liderazgo de jóvenes entre 16 y 29 años en Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz, como agentes de cambio en los procesos de construcción de paz y desarrollo sostenible.	\$ 291,713.13	\$ 291,713.13	\$0.00
	2. Fortalecidas las capacidades técnicas de jóvenes entre 18 y 29 años de Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz en áreas de emprendedurismo social para el desarrollo comunitario.	\$63,424.18	\$63,424.18	\$0.00
	3. Generadas alianzas estratégicas para fortalecer el diseño y la implementación de iniciativas orientadas a promover oportunidades de participación y desarrollo de las juventudes en los municipios priorizados.	\$6,378	\$6,378.00	\$0.00
	4. Fortalecidos los conocimientos de la juventud como agentes de cambio dentro y fuera de sus organizaciones, para que incidan en la transformación política y la democracia.	\$ 222,335.42	\$305.53	\$ 222,029.89
	5. Promovidas y fortalecidas alianzas para el cambio, mediante la implementación de las iniciativas diseñadas en el encuentro de innovación "juventudes delineando nuevas rutas hacia la paz".	\$ 25,091.68	\$0.00	\$ 25,091.68
	6. Fortalecido el proceso de desarrollo turístico y memoria histórica de las comunidades de Samac, Cobán y Río Negro, Alta Verapaz.	\$23,647.59	\$0.00	\$23,647.59
Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional fortalecido con la implementación de nuevas tecnologías informáticas y estrategias innovadoras para la preservación del patrimonio documental y la promoción de la memoria histórica. (00127935)	1. Se han diseñado estrategias y espacios de promoción de los archivos como patrimonio único e insustituible y como herramientas para el fortalecimiento de la memoria histórica.	\$111,486.49	\$28,188.25	\$83,298.24
Se ha fortalecido la participación de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI, en procesos de justicia y paz, mediante la prestación de servicios	1. Mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI que participan en procesos de justicia, cuentan con acceso a servicios de atención psicosocial adaptados culturalmente para fortalecer su bienestar desde la esfera individual, familiar y comunitaria.	\$88,994.99	\$88,994.99	\$0.00



Proyecto 00134407 – Reafirmando garantías de no repetición para la paz y el desarrollo

RESULTADO/PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	BALANCE PRESUPUESTARIO
inclusivos de atención psicosocial, redes de apoyo comunitario y capacitación a técnicos y especialistas que participan en procesos judiciales de violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado. (00128580)	2. Se han promovido espacios intergeneracionales orientados a transformar relaciones para la no-repetición de la violencia, tejer redes de apoyo para las mujeres en sus procesos de búsqueda de justicia y para la cohesión social comunitaria.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3. Operadoras/es de justicia y equipos interdisciplinarios cuentan con herramientas y capacidades para la investigación y persecución penal de delitos de violencia sexual contra mujeres indígenas, desde un enfoque de género e intercultural.	\$11,005.01	\$11,005.01	\$0.00
Promoción de la participación efectiva de la sociedad civil, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto a nivel de los territorios. (00129358)	1. Se han aumentado las capacidades de la SCEP para brindar soporte al SISCODE para mejorar la participación efectiva de la sociedad civil, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto a nivel de los territorios.	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$904,076.49</b>	<b>\$550,009.09</b>	<b>\$354,067.40</b>

## 7 ANEXOS - Matriz de Indicadores y Medios de Verificación

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
<p><b>1. Output: 125998</b>                      Jóvenes de los municipios priorizados con capacidades fortalecidas, participan e inciden en espacios para la promoción de la cultura de paz, el rescate de la memoria histórica y el impulso del desarrollo.</p>	<p>1. Fortalecidas las capacidades de liderazgo de jóvenes entre 16 y 29 años en Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz, como agentes de cambio en los procesos de construcción de paz y desarrollo sostenible.</p>	<p>1.1 # de jóvenes (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres), que a través del ejercicio de su liderazgo participan en el diseño de iniciativas de construcción de paz y desarrollo sostenible.</p>	0	80	<p><b>Se alcanzó la meta en un 95%.</b> 76 jóvenes de los cuales 44 fueron mujeres (58%) y 32 hombres (42%), participaron en la construcción de agendas enfocadas en la paz y el desarrollo sostenible. Se realizaron consultas con jóvenes líderes y entrevistas con actores clave a nivel local incluyendo representantes de COCODE, CONJUVE, y Municipalidades de Cobán y San Pedro Carchá. Cabe destacar que las entrevistas con los actores clave fueron lideradas por los jóvenes. Entre las prioridades identificadas por las y los jóvenes: La corrupción; falta de educación sexual y reproductiva; embarazos tempranos, falta de empleo, entre otros.</p>	<p>Documento de actualización de análisis de contexto de la juventud de Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz.</p> <p>Fotografías.</p> <p>Listados de participantes de las actividades de formación.</p>

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		1.2 Grado de empoderamiento de los jóvenes que participan en el proyecto.	0	Grado 3	<b>Se alcanzó la meta en un 133%</b> al obtener un promedio de 4 en el grado de empoderamiento, resultado mayor al planificado.	Encuesta de entrada y salida para conocer el grado de empoderamiento de la juventud.
		1.3 # de soluciones en torno a la promoción de una cultura de paz, memoria histórica y desarrollo sostenible identificadas por las y los jóvenes.	0	4	<b>Se alcanzó la meta ya que se co-diseñaron 6</b> iniciativas innovadoras, a través de un proceso de capacitación y desenvolvimiento en la definición de soluciones con más de 40 jóvenes de Cobán y San Pedro Carchá. De estas 6, fueron seleccionadas 3 para fortalecer las ideas de los jóvenes.	Documento que contiene las iniciativas elaboradas por jóvenes participantes.
	2. Fortalecidas las capacidades técnicas de jóvenes entre 18 y 29 años de Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz en áreas de emprendedurismo social para el desarrollo comunitario.	2.1 # de jóvenes (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres) que concluyen satisfactoriamente su proceso de capacitación técnica.	0	80	<b>Se superó la meta, en total fueron 117</b> jóvenes quienes finalizaron los 7 cursos técnicos de los municipios de Cobán y San Pedro Carchá. Las participantes fueron mayoritariamente mujeres 64%, 36% hombres y más del 60% se autoidentificaron de pueblos indígenas. Los cursos brindados fueron: Guía comunitario de turistas, Guía local de	Listado final de participantes de los cursos.  Fotografías.  Informe final del curso de aviturismo.  Informe final del curso de periodismo comunitario y comunicación.

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
					turistas, Operador de computadoras, Esteticismo, Preparador de café y catación, Periodismo Comunitario y Aviturismo.	Informe de investigación Social para la Reconstrucción de la Historia y Memorias de la Comunidad de Samac, A.V  Documento con propuesta de rutas guiadas sobre turismo comunitario y memoria histórica de Samac, Cobán, Alta Verapaz: <i>Museo Vivo, café con memoria.</i>
		2.2 Grado de satisfacción de las y los jóvenes con los cursos de capacitación técnica implementados.	0	3	<b>Se alcanzó la meta</b> , el promedio del grado de satisfacción en los 8 cursos fue de <b>3.5</b> .	Encuesta de satisfacción a jóvenes que participan en los cursos de capacitación técnica.
	3. Generadas alianzas estratégicas para fortalecer el diseño y la implementación de iniciativas orientadas a promover oportunidades de participación y desarrollo de las	3.1 # de alianzas estratégicas generadas para promover oportunidades de participación y desarrollo de las	0	3	<b>Se alcanzó la meta de 3 alianzas.</b> Este componente fue transversal a lo largo de la implementación del proyecto, pues las alianzas estratégicas aportaron tanto al	Fotos  Minutas de visita de campo

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
	juventudes en los municipios priorizados.	juventudes en los municipios priorizados.			proceso de formación de líderes, como a las capacitaciones técnicas. Durante la implementación del proyecto se crearon alianzas con las Oficinas Municipales de la Juventud, INTECAP, INGUAT y la Cooperativa Samac.	
		3.2. # de iniciativas que ofrecen oportunidades de participación y desarrollo para las juventudes en los municipios priorizados.	0	2	<p><b>Se alcanzó la meta, 3 propuestas</b> de iniciativas desarrolladas y fortalecidas por medio de un proceso de capacitación a los jóvenes de los tres grupos de las conforman.</p> <p>Las iniciativas juveniles se enfocan en:                      Recuperación de la Memoria Histórica (Somos Imagen de Nuestra Historia)                      Construcción de una ciudadanía democrática y liderazgo (Juventud Polinizadora) y Alianzas para el desarrollo comunitario (Radio Kemok).</p>	Informe del encuentro de innovación Desafío Cobán Carchá.  Fotos

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
	4. Fortalecidos los conocimientos de la juventud como agentes de cambio dentro y fuera de sus organizaciones, para que incidan en la transformación política y la democracia.	4.1 # de jóvenes de 18 a 29 años (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres) participan en el diplomado de formación.	0	0	<i>El diplomado se tiene previsto que inicie en febrero 2023.</i>	
		4.2 % de participantes del diplomado culminan satisfactoriamente su proceso de formación.	0	70%	<i>Este resultado se medirá al finalizar el proceso formativo.</i>	
		4.3 # de mapas de actores construidos por los jóvenes participantes del diplomado.	0	4	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		4. # de sitios de memoria histórica visitados (1 por departamento)	0	4	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		4.5 # de herramientas de monitoreo y transparencia aplicadas por las juventudes para conocer el nivel de participación e inclusión de la juventud.	0	2	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		4.6 # de Informe consolidado sobre la participación de la juventud.	0	1	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	

Proyecto 00134407 – Reafirmando garantías de no repetición para la paz y el desarrollo

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		4.7 # de Informes socializados y presentados a nivel departamental.	0	4	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		4.8 # de espacios de diálogo realizados en los territorios priorizados.	0	12	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		4.9 # de jóvenes formados en el diplomado lideran los espacios de diálogo.	0	35	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		4.10 # de jóvenes que adquieren competencias y manifiestan un “cambio más significativo” luego de participar en los diálogos.	0	35	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		4.11 # de encuentro realizado con la participación de 35 jóvenes.	0	1	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		4.12 # plan de implementación de una estrategia de comunicación.	0	1	<i>A realizarse en el segundo trimestre del año 2023.</i>	

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
	<p>5. Promovidas y fortalecidas alianzas para el cambio, mediante la implementación de las iniciativas diseñadas en el encuentro de innovación “juventudes delineando nuevas rutas hacia la paz”.</p>	<p>5.1 # de adolescentes y jóvenes, (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres) con conocimientos básicos sobre la formulación, elaboración y ejecución de iniciativa juveniles.</p>	0	36	<p><b>Meta alcanzada.</b> Durante el último trimestre del año se realizaron sesiones de fortalecimiento a jóvenes sobre formulación y ejecución de proyectos juveniles; se utilizó la guía uno, dos, tres de la Guía de proyectos sociales para adolescentes y jóvenes de Paz Joven Guatemala. En las reuniones participaron 37 jóvenes, 22 mujeres y 15 hombres, de ellas y ellos el 90% se identifican como indígenas. De ellos 12 son integrantes de la iniciativa Somos imagen de nuestra historia, 11 integrantes de la iniciativa radio Kemok y 14 de la iniciativa juventud polinizadora.</p>	<p>Informe trimestral Paz Joven. Listado. Fotografías.</p>
		<p>5.2 % de adolescentes y jóvenes hombres y mujeres que participan en el proyecto integran redes o agrupaciones juveniles de sus municipios.</p>	0	80	<p><b>Se medirá al finalizar el proyecto.</b></p>	



Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		5.3 # de adolescentes y jóvenes, (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres) participan en la implementación de iniciativas desarrolladas desde su misma visión.	0	36	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		5.4 # de actividades desarrolladas por jóvenes con el apoyo de autoridades locales en los municipios de San Pedro Carchá y Cobán como parte de la implementación de las iniciativas.	0	3	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		5.5 # de encuentros de intercambio de experiencias desarrollado.	0	2	<b>El alcance de la meta es del 50%.</b> Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó un encuentro departamental en donde participaron jóvenes de Cobán y San Pedro Carchá. Objetivos: Recuperar las experiencias de los jóvenes durante la fase 1 del proyecto y generar reflexiones sobre la participación ciudadana de las juventudes con miras al próximo proceso electoral.	Informe trimestral Paz Joven. Listado. Fotografías. Sistematización del encuentro.

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
	6. Fortalecido el proceso de desarrollo turístico y memoria histórica de las comunidades de Samac, Cobán y Río Negro, Alta Verapaz.	6.1 # de jóvenes (80% indígenas, 60% mujeres y 40% hombres), participan en el curso de turismo comunitario.	10	25	<i>Planificado para el primer trimestre del año 2023.</i>	
		6.2 % de jóvenes que finalizan el curso cuentan con capacidades técnicas en turismo comunitario y reciben acreditación del INGUAT.	0%	90%	<i>Planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		6.3 Grado de satisfacción de las y los jóvenes de la comunidad Río Negro en el curso de guía comunitario de turismo.	0	3	<i>Se medirá en el segundo trimestre del año 2023.</i>	
		6.4 # de presentaciones de los recorridos comunitarios realizadas a agencias de turismo local.	0	2	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
		6.5 # de jóvenes de Samac y Río Negro, Alta Verapaz que comparten sus experiencias sobre emprendimiento social	0	25	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		6.6 # Documento de sistematización sobre la recuperación de la memoria histórica.	0	1	<i>Planificado para el tercer trimestre del año 2023.</i>	
<b>3. Output: 127935<sup>1</sup></b> Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional fortalecido con la implementación de nuevas tecnologías informáticas y estrategias innovadoras para la preservación del patrimonio documental y la promoción de la memoria histórica.	1. Se han diseñado estrategias y espacios de promoción de los archivos como patrimonio único e insustituible y como herramientas para el fortalecimiento de la memoria histórica.	2.1 # de profesionales que cuentan con herramientas conceptuales y metodológicas que les permiten formular y participar en proyectos educativos, periodísticos y de investigación desde un enfoque de memoria histórica.	0	30	El inicio del diplomado está planificado para el primer trimestre del año 2023.	
		2.2 # de jóvenes conocen el contenido y valor de los archivos, en especial del AHPN, es un paso esencial para la no-repetición y para asegurar el cuidado y salvaguarda del patrimonio documental de generación en generación.	0	100	<i>El inicio del diplomado está planificado para el segundo trimestre del año 2023.</i>	

<sup>1</sup> El output 2 se cerró mediante Revisión sustantiva presupuestaria No. 2, aprobado el 24 de agosto 2022, por no ser viable su implementación.<sup>12</sup>

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		2.3 # de materiales y recursos didácticos desarrollados para las juventudes y docentes sobre la importancia del uso de los archivos en la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica, enfatizando en el Archivo Histórico de la Policía Nacional.	0	12	<i>El inicio del diplomado está planificado para el primer trimestre del año 2023.</i>	
<b>4. Output: 128580.</b> Se ha fortalecido la participación de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI, en procesos de justicia y paz, mediante la prestación de servicios inclusivos de atención psicosocial, redes de apoyo comunitario y capacitación a técnicos y especialistas que participan en procesos judiciales de violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado.	<b>1.</b> Mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI que participan en procesos de justicia, cuentan con acceso a servicios de atención psicosocial adaptados culturalmente para fortalecer su bienestar desde la esfera individual, familiar y comunitaria.	1.1 % de la estrategia de atención psicosocial remota para mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI, implementada.	0	100%	<b>Se alcanzó la meta en un 100%.</b> Se apoyó el desarrollo e implementación de una estrategia de atención psicosocial de manera presencial y remota, dirigido a 47 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el enfrentamiento armado interno.	Informe ECAP. Fotografías.
		1.2 # de mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI que participan en procesos de justicia y cuentan con servicios de atención psicosocial proporcionados por el proyecto, desglosado	0	45	<b>Meta alcanzada en 104%.</b> 47 mujeres que participan en proceso de justicia recibieron atención psicosocial. 26 mujeres del caso Panzós y 21 del caso CREOMPAZ incluyendo a las mujeres de	Informe ECAP. Fotografías.

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
		por edad y origen étnico.			Najquitob, San Lucas Chiacal, Najtilabaj.	
		1.3 Grado de satisfacción de las sobrevivientes de violencia sexual y de género relacionada al EAI con el acompañamiento psicosocial brindado.	0	3	Se alcanzó la meta logrando un grado 3.5 de satisfacción con relación al acompañamiento recibido.	Encuestas
	2. Se han promovido espacios intergeneracionales orientados a transformar relaciones para la no-repetición de la violencia, tejer redes de apoyo para las mujeres en sus procesos de búsqueda de justicia y para la cohesión social comunitaria.	2.1 # de diálogos intergeneracionales promovidos para reforzar las redes de apoyo intracomunitarias para la no-repetición de la violencia y la cohesión social.	0	6	<b>Meta alcanzada en un 100%.</b> Se facilitaron 6 espacios de diálogo intergeneracional. 1. Se creó un grupo diverso, hijas e hijos, nietos y nietas de sobrevivientes del EAI. 2 Un espacio para que de manera colectiva mujeres y jóvenes construyeran acciones que evidencien la MH, la prevención de la violencia contra la mujer, la justicia y la transformación social. 3. Espacio en donde los jóvenes escucharon de las voces de las mujeres su historia. 4. Desarrollo de propuestas entre mujeres y jóvenes para el festival, se formaron 4 estaciones para la reconstrucción de la MH	Informe ECAP. Fotografías. Minutas.

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
					y la socialización de sus historias de vida. 5. Desarrollo del festival "Denunciar y Justicia Real, para florecer desde la libertad" desde los procesos de prevención de la violencia sexual a mujeres del EAI y formas de denuncia. 6. Con el acompañamiento psicosocial y las metodologías creadas y creativas desde el contexto de las mujeres se construyeron acuerdos y propuestas colectivas para transmisión intergeneracional de la MH y la divulgación de sus historias de vida para exigir justicia y la concientización de sus derechos.	
		2.2 # de acciones lideradas por las mujeres y jóvenes para la promoción del buen vivir y la cohesión social comunitaria basada en el respeto y la igualdad de derechos.	0	3	<b>Meta alcanzada 100%.</b> Se realizaron 3 reuniones entre mujeres y jóvenes con el propósito de contribuir al traslado de la memoria histórica, desde las historias de las mujeres.	Informe ECAP. Fotografías. Minutas.

Productos Esperados	Actividades de Resultado	Indicadores	Línea de base 2021-2022	Metas planificadas	Avances y/o logros	Medios verificación
	3. Operadoras/es de justicia y equipos interdisciplinarios cuentan con herramientas y capacidades para la investigación y persecución penal de delitos de violencia sexual contra mujeres indígenas, desde un enfoque de género e intercultural.	3.1 % del proceso implementado de capacitación a fiscales, querellantes, psicólogas/os, promotoras/es en salud mental, médicas/os y forenses sobre el Protocolo de Estambul como instrumento para accionar en procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos de mujeres indígenas durante el EAI.	0	100%	<b>Se alcanzó en un 100% la meta.</b>  Se desarrolló el curso sobre el Protocolo de Estambul, a cargo del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI-México).	Informe CCTI
		3.2 # de fiscales, querellantes, psicólogos/as, promotores/as en salud mental, médicas/os y forenses capacitados en el Protocolo de Estambul, desde un enfoque de género e intercultural.	0	80	<b>Se logró la meta en un 58%.</b>  46 representantes de OSC y fiscales, participaron en el proceso formativo.	Informe CCTI
		3.3 % de participantes capacitados que incrementan sus conocimientos para la aplicación del Protocolo de Estambul desde un enfoque de género e intercultural.	0	80%	<b>Se alcanzó un 51%.</b>  Del total de participantes 41 finalizaron el curso y cumplieron con los requisitos para obtener el diploma correspondiente.	Informe CCTI
